





# FUNDURB

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Relatório Anual 2014 e Plano de Aplicação de 2015



# FUNDURB

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Relatório Anual de 2014

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEHAB – ANO 2014**

**INVESTIMENTOS FUNDURB/SEHAB**

| PROCESSO         | EMPREENHIMENTOS        | VALORES ( R\$)       |                      |        |                      |        |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |                        | Aprovado             | Empenhado            | Data   | Liquidado            | Data   |
| 2008.0.066.167-9 | Cidade Júlia           | 2.663.152,12         | 2.663.152,12         | JUN/14 | 2.602.028,93         | JUN/14 |
| 2010-0.046.864-6 | Pabreu/Praia           | 15.249.283,43        | 15.249.283,41        | DEZ/14 | 15.249.151,30        | DEZ/14 |
| Diversos         | RENOVA SP - Domus      | 5.057.820,85         | 5.057.820,85         | DEZ/14 | 4.675.602,66         | DEZ/14 |
| Diversos         | RENOVA SP - Bureau     | 4.768.450,27         | 4.768.450,27         | DEZ/14 | 4.762.080,93         | DEZ/14 |
| 2010-0.046.912-0 | Itaberaba 2            | 8.659.169,76         | 8.659.169,76         | DEZ/14 | 7.902.728,98         | DEZ/14 |
| 2010-0.362.986-3 | Pq. Das Flores         | 7.799.622,29         | 7.799.622,29         | DEZ/14 | 7.751.733,02         | DEZ/14 |
| 2010-0.205.327-3 | Arpoador/ Lago (3Rs)   | 1.479.827,99         | 1.479.827,99         | DEZ/14 | 1.479.827,99         | DEZ/14 |
| 2010-0.185.143-5 | Campo Grd./ Imp. (3Rs) | 5.748.552,58         | 5.748.552,58         | DEZ/14 | 5.748.552,55         | DEZ/14 |
| 2010-0.185.151-6 | City Jaraguá (3Rs)     | 1.298.187,27         | 1.298.187,24         | DEZ/14 | 1.095.203,78         | DEZ/14 |
| 2010-0.185.195-8 | BELA VISTA (3Rs)       | 6.591.484,67         | 6.591.484,62         | DEZ/14 | 6.507.023,11         | DEZ/14 |
| 2012-0.060.847-6 | Fazenda da Juta        | 0,00                 | 0,00                 | -      | 0,00                 | DEZ/14 |
| 2012-0.193.739-2 | Diversos Loteamentos   | 0,00                 | 0,00                 | -      | 0,00                 | DEZ/14 |
| 2014-0.011.921-5 | Jd. Keralux            | 292.046,30           | 292.046,30           | -      | 292.037,31           | DEZ/14 |
| 2011-0.141.677-3 | COBRAPE                | 1.036.553,80         | 1.036.553,80         | DEZ/14 | 1.011.676,46         | DEZ/14 |
| 2011-0.141.687-0 | Diagonal               | 3.755.278,35         | 3.755.278,35         | DEZ/14 | 3.753.803,24         | DEZ/14 |
| 2011-0.174.242-5 | IEME BRASIL            | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         | DEZ/14 | 5.674.949,99         | DEZ/14 |
| 2011.0.142.031-2 | Núcleo Engenharia      | 11.650.000,00        | 11.650.000,00        | DEZ/14 | 11.649.999,93        | DEZ/14 |
| 2008-0.279.853-1 | Consortio DOMUS        | 1.807.838,09         | 1.807.838,09         | DEZ/14 | 1.803.388,50         | DEZ/14 |
| 2010.0-038.063-3 | Consortio Bureau-Pri   | 2.424.805,86         | 2.424.805,86         | DEZ/14 | 2.416.290,34         | DEZ/14 |
| <b>TOTAL</b>     |                        | <b>85.982.073,63</b> | <b>85.982.073,53</b> |        | <b>84.376.079,02</b> |        |



**PROGRAMA MANANCIAIS****Objeto: PROGRAMA MANANCIAIS – FASE 2**

| PROCESSO         | ÁREA             | VALORES( R\$)        |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                  | Aprovado             | Empenhado            | Liquidado            |
| 2008-0.066.167-9 | CIDADE JULIA     | 2.663.152,12         | 2.663.152,12         | 2.602.028,93         |
| 2010-0.046.864-6 | PABREU / PRAINHA | 15.249.283,43        | 15.249.283,43        | 15.249.151,30        |
| <b>TOTAL</b>     |                  | <b>17.912.435,54</b> | <b>17.912.435,54</b> | <b>17.851.180,23</b> |

## Cidade Júlia – Lote 1 – PROGRAMA MANANCIAIS - FASE 2

**Objeto: Execução de serviços de obras do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Manancial Hídrico das Bacias Guarapiranga e Billings.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 2.663.152,12**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: Paralisado em 04/06/2014
- Valores empenhados: R\$ 2.663.152,12 (até junho/2014)
- Valores liquidados: R\$ 2.602.028,93 (até junho/2014)



**Cidade Júlia – Encosta Pedra Sobre Pedra - Serviços de Consolidação Geotécnica**



**Cidade Júlia – Canalização Córrego Apucás**

## Pabreu / Prainha – Lote 1 – PROGRAMA MANANCIAIS - FASE 2

**Objeto: Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas – Lote 1**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 15.249.283,43**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: dezembro/2014
- Valores empenhados: R\$ 15.249.283,41 (até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 15.249.151,30 (até dezembro/2014)



**Pabreu / Prainha** – Rua Beira Rio – Drenagem, pavimentação e urbanismo



**Pabreu / Prainha** – Rua Beira Rio – Drenagem, pavimentação e urbanismo

**REGULARIZAÇÃO E 3Rs**

**Objeto: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INCLUINDO PROGRAMA 3R's.**

| PROCESSO          | ÁREA                  | VALORES( R\$)        |                      |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                       | Aprovado             | Empenhado            | Liquidado            |
| 2010-0.046.912-0  | ITABERABA 2           | 8.659.110,30         | 8.669.457,80         | 7.270.898,22         |
| 2010-0.362.986-3  | PARQUE DAS FLORES     | 7.799.622,20         | 8.251.346,99         | 8.215.696,43         |
| 2010-0.205.327-3  | ARPOADOR/ JD DO LAGO  | 1.479.827,99         | 1.479.827,99         | 1.479.827,97         |
| 2010-0.185.143-5  | CAMPO GRANDE/JD. IMP. | 5.748.552,58         | 5.748.552,58         | 5.748.552,55         |
| 2010-0.185.151-6  | CITY JARAGUÁ - 3Rs    | 1.298.187,27         | 1.298.187,27         | 1.095.203,78         |
| 2010-0.185.195-8  | BELA VISTA            | 6.591.484,67         | 6.591.484,67         | 6.400.618,13         |
| 2012-0.060.847-6  | FAZENDA DA JUTA       |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2012-0.193.739-2  | DIVERSOS LOTEAMENTOS  |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Projeto/Licitação | JARDIM KERALUX        | 292.046,30           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>      |                       | <b>31.868.831,31</b> | <b>32.038.857,30</b> | <b>30.210.797,09</b> |

**Objeto:** Eliminação do risco geotécnico, de drenagem das águas pluviais, de alinhamento geométrico das vias para pavimentação, guias e sarjetas.

**Valor aprovado FUNDURB 2014: 8.659.169,76**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: agosto/15
- Valores empenhados: R\$ 8.659.169,76(até dez/14)
- Valores liquidados: R\$ 7.902.728,98 (até dez/14)



Execução do solo grampeado da Rua Faisão



Execução da contenção da Rua Zabelê



## Parque das Flores

**Objeto:** Eliminação do risco geotécnico, de drenagem das águas pluviais, de alinhamento geométrico das vias para pavimentação, guias e sarjetas, e ainda, a criação de áreas verdes e espaços de uso público.

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 7.799.622,29**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: setembro/15
- Valores empenhados: R\$ 7.799.622,29(até dez/14)
- Valores liquidados: R\$ 7.751.733,02(até dez/14)



Execução da pavimentação – Rua Flamboyant



Execução de guias e sarjetas – AV. Cidade de Mauá

## Jardim Arpoador / Jardim do Lago / São Domingos – 3R Lote A

**Objeto: Execução de serviços de Reforma e Revitalização de Conjuntos Habitacionais.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 1.479.827,99**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: janeiro/2015
- Valores empenhados: R\$ 1.479.827,99 (até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 1.479.827,99 (até dezembro/2014)



**Jd. Arpoador** – Cobertura do estacionamento.



**Jd. Arpoador** – Execução de calçadas e cercamento em gradil.

## Jardim Arpoador / Jardim do Lago / São Domingos – 3R Lote A



**Jd. Arpoador** – Construção de lixeiras.



**Jd. Arpoador** – Execução de calçadas.



**Jd. do Lago** – Execução de áreas de lazer, instalação de kits gás, pintura externa dos prédios.



**São Domingos** – Instalação de equipamentos de combate a incêndio.



José Paulino dos Santos / Campo Grande / Parque Otero – 3R Lote B

**Objeto: Execução de serviços de Reforma e Revitalização de Conjuntos Habitacionais.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 5.748.552,58**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: janeiro/2015
- Valores empenhados: R\$ 5.748.552,58 (até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 5.748.552,55 (até dezembro/2014)



**Parque Otero – Cercamento do Condomínio.**



**Parque Otero – Troca de telhas quebradas.**

José Paulino dos Santos / Campo Grande / Parque Otero – 3R Lote B



**Campo Grande** – Concluídos os serviços. No aguardo emissão do AVCB.



**Parque Otero** - Execução de lixeiras.



**José Paulino** – Concluídos os serviços. No aguardo emissão do AVCB.



**José Paulino** – Instalação de corrimão, e complementação da pintura nas Quadras A e C.

**Lote C – City Jaraguá**

**Objeto: Regularização fundiária e comercial, recuperação de créditos provenientes das taxas referentes à permissão de uso de moradias e revitalização de edificações e áreas comuns.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 1.298.187,27**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/14
- Valores empenhados: R\$ 1.298.187,24 (até junho/2014)
- Valores liquidados: R\$ 1.095.203,78 (até junho/2014)



Vista – Condomínio G



Vista – Condomínios C e D





Pintura externa do Centro de Convivência



Colocação de pisos no Centro de Convivência



Instalação de equipamentos de ginástica



Instalação do Playground

**Lote D – Bela Vista**

**Objeto: Execução de serviços de Reforma e Revitalização de Conjuntos Habitacionais.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 6.591.484,67**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: dezembro/14
- Valores empenhados: R\$ 6.591.484,62 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 6.507.023,11 (até nov/2014)



Condomínio 1



Condomínio 2



Lote D - Bela Vista



Pavimentação com piso intertravado – Condomínio 3



Acabamentos externos - Centro comercial – Fase 1



Alvenaria de elevação das lixeiras – Condomínio 4



Execução da Cobertura – Centro Comercial – Fase 2

**Fazenda da Juta****Objeto:**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 276.708,64**

**Situação:**

- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Obra não iniciada – aguardando autorização para início (PAC / Encostas)

**Diversos Loteamentos****Objeto:**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 128.856,76**

**Situação:**

- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Obra em licitação.

**Jardim Keralux**

**Objeto: Elaboração de Projetos :** Serviços técnicos e profissionais especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos básicos de infraestrutura para loteamento Jardim Keralux, localizado nas áreas de competência da Subprefeitura Ermelino Matarazzo do Programa de Urbanização de Favela e Regularização de Loteamentos Precários para Secretaria Municipal de Habitação São Paulo – SEHAB.

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 292.046,30**

**Situação:**

- Data de Término : dez/2014
- Valores empenhados: R\$ 292.046,30
- Valores liquidados: R\$292.037,31

**RENOVA SP - DOMUS**

**Objeto: Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015

| Perímetros<br>Regiões Sul e Sudeste | Valores ( R\$)      |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Aprovado            | Empenhado           | Liquidado           |
| Água Espraiada 2+5                  | 172.746,67          | 172.746,67          | 169.989,94          |
| Cordeiro 1                          | 276.929,42          | 276.929,42          | 236.738,82          |
| Meninos 1                           | 867.626,47          | 867.626,47          | 666.138,32          |
| Morro do S 4                        | 1.881.709,39        | 1.881.709,39        | 1.794.268,61        |
| Oratório 1                          | 623.364,38          | 623.364,38          | 620.812,82          |
| Pirajussara 5                       | 934.361,39          | 934.361,39          | 933.095,49          |
| Pirajussara 7                       | 146.668,68          | 146.668,68          | 130.815,29          |
| Ponte Baixa 4                       | 154.414,45          | 154.414,45          | 123.743,37          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5.057.820,85</b> | <b>5.057.820,85</b> | <b>4.675.602,66</b> |



## RENOVA SP – Água Espraiada 2 + 5

**Objeto:** Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.

**Valor aprovado FUNDURB 2014:** R\$ 172.746,67

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 172.746,67 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 169.989,94 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 458



Água Espraiada 2




Água Espraiada 5

## RENOVA SP – Água Espraiada 2 + 5



Água Espraiada 2 – Provisão Sinhazinha

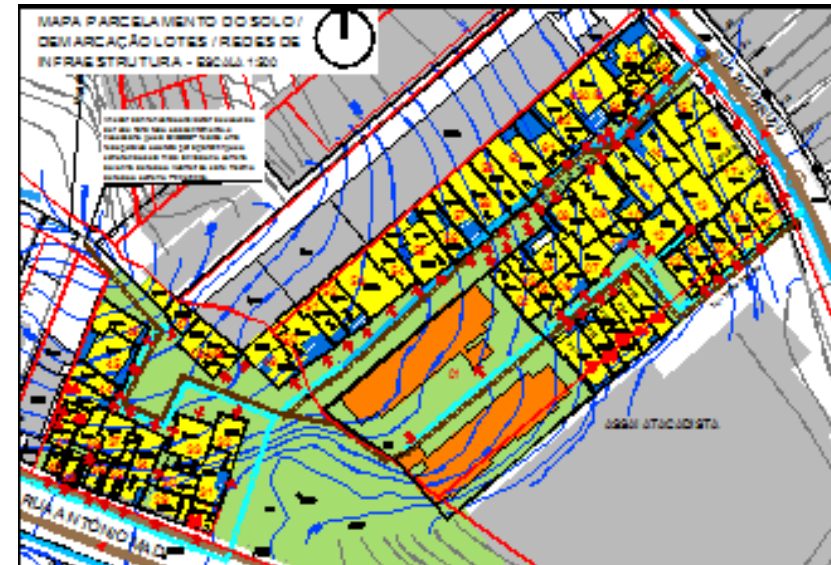

Água Espraiada 5

## RENOVA SP – Água Espraiada 2 + 5

### Produtos realizados / em andamento - 2014

**ÁREA - FAVELA ANTONIO MADI - 2ª Etapa de trabalho**  
**Paralisado** (depende de convenio c/ Governo do Estado de SP)

Projeto Básico de Urbanismo (proposta)

**ÁREA - FAVELA ALBA**

**Concluídos**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA PEDRO BUENO - 2ª Etapa de trabalho**

**Concluído**

Projeto Básico de Urbanismo (proposta)

**ÁREA - FAVELA CRUZ DE MALTA - 2ª Etapa de trabalho**

**Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo

**ÁREA - FAVELA PINGO DE OURO**

**Concluídos**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública

**Em andamento**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

**ÁREA - FAVELA SINHAZINHA**

**Concluídos**

Projeto Básico de Urbanismo

**Em andamento**

Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Iluminação Pública

**ÁREAS DE PROVISÃO**

**Em andamento**

**C1 - Projetos T + 4:**

Estudo Preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Projeto Básico de Estrutura  
Projeto Básico de Instalações Prediais

**C5 - Projeto de Implantação e infraestrutura para 20UH's**

Projeto Básico Geométrico Condominial





## RENOVA SP – Cordeiro 1

**Objeto: Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 276.929,42**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 276.929,42(até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 236.738,82 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 459

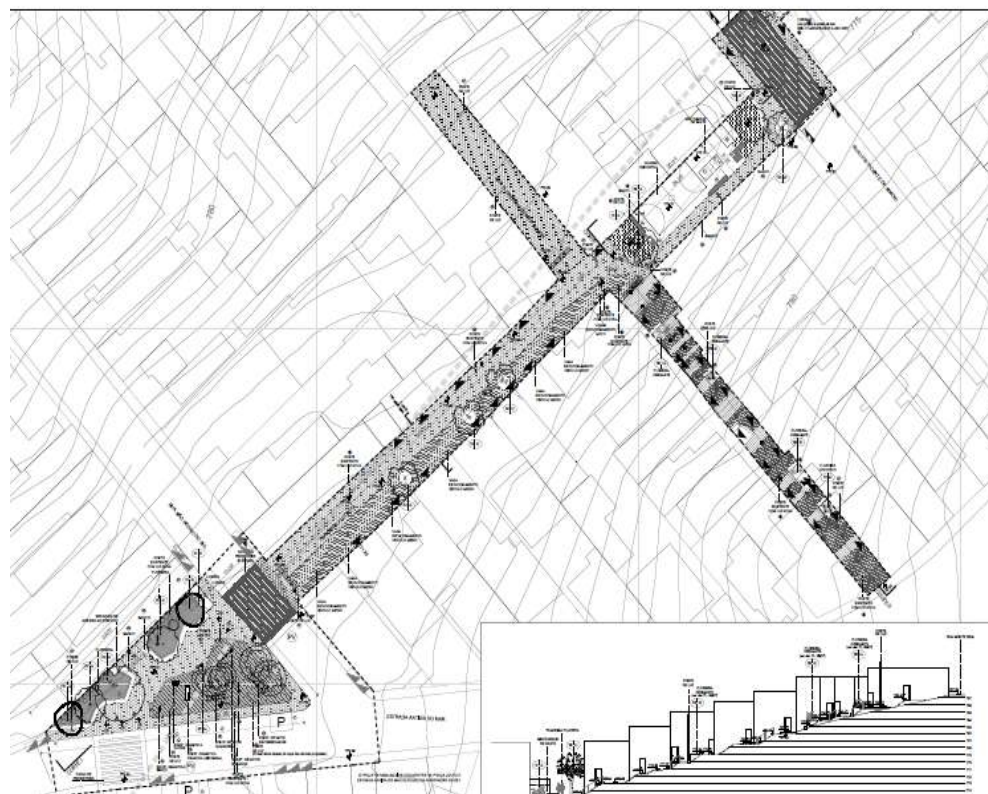

## RENOVA SP – Cordeiro 1

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA DE PROVISÃO MCMV: Adelino e Contos (110 UH)

##### Concluídos

Estudo Preliminar: Edificação

##### **C 3b - Projeto T + 10 adequação G2**

Estudo Preliminar: Edificação - Adequação G2

##### Em andamento

##### **C 3a - Projeto T + 10 AE**

Estudo Preliminar: Edificação

Projeto Básico de Arquitetura

Relatório de Consultoria para Estruturas e de

Instalações Prediais

##### **C 3b - Projeto T + 10 adequação G2**

Projeto Básico de Arquitetura - Adequação G2

##### **C 5 - Projeto de Implantação e infraestrutura para 75UH's**

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica Condominial

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água

Condominial

Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento

Sanitário

Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação /

Telefonia Condominial

Projeto Básico de Paisagismo Condominial

#### ÁREA - FAVELA TANQUINHO

##### Em andamento

Projeto básico de Urbanismo

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

#### ÁREA - FAVELA BALDOMERO FERNANDEZ

##### Em andamento

Projeto básico de Urbanismo

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

#### ÁREA - FAVELA MARANHÃO I

##### Em andamento

Projeto básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema

Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água

Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA MARANHÃO II

##### Em andamento

Projeto básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema

Viário

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo (complementação)

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **D 8 - Córrego Tanquinho (Complementação - L=500m)**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)



## RENOVA SP – Meninos 1

**Objeto: Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 867.626,47**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 867.626,47 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 666.138,32 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.343



## RENOVA SP – Meninos 1

### **Produtos realizados / em andamento - 2014**

**ÁREAS DE PROVISÃO (Kardinsky - JD. Celeste e VILA Cristina)**

#### **Concluído**

**C3 - Projeto T + 10 AE:**

Estudo Preliminar da Edificação

**C 3a - Projeto T + 10 adequação G2**

Estudo Preliminar: Edificação - Adequação G2

**C4 - Projeto de Implantação e INFRAESTRUTURA PARA 150 UH's**

Projeto Básico Geométrico Condominial

Projeto Básico de Terraplenagem Condominial

#### **Em andamento**

**C3 - Projeto T + 10 AE:**

Projeto Básico de Arquitetura

Projeto Básico de Fundação

Projeto Básico de Estrutura

Projetos Básicos de Instalações Prediais

**C 3a - Projeto T + 10 adequação G2**

Projeto Básico de Arquitetura

Projeto Básico de Estrutura

Projetos Básicos de Instalações Prediais

**C4 - Projeto de Implantação e Infraestrutura para 150 UH's**

Projeto Básico de Abastecimento de Água Condominial

Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgoto

Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação /  
Telefonia Condominial

Projeto Básico de Paisagismo Condominial

**C6 - Projeto de Implantação e Infraestrutura para 75 UH's**

Projeto Básico Geométrico Condominial

Projeto Básico de Terraplenagem Condominial

Projeto Básico de Abastecimento de Água Condominial

Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgoto

Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação /  
Telefonia Condominial

Projeto Básico de Paisagismo Condominial

Parecer Técnico de Fundação para área construída de 2001 à

**C7 - Projeto de Implantação e Infraestrutura para 20 UH's**

Projeto Básico Geométrico Condominial

Projeto Básico de Terraplenagem Condominial

Projeto Básico de Instalações Elétricas /

Iluminação / Telefonia Condominial

Projeto Básico de Paisagismo Condominial

**ÁREA - FAVELA JD. CELESTE**

**ÁREA - FAVELA VILA CRISTINA**

#### **Concluído**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

#### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro  
Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA SÃO PEDRO**

**ÁREA - FAVELA LIVIERO**

**EMPREENHIMENTO BURITI ITAPIRA - FUNAPS**

#### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico de Paisagismo



## RENOVA SP – Morro do S4

**Objeto:** Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.

**Valor aprovado FUNDURB 2014:** R\$ 1.881.709,39

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 1.881.709,39 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 1.794.268,61 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 3.237



**RENOVA SP – Morro do S4**

**Produtos realizados / em andamento**

**ÁREAS DE PROVISÃO (Capelinha/Nuno Roland, Jd. Germânia, Jd. Campo de Fora/Sto. Antonio, Jd. Campo de Fora II)**

**Concluído:**

**C 2 - Projeto T+B**

Estudo Preliminar: Edificação

**Em andamento**

**C 2a - Projeto T + B adequação G1**

Estudo Preliminar: Edificação - Adequação G1

**C 2b - Projeto T + B adequação G2**

Estudo Preliminar: Edificação - Adequação G2

**CÓRREGO DOS FREITAS (Complemento do viário)**

**Em andamento:**

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Iluminação Pública

**Concluído:**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

ÁREA - FAVELA HENRI MATISSE  
ÁREA - FAVELA JD. ANTONIETA / JD. SANTO ANTONIO

ÁREA - FAVELA JD. CAMPO DE FORA / SANTO ANTONIO

ÁREA - FAVELA CAMPO DE FORA II

ÁREA - FAVELA CAPELINHA / NUNO ROLAND

ÁREA - FAVELA DUPRAT

ÁREA - FAVELA JD. FIM DE SEMANA

ÁREA - FAVELA JD. FIM DE SEMANA II

ÁREA - FAVELA JD. FIM DE SEMANA III

ÁREA - FAVELA JARDIM GERMÂNIA

ÁREA - FAVELA JARDIM IMBÉ I

ÁREA - FAVELA JARDIM IMBÉ II

ÁREA - FAVELA JARDIM LILIA

ÁREA - FAVELA JARDIM MARACANÃ

ÁREA - FAVELA PQ. SANTO ANTONIO IV

ÁREA - FAVELA PQ. SANTO ANTONIO V

ÁREA - FAVELA PQ. SANTO ANTONIO VI

ÁREA - FAVELA TRÊS ESTRELAS

ÁREA - FAVELA VAZ DE LIMA / SANTO DIAS / JARDIM LIDIA

ÁREA - FAVELA VICENTE CARDUCHO

ÁREA - FAVELA JD. CAMPO DE FORA III

ÁREA - FAVELA ANTONIETA II

ÁREA- FAVELA FIM DE SEMANA IV

**Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água

Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública



**RENOVA SP – Morro do S4**

**Produtos realizados / em andamento - 2014**

**ÁREA - FAVELA JD. CAMPO DE FORA/ SANTO ANTONIO**

**Concluído**

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA JD. CAMPO DE FORA II**

**ÁREA - FAVELA JARDIM GERMANIA**

**Concluído**

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA JD. CAPELINHA / NUNO ROLAND**

**Concluído**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA JARDIM IMBÉ I**

**Concluído**

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA JARDIM IMBÉ II**

**Concluído**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA VAZ DE LIMA / SANTO DIAS/ JARDIM LIDIA**

**Concluído**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo

**ÁREA - FAVELA VICENTE CARDUCHO**

**Concluído**

Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**ÁREA - FAVELA JARDIM CAMPO DE FORA III**

**Concluído**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**D 36 - Reservatório de 3 Módulos no Córrego dos Freitas**

Estudo Hidrológico e Hidráulico do Reservatório de 3 Módulos  
Projeto Básico Hidráulico do Reservatório de 3 Módulos  
Estudo Geotécnico e de Fundação do Reservatório de 3 Módulos  
Projeto Básico de Terraplenagem do Reservatório de 3 Módulos  
Projeto Básico de Estrutura do Reservatório de 3 Módulos  
Orçamento para a canalização, drenagem e Reservatório de 3 Módulos



## RENOVA SP – Oratório 1

**Objeto:** Elaboração de Plano Urbanístico,  
Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de  
Urbanização e Edificações.

**Valor aprovado FUNDURB 2014:** R\$ 623.364,38

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 623.364,38 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 620.812,82 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.155

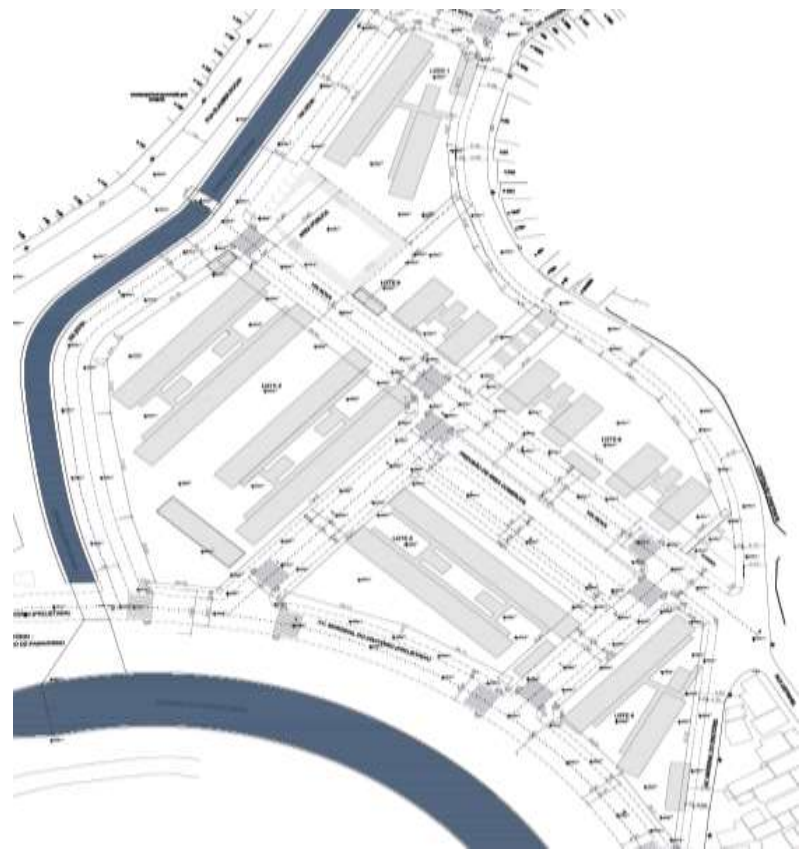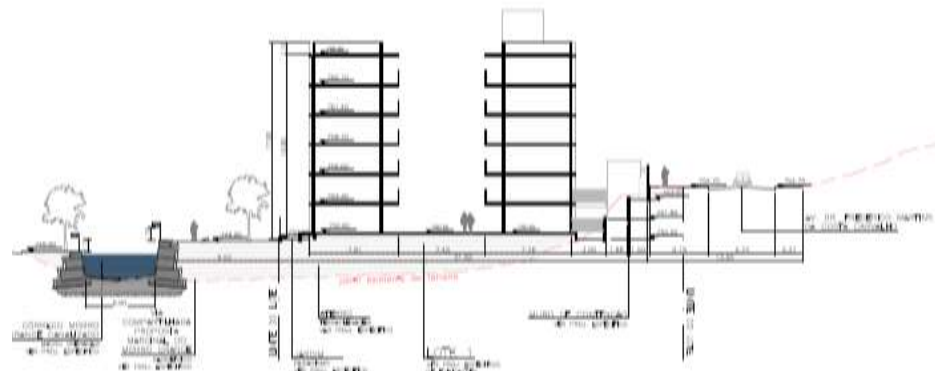

## RENOVA SP – Oratório 1

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREAS DE PROVISÃO (Iguaçu)

##### Concluído

##### **C1 - Projetos T + 4:**

Estudo Preliminar: Edificação

##### **C 1a - Projeto T + 4 adequação Grau 1**

Estudo Preliminar: Edificação - Adequação G1

##### Em andamento

##### **C1 - Projetos T+4**

Projeto Básico de Arquitetura

Projeto Básico de Fundação

Projeto Básico de Estrutura

Projeto Básico de Instalações Prediais

##### **C 1a - Projeto T + 4 adequação Grau 1**

Projeto Básico de Arquitetura - Adequação G1

Projeto Básico de Estrutura - Adequação G1

Projetos Básicos de Instalações Prediais

##### **C 5 - Projeto de Implantação e infraestrutura para 150UH's**

##### **C 6 - Projeto de Implantação e infraestrutura para 75UH's**

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial

Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário

Projeto Básico de Instalações Prediais

##### **C 7 - Projeto de Implantação e infraestrutura para 20UH's**

Projeto Básico de Instalações Prediais

#### ÁREA - FAVELA IGUAÇU

#### ÁREA - FAVELA JARDIM PLANALTO I, II e III

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água

Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA JARDIM ADUTORA

#### ÁREA - FAVELA JARDIM ELBA

#### ÁREA - FAVELA SANTA MADALENA II

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

#### ÁREA - FAVELA PQ. STA. MADALENA I

#### ÁREA - FAVELA ALTOS DE VL. PRUDENTE

#### ÁREA - FAVELA FAZENDA DA JUTA IV

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico de Paisagismo




## RENOVA SP – Pirajussara 5

**Objeto: Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.**

**Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 934.361,39**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 934.361,39 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 933.095,49 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.676

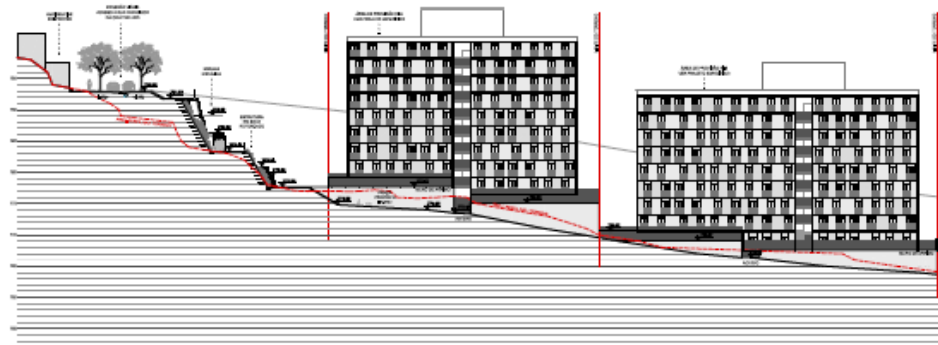



**RENOVA SP – Pirajussara 5**

**Produtos realizados / em andamento - 2014**

**ÁREAS DE PROVISÃO (Boris Davidoff e Horto do Ipê - Cond. A a D)**

**Concluído**

**C1 - Projetos T + 4:**

Estudo Preliminar: Edificação

**C2 - Projetos T + 8:**

Estudo Preliminar: Edificação

**C 2a - Projeto T + 8 adequação G2**

Estudo Preliminar: Edificação

**Em andamento**

**C1 - Projetos T + 4:**

Projeto Básico de Arquitetura

Projeto Básico de Fundação

Projeto Básico de Estrutura

Projeto de Instalações Prediais

Relatórios de Consultoria de Estrutura e

Instalações Prediais

**C 1a - Projeto T + 4 adequação G2**

Estudo Preliminar: Edificação

Projeto Básico de Arquitetura

**C2 - Projetos T + 8**

Projeto Básico de Arquitetura

Projeto Básico de Fundação

Projeto Básico de Estrutura

Projeto Básico de Instalações Prediais

**C 2a - Projeto T + 8 adequação G2**

Projeto Básico de Arquitetura

Projeto Básico de Estrutura

Projeto Básico de Instalações Prediais

**ÁREA - FAVELA ARMANDO ERSE**

**Concluído**

Projeto Básico de Urbanismo

**ÁREA - FAVELA JARDIM FARIA LIMA**

**ÁREA - FAVELA VILA NOVA**

**Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo

**C3 - Projeto de Implantação e Infraestrutura para 150 UH**

**C5 - Projeto de Implantação e Infraestrutura para 75 UH**

Projeto Básico Geométrico Condominial

Projeto Básico de Terraplenagem Condominial

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica Condominial

Projeto Básico de Pavimentação Condominial

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial

Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário

Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Instalações Prediais

Projeto Básico de Paisagismo Condominial

## Produtos realizados / em andamento - 2014

ÁREA - FAVELA CROMER

ÁREA - FAVELA UMUARAMA

ÁREA - FAVELA MARIA VIRGINIA

ÁREA - FAVELA MONFORTE LEMOS

ÁREA - FAVELA VALE DAS VIRTUDES

ÁREA - FAVELA VIELA CINCO

ÁREA - FAVELA HORTO DO IPÊ

### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Getécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água

Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto

Sanitários

Projeto Básico de Drenagem (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

ÁREA - FAVELA CROMER

### Concluído

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

ÁREA - FAVELA UMUARAMA

### Concluído

Projeto Básico Geométrico

Projeto Básico de Terraplenagem

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Pirajussara 7

**Objeto:** Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.

**Valor solicitado FUNDURB 2014:** R\$ 146.668,68

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 146.668,68 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 130.815,29 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 918



## RENOVA SP – Pirajussara 7

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREAS DE PROVISÃO

##### Concluído

CL - Projetos T + 4:

Estudo Preliminar: Edificação

ÁREA - FAVELA CANTO DO RIO VERDE

ÁREA - FAVELA MIRANDAS I

ÁREA - FAVELA MIRANDAS II

ÁREA - FAVELA OLARIA

ÁREA - FAVELA VILA PRAIA

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água

Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

D 14 - Córrego dos Mirandas - Complementação da Drenagem (L=1300m)

##### Em andamento

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

ÁREA - FAVELA FRANCISCO DE SALES

ÁREA - FAVELA JARDIM DAS PALMAS

ÁREA - FAVELA PASSAGEM NOTURNA

ÁREA - FAVELA VILA MORUMBI

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário

Projeto Básico de Terraplenagem

Projeto Básico de Consolidação Geotécnica

Projeto Básico de Pavimentação

Projeto Básico de Redes de Abastecimento d Água

Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)

Projeto Básico de Paisagismo

Projeto Básico de Iluminação Pública

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

ÁREA - MIRANDAS II

##### Concluído

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico de Paisagismo

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

ÁREA - FAVELA FRANCISCO DE SALES

##### Concluído

Projeto Básico de Paisagismo

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos






## RENOVA SP – Ponte Baixa 4

**Objeto:** Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.

**Valor solicitado FUNDURB 2014:** R\$ 154.414,45

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015
- Valores empenhados: R\$ 154.414,45 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 123.743,37 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.361

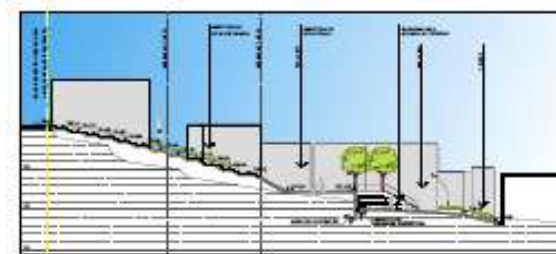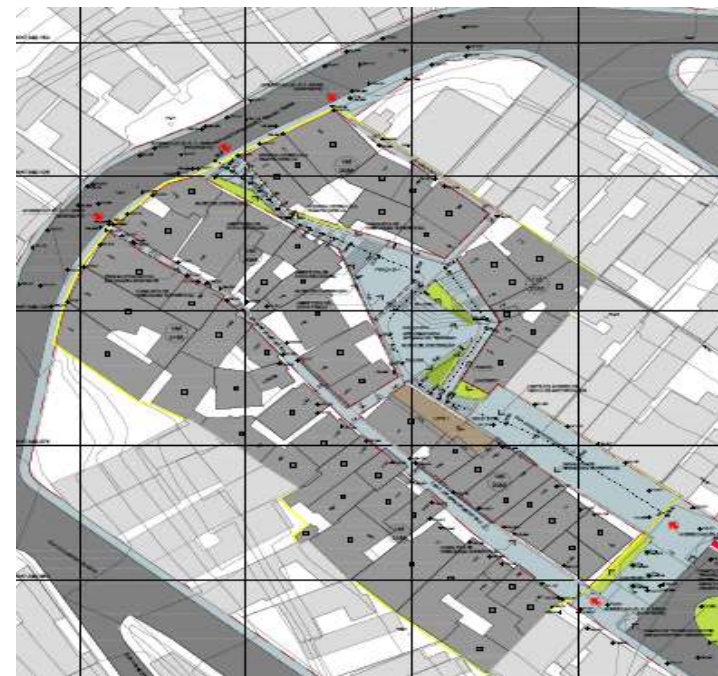

**RENOVA SP – Ponte Baixa 4**

**Produtos realizados / em andamento - 2014**

**ÁREA - FAVELA JARDIM DA FELICIDADE**

**ÁREA - FAVELA JARDIM IBIRAPUERA**

**Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto  
Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo

**ÁREA - FAVELA JARDIM SÃO FRANCISCO**

**Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto  
Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo

**ÁREA - FAVELA SANTA JOSEFINA**

**ÁREA - FAVELA JARDIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

**Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto  
Sanitários  
Projeto Básico de Paisagismo

**Concluído**

Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Iluminação Pública

**RENOVA SP - BUREAU**

**Objeto: Elaboração de Plano Urbanístico, Estudo Preliminar, Projeto Básico e Executivo de Urbanização e Edificações.**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: julho/2015

| Perímetros<br>Regiões Norte, Leste e<br>Centro | Valores ( R\$)      |                     |                      |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                | Aprovado            | Empenhado           | Liquidado até out/14 |
| Cabuçu de Baixo 4                              | 243.178,89          | 243.178,89          | 243.177,75           |
| Cabuçu de Baixo 5                              | 672.054,59          | 672.054,59          | 671.898,10           |
| Cabuçu de Baixo 12                             | 668.524,93          | 668.524,93          | 667.749,58           |
| Cabuçu de Cima 7                               | 442.859,81          | 442.859,81          | 442.857,01           |
| Cabuçu de Cima 8                               | 865.719,08          | 865.719,08          | 865.518,73           |
| Cabuçu de Cima 10                              | 349.130,52          | 349.130,52          | 344.393,92           |
| Jardim Japão                                   | 287.437,47          | 287.437,47          | 287.435,84           |
| Água Vermelha                                  | 782.698,62          | 782.698,62          | 782.698,18           |
| Tiquatira                                      | 456.846,36          | 456.846,36          | 456.351,82           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>4.768.450,37</b> | <b>4.768.450,27</b> | <b>4.762.080,93</b>  |




## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 4

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014:** R\$ 243.178,89

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 243.178,89 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 243.177,75 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 598

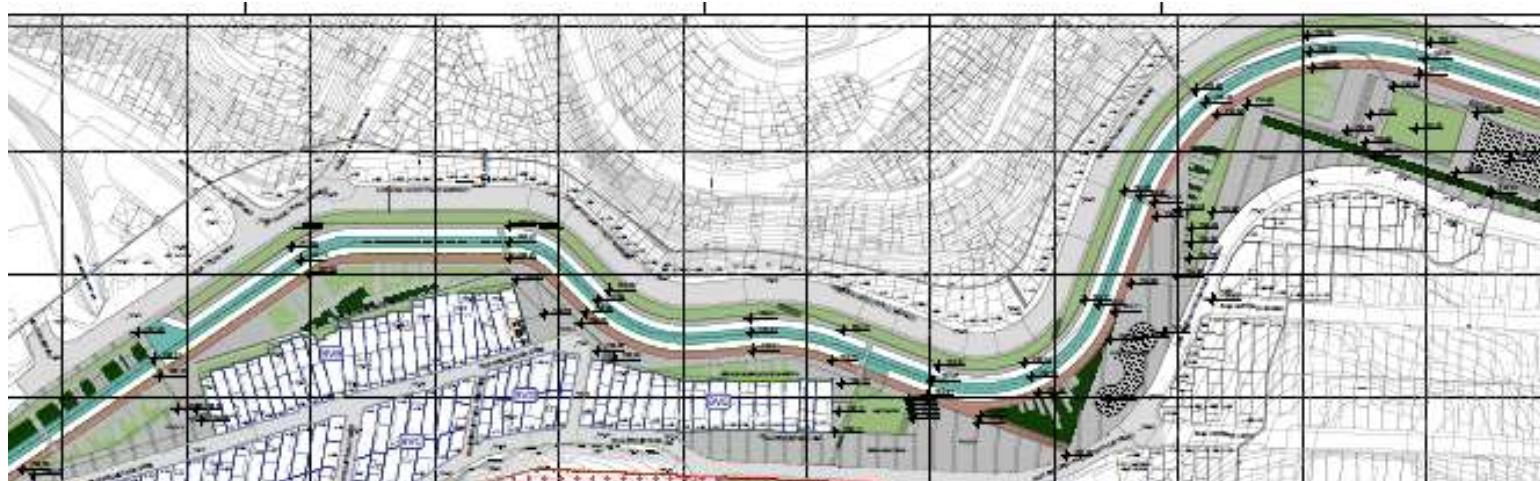



## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 4

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - FAVELA DANIEL CERRI I

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA DANIEL CERRI II

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA GREGÓRIO POMAR

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água+memorial  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitário+memorial  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA HUGO ÍTALO MERIGO

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 4

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **ÁREA - LOTEAMENTO ASSOC. DOS MORADORES - JD. BOA VISTA**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 5

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014:** R\$ 672.052,69

**Situação:**

- Previsão de conclusão: nov/2015
- Valores empenhados: R\$ 672.054,59 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 671.898,10 (até out/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.215



## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 5

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **TIPOLOGIA T + 8**

##### **Em andamento**

Estudo preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Relatório de Consultoria de Estruturas  
Relatório de Consultoria de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Relatório de Consultoria de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO I**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico Consolidação Geotécnica Condominial  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO II**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico Consolidação Geotécnica Condominial  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial

#### **ÁREA - FAVELA JARDIM PARANÁ**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

#### **ÁREA FAVELA ALEGRIA**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos



## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 5

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - FAVELA SÃO GERALDO JARDEL FILHO

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA BANANAL DIREITO

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA BANANAL ESQUERDO

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA CIDADE BAIXA

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA JARDIM PRINCESA

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 5

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **ÁREA - FAVELA MATIM PERERÊ**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - FAVELA MORRO DO PIOLHO**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - LOTEAMENTO PARANÁ (INVASÃO)**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)

## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 12

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014: R\$ 668.524,93**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 668.524,93 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 667.749,58 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 927



## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 12

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **TIPOLOGIA T + 4**

##### **Em andamento**

Estudo preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Projeto Básico de Fundações  
Projeto Básico de Estruturas  
Projetos Básicos de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Projetos Básicos de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **TIPOLOGIA T + 4A**

##### **Em andamento**

Estudo preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Projeto Básico de Fundações  
Projeto Básico de Estruturas  
Projetos Básicos de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Projetos Básicos de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **TIPOLOGIAS T + 4 – ADAPTAÇÃO**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Arquitetura  
Projeto Básico de Fundações  
Projeto Básico de Estruturas  
Projetos Básicos de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Projetos Básicos de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 7**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>



## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 12

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 8**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 9**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 10**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 11**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 12

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 12**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 13**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial REVISADO  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 14**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial REVISADO  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de 2.001 à 5.000m<sup>2</sup>

#### **ÁREA - FAVELA CONDESSA AMÁLIA MATARAZZO**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela de pedestres)  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de até 2.000m<sup>2</sup>  
Projeto Básico de Estruturas (para ponte viária)  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de até 2.000m<sup>2</sup>

## RENOVA SP – Cabuçu de Baixo 12

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - FAVELA LETICIA CINI

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA SÃO JOSÉ / BRUNA GALEA

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA EUCALIPTOS

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela de pedestres)  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de até 2.000m<sup>2</sup>  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela de pedestres)  
Parecer Técnico de Fundação para Área Construída de até 2.000m<sup>2</sup>


## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 7

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014: R\$ 442.859,81**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 442.859,81 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 442.857,01 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.564

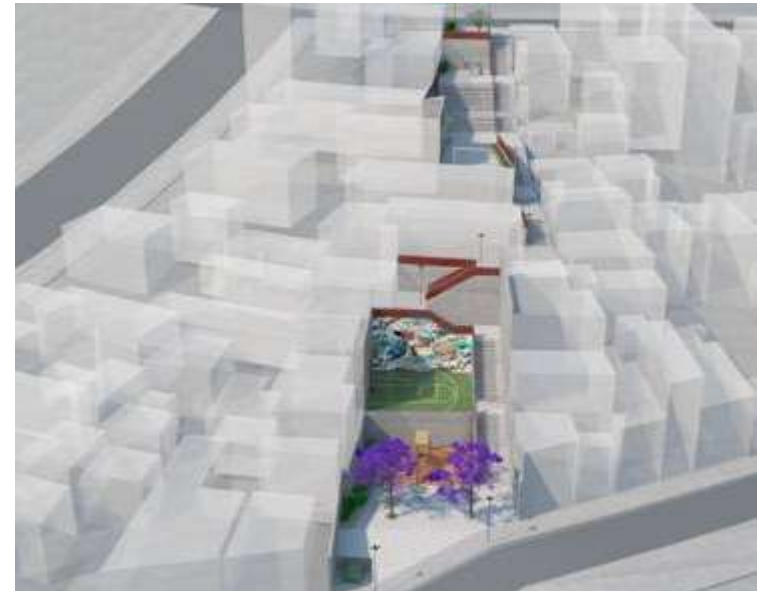



## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 7

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 1

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 2

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 3

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 4

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 7

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 4 - EXTENSÃO**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 5**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - LOTEAMENTO JOVA RURAL II / SD GLEBA REMANESCENTE 6**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 8

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014: R\$ 865.719,08**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 865.719,08 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 865.518,73 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.003



## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 8

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - FAVELA ATALIBA LEONEL

##### Em andamento

Projetos Básicos: Urbanização e Infraestrutura  
Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA GUAPIRA I

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela)  
Parecer Técnico de Fundação para área construída até 2.000m<sup>2</sup>

#### ÁREA - FAVELA GUAPIRA II

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela)  
Parecer Técnico de Fundação para área construída até 2.000m<sup>2</sup>

#### ÁREA - FAVELA GUILHERME BUDE

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela)  
Parecer Técnico de Fundação para área construída até 2.000m<sup>2</sup>



## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 8

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **ÁREA - FAVELA ATALIBA LEONEL II**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - SANTA CASA - ENCOSTA DO GUAPIRA II**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Projeto Básico de Estruturas (para passarela)  
Parecer Técnico de Fundação para área construída até 2.000m<sup>2</sup>


## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 10

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014: R\$ 349.130,52**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 349.130,52 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 344.393,92 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 920

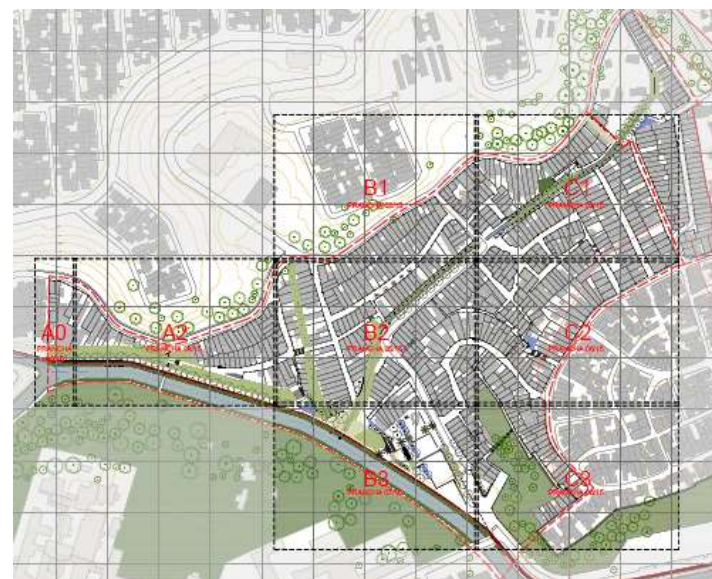

## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 10

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - FAVELA BAIXA GRANDE

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA VILA NOVA GALVÃO I

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA ERNESTO SIMÕES FILHO

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - LOTEAMENTO RUA COSTA BRITO

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Cabuçu de Cima 10

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA - FAVELA IGARAPÉ PRIMAVERA

##### Em andamento

Projeto Básico de Urbanismo

Projeto Básico de Paisagismo



## RENOVA SP – Água Vermelha 2

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014:** R\$ 782.698,62

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 782.698,62 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 782.698,18 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 1.126



## RENOVA SP – Água Vermelha 2

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **TIPOLOGIAS T + 4**

##### **Em andamento**

Estudo preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Relatório de Consultoria de Estruturas  
Relatório de Consultoria de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Relatório de Consultoria de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **INFRAESTRUTURA – ÁREA DE PROVISÃO 9**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica Condominial  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial (Revisado)  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial

#### **ÁREA – FAVELA JETAIBA**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA – FAVELA SAFIRA READEQUADA**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

## RENOVA SP – Água Vermelha 2

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **ÁREA – LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDORADO**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA – LOTEAMENTO SEABRA NÃO REGULARIZADO**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos



## RENOVA SP – Tiquatira 2

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014:** R\$ 456.846,36

**Situação:**

- Previsão de conclusão: março/2015
- Valores empenhados: R\$ 456.846,36 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 456.351,82 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 461





## RENOVA SP – Tiquatira 2

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **TIPOLOGIAS T + 4**

##### **Realizado**

Estudo preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Relatório de Consultoria de Estruturas  
Relatório de Consultoria de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Relatório de Consultoria de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **TIPOLOGIAS T + 8**

##### **Realizado**

Estudo preliminar: Edificação  
Projeto Básico de Arquitetura  
Relatório de Consultoria de Estruturas  
Relatório de Consultoria de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Relatório de Consultoria de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **TIPOLOGIAS T + 4 ADAPTAÇÃO**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Arquitetura  
Relatório de Consultoria de Estruturas  
Relatório de Consultoria de Instalações Hidráulicos-Sanitários prediais de gás e de combate a incêndios  
Relatório de Consultoria de Instalações Elétricas Prediais, de Telefonia, de Telecomunicações e de Proteção contra descargas atmosféricas

#### **TIPOLOGIAS T + 8 ADAPTAÇÃO**

##### **Em andamento**

Estudo preliminar: Edificação

#### **INFRAESTRUTURA - ÁREA DE PROVISÃO 1**

##### **Realizado**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica Condominial  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial

#### **INFRAESTRUTURA - ÁREA DE PROVISÃO 2**

##### **Em andamento**

Projeto Básico Geométrico Condominial  
Projeto Básico de Terraplenagem Condominial  
Projeto Básico de Pavimentação Condominial  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial  
Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário  
Projeto Básico de Drenagem Condominial (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial  
Projeto Básico de paisagismo Condominial

## **Produtos realizados / em andamento - 2014**

### **INFRAESTRUTURA - ÁREA DE PROVISÃO 4**

#### **Em andamento**

- Projeto Básico Geométrico Condominial
- Projeto Básico de Terraplenagem Condominial
- Projeto Básico de Consolidação Geotécnica Condominial
- Projeto Básico de Pavimentação Condominial
- Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água Condominial
- Projeto Básico de Redes Condominiais de Esgotamento Sanitário
- Projeto Básico de Drenagem Condominial (micro Drenagem)
- Projeto Básico de Instalações Elétricas / Iluminação / Telefonia Condominial
- Projeto Básico de paisagismo Condominial

## RENOVA SP – Jardim Japão 1

**Objeto:** Elaboração de plano urbanístico, estudo preliminar, projeto básico e executivo de urbanização e edificações.

**Valor solicitado FUNDURB em 2014: R\$ 287.437,47**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: junho/2015
- Valores empenhados: R\$ 287.437,47 (até dez/2014)
- Valores liquidados: R\$ 287.435,84 (até dez/2014)
- Total de Pranchas produzidas: 782



## RENOVA SP – Jardim Japão

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### ÁREA PARQUE NOVO MUNDO - VILA MARIA

##### Em andamento

Projeto de Revitalização / Urbanismo (3R)

#### ÁREA - FAVELA CHARCO

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA MARIA QUEDAS

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### ÁREA - FAVELA SARGENTO JOSÉ PESSOTO SOBRINHO

##### Realizado

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos



## RENOVA SP – Jardim Japão

### Produtos realizados / em andamento - 2014

#### **ÁREA - FAVELA VILA PEDREIRA**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - FAVELA VILA SÃO JOÃO**

##### **Realizado**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

#### **ÁREA - FAVELA FUNERÁRIA**

##### **Em andamento**

Projeto Básico de Urbanismo  
Projeto Básico Geométrico do Sistema Viário  
Projeto Básico de Terraplenagem  
Projeto Básico de Consolidação Geotécnica  
Projeto Básico de Pavimentação  
Projeto Básico de Redes de Abastecimento de Água  
Projeto Básico de Redes de Coleta de Esgoto Sanitários  
Projeto Básico de Drenagem Urbana (Micro Drenagem)  
Projeto Básico de Canalização (Macro Drenagem)  
Projeto Básico de Paisagismo  
Projeto Básico de Iluminação Pública  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

**GERENCIAMENTOS****Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO AOS PROGRAMAS DA SEHAB**

| PROCESSO         | GERENCIAMENTOS                                                                         | VALORES ( R\$)       |                      |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                                        | Aprovado             | Empenhado            | Liquidado            |
| 2011-0.141.677-3 | <b>Cobrape</b> - Social                                                                | 1.036.553,80         | 1.036.553,80         | 1.011.676,46         |
| 2011-0.141.687-0 | <b>Diagonal</b> - Social                                                               | 3.755.278,35         | 3.755.278,35         | 3.753.803,24         |
| 2011-0.174.242-5 | <b>Ieme Brasil</b> - Cadastro                                                          | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         | 5.674.949,99         |
| 2011-0142.031-2  | <b>Núcleo</b> - Regularização                                                          | 11.650.000,00        | 11.650.000,00        | 11.649.999,93        |
| 2008-0.279.853-1 | <b>Consórcio Domus</b> - (Programa, Projetos e Obras - Regiões Sul e Sudeste )         | 1.807.838,09         | 1.807.838,09         | 1.803.388,50         |
| 2010-0.038.063-3 | <b>Consórcio Bureau-Pri</b> - (Programa, Projetos e Obras, Regiões Norte-Leste-Centro) | 2.424.805,86         | 2.424.805,86         | 2.416.290,34         |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                        | <b>26.374.476,10</b> | <b>26.374.476,10</b> | <b>26.310.108,46</b> |

**Objeto: Serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social, previstos nos programas e empreendimentos habitacionais da SEHAB.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 1.036.553,80**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: Conforme cronograma de obras
- Valores empenhados: R\$ 1.036.553,80(até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 1.011.676,46(até dezembro/2014)



## PARQUE DAS FLORES





**DIAGONAL**

**Objeto: Serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social, previstos nos programas e empreendimentos habitacionais da SEHAB.**

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 3.755.278,35**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: Janeiro/2015
- Valores empenhados: R\$ 3.755.278,35( até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 3.753.803,24 (até dezembro/2014)



Itaberaba II – Acompanhamento de famílias em fase de Obras



Itaberaba II – Vista loteamento no pós obras



Agosto/2014

**Morro do S 4** - Reunião Conselho Gestor



Setembro/2014

**Ponte Baixa 4** - Eleição do Conselho Gestor



Agosto/2014

**Pirajussara 5** - Reunião Conselho Gestor



Fevereiro/2015

**Pirajussara 7** - Visita técnica





**Chácara Bela Vista** – Gestão Condominial



**Jardim Imperador** - Gestão Condominial – treinamento em prestação de contas



**Chácara Bela Vista** – Acompanhamento de remoções em área comum do empreendimento



**Parque Otero** – aplicação de pesquisa qualitativa

**Objeto:** Serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de pesquisas e cadastramentos previstos nos programas e empreendimentos habitacionais, com apoio de bens e outros serviços correlatos para sua execução.

**Valor aprovado FUNDURB 2014:** R\$ 5.700.000,00

**Situação:**

- Previsão de conclusão: Janeiro/2015
- Valores empenhados: R\$ 5.700.000,00 (até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 5.674.949,00 (até dezembro/2014)



VIADUTO CANGAÍBA



NOVA JAGUARÉ



**MORADA DO SOL**



**COPA DO POVO**



## VIADUTO CANGAÍBA



## MORRO DO CIPÓ





## NÚCLEO ENGENHARIA

**Objeto:** Serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria , gerenciamento para Regularização Fundiária de loteamentos, núcleos habitacionais e conjuntos habitacionais.

**Valor aprovado FUNDURB 2014:** R\$ 11.650.000,00

**Situação:** Serviços técnicos em andamento

- Previsão de conclusão: contrato de serviços contínuos
- Valores empenhados: R\$ 11.650.000,00 (até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 11.649.999,93 (até dezembro/2014)



**Cidade D´Abril – Gleba 03 - 2.041 famílias**



**Santa Casa – Jd. Hebron – 1.427 famílias**

## Regularização Fundiária de loteamentos, núcleos habitacionais e conjuntos habitacionais



**Nova Jaguaré – 2.861 famílias**



**C. H. Kenkiti Shimomoto – 110 famílias**



**Várzea do Carmo – 616 famílias**



**Condomínio Paraíso – 79 famílias**



## Consórcio DOMUS

**Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Engenharia Consultiva para o Gerenciamento e Assessoria Técnica para a implantação dos Programas e Empreendimentos Habitacionais. Regiões Sul e Sudeste do Município de São Paulo**


**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 1.807.838,09**

### **Situação:**

- Previsão de conclusão: março/2015
- Valores empenhados: R\$ 1.807.838,09 (até dezembro/2014)
- Valores liquidados: R\$ 1.803.388,50 (até dezembro/2014)



**Gerenciamento de Projetos Renova SP : Perímetro: Pirajussara 5**

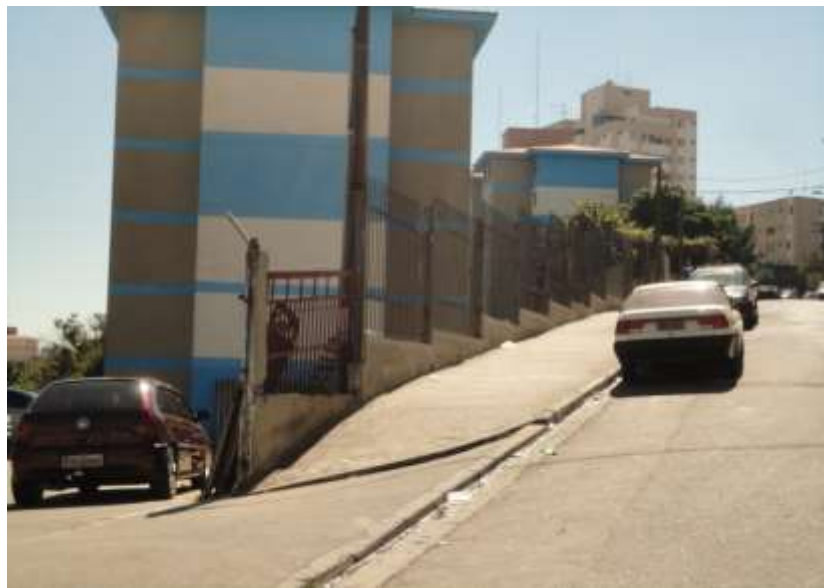

**Gerenciamento de Obras 3Rs: São Domingos**


## Consórcio DOMUS



Parque Otero



Campo Grande

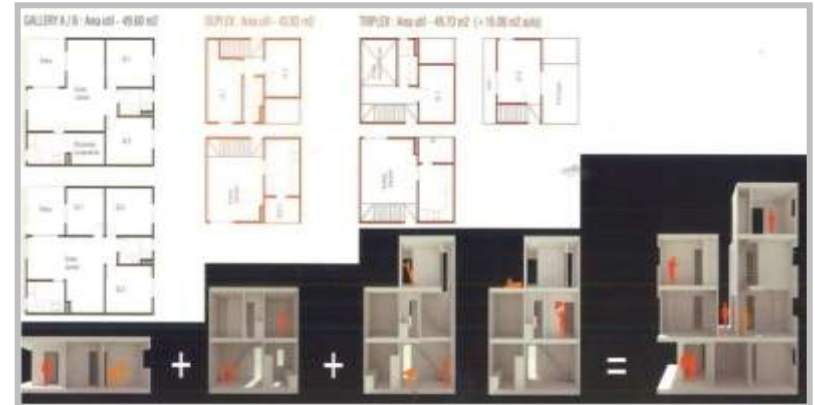

Gerenciamento de Projetos Renova SP : Pirajussara 7

## Consórcio Bureau-Sistema Pri

**Objeto:** Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Engenharia Consultiva para o Gerenciamento e Assessoria Técnica para a implantação dos Programas e Empreendimentos Habitacionais.

**Valor aprovado FUNDURB 2014: R\$ 2.424.805,86**

**Situação:**

- Previsão de conclusão: março/2015
  - Valores empenhados: R\$ 2.424.805,86 (até dezembro/2014)
  - Valores liquidados: R\$ 2.416.290,34 (até dezembro/2014)



**Gerenciamento de Projetos Renova SP : Perímetro: Cabuçu de Baixo 5**



**Gerenciamento de Obras : 3R's – Lote C – City Jaraguá**



**Consórcio Bureau-Sistema Pri**



**3Rs - Bela Vista : Lote D - Cond. 1**



**Parque das Flores- Pavimentação – Av. Adutora do Rio das Pedras**



**Gerenciamento de Projetos Renova SP : Taquaritira 2**





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

# **FUNDURB / SIURB**

## **Prestação de Contas / 2014**

Data base da ultima posição orçamentária: 31/12/14



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM**

# Taxa CEF Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Viabilizar prestação de contas para o PAC e garantir repasse do Governo Federal.

- Valor solicitado ao FUNDURB 2014: R\$ 3.395,28
- Situação: Prestação de contas aprovada. Taxa paga.
- Valores empenhados: R\$ 3.395,28
- Valores liquidados: R\$ 3.395,28
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90,,39.00.08

# Ponte Baixa - Material Expropriatório

**Objeto:** O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 1.291.237,92
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 1.291.237,92
- Situação: Material em revisão (mudança do traçado).
- Valores empenhados: R\$ 1.291.237,92
- Valores liquidados: R\$ 1.144.760,30
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08



# Ponte Baixa – Trabalho Social Reajuste

**Objeto:** Reajustes referentes aos trabalhos sociais necessários

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 125.862,85
- Situação: Trabalho em andamento.
- Valores empenhados: R\$ 125.862,85
- Valores liquidados: R\$ 102.935,70
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Córrego do Cordeiro – Material Expropriatório

**Objeto:** O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório, que é utilizado para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessário à implantação do melhoramento.

- Valor do contrato: R\$ 24.045,84
- Valores solicitados FUNDURB 2014: R\$ 24.045,84
- Situação: Elaboração finalizada, medição em tramitação.
  
- Valores empenhados: R\$ 24.045,84
- Valores liquidados: R\$ 24.045,84
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.08

# Gerenciadora – Lote 1 e Lote 2

**Objeto:** Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Engenharia Consultiva para o Gerenciamento e Assessoria Técnica para Implantação de Programas de Infraestrutura Urbana e de Edifícios Públicos.

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 26.600.000,00
- Situação: Em andamento
- Valores empenhados: R\$ 14.800.000,00 (lote 1) + R\$ 11.800.000,00 (lote 2) = R\$ 26.600.000,00
- Valores liquidados: R\$ 12.191.330,64 (lote 1) + R\$ 9.522.395,88 (lote 2) = R\$ 21.713.726,52
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Licenciamentos Ambientais (FUPAM)

**Objeto:** Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura para elaboração de estudos ambientais até licença ambiental de instalação (LAI) para diversos empreendimentos de drenagem


- Valor do contrato: R\$ 10.000.000,00
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 0,00
- Valor pretendido: R\$ 0,00
  
- Situação: suspensão a contratação
  
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08



# Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego da Paciência

**Objeto:** Estudo de drenagem e projeto básico de canalização , geométrico, pavimentação estrutural, licenciamento ambiental, iluminação, sinalização viária, desvio de tráfego e paisagismo do córrego paciência

- Valor do contrato: R\$ 1.153.133,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 729.762,60
- Situação: Projeto concluído
- Valores empenhados: R\$ 729.762,60
- Valores liquidados: R\$ 729.657,01
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

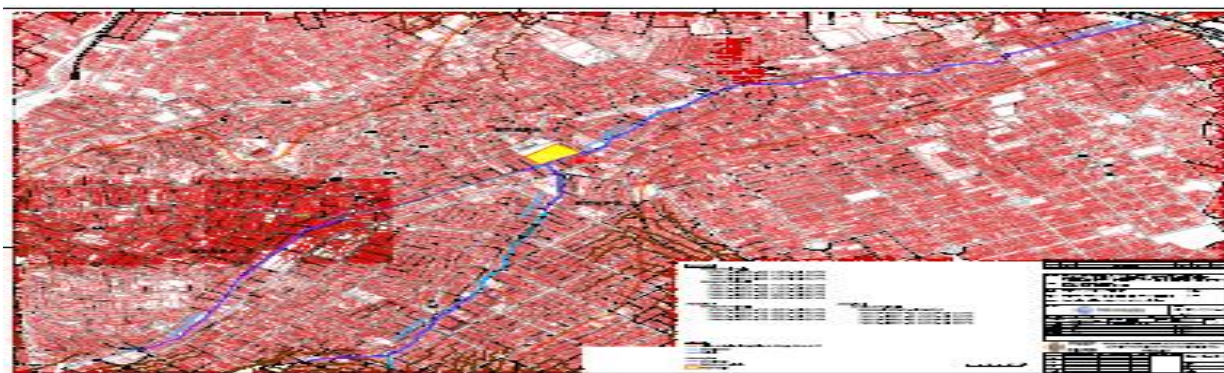

# Córrego Tremembé - Projeto

**Objeto:** Projeto básico de Canalização de córregos associada à construção de reservatórios de amortecimento de cheias (R-1, R-2, R-3A, R-3B, R-4, R-5 e R-6) e implantação de 6 parques lineares- ( $V = 217.000\text{m}^3$ )

- Valor do contrato: R\$ 604.962,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor pretendido atualizado: R\$ 27.007,56
- Justificativa das alterações: retificação no valor da medição final.
- Situação: Projeto concluído – em fase de medição final.
- Valores empenhados: R\$ 27.007,56
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Córrego Rapadura – Projeto Básico e Executivo

**Objeto:** Elaboração do Projeto básico e executivo de canalização do córrego Rapadura.

- Valor do contrato: R\$ 374.239,97
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 36.782,27
- Situação: Projeto em elaboração
  
- Valores empenhados: R\$ 36.782,27
- Valores liquidados: R\$ 0,00
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08

# Obra do Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Execução de Obras de Canalização dos Córregos Ponte Baixa e do Jardim Letícia com Implantação de Reservatório de Regularização de Vazão e Viário entre a Av. Guido Caloi e a Rua Daniel Klein, obras de arte de interligação, Parque Linear e Urbanização, remoção de famílias e elaboração de projetos executivos parciais.

- Valor do contrato: R\$ 399.375.476,80
- Valores solicitados FUNDURB 2014: R\$ R\$ 52.191.605,46
- Valor atualizado: R\$ 42.191.605,00
- Justificativa das alterações: cobertura dos valores antes previstos na securitização do FMSAI
- Valores empenhados: R\$ 42.191.605,46
- Valores liquidados: R\$ 38.083.967,33
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08





# Córrego Ponte Baixa - Enterramento de Rede

**Objeto:** Remanejamento de redes aéreas existentes para o modo subterrâneo para viabilizar as obras de canalização dos córregos Ponte Baixa e do jardim Letícia

- Valor solicitado FUNDURB 2014 : R\$ 837.232,35
- Valor aprovado: R\$ 837.232,35
- Valor atualizado: R\$ 1.034.596,88
- Situação: Obra contratada
- Valores empenhados: R\$ 1.034.596,88
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Obra da Bacia do Córrego Cordeiro

**Objeto:** Realizar intervenções de controle de cheias na bacia do Córrego do Cordeiro com o objetivo na redução das ocorrências de enchentes, 6 reservatórios, 4 caixas de equalização de vazão e canalização de córrego.

- Valor do contrato: R\$ 142.927.466,72
- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 56.800.898,47
- Valor atualizado: R\$ 56.698.130,82
- Justificativa das alterações: ajuste no cronograma
- Situação: Obra em execução
  
- Valores empenhados: R\$ 56.698.130,82
- Valores liquidados: R\$ 55.824.206,95
  
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

**Objeto:** Inclui execução de galerias de águas pluviais, ampliação das captações existentes, recomposição de pavimento, contenção de margens e elaboração de projetos executivo e “as built” .

- Valor do contrato: R\$ 136.896.340,90
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
  - Valor aprovado: R\$ 36.460.988,68
  - Valor atualizado: R\$ 36.366.391,70
  - Justificativa: ajuste no cronograma
- Situação: obra em andamento
- Valores empenhados: R\$ 36.366.392,00
- Valores liquidados: R\$ 35.961.144,26
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras Concluídas

| Endereço                              | Subprefeitura               |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Rua Maestro Batista Julião            | Ipiranga                    |
| Rua João Teodoro                      | Mooca                       |
| Rua Dr Miguel Motta                   | Mooca                       |
| Rua Eugenio Freitas                   | Vila Maria / Vila Guilherme |
| Rua Leandro Ferreira                  | Vila Maria / Vila Guilherme |
| Travessa Emabaúba                     | Vila Maria / Vila Guilherme |
| Rua Maria Quedas                      | Vila Maria / Vila Guilherme |
| Rua Coronel Joaquim Ferreira de Souza | Santana / Tucuruvi          |
| Rua Helena Sacramento                 | Santana / Tucuruvi          |
| Rua Jardimirim                        | Santana / Tucuruvi          |
| Rua Jardinésia                        | Santana / Tucuruvi          |
| Travessa Neco                         | Santana / Tucuruvi          |



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras Concluídas

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| João Delgado                                    | Freguesia do Ó / Brasilândia |
| Monte Alegre do Sul                             | Freguesia do Ó / Brasilândia |
| Raulino Gaudino                                 | Freguesia do Ó / Brasilândia |
| Rodolfo Bardela                                 | Freguesia do Ó / Brasilândia |
| Rua Tapendi e Rua Tacoativa                     | Pirituba / Jaraguá           |
| Córrego Sítio Casa Pintada                      | São Miguel Paulista          |
| Leonel Ferreira                                 | Ermelino Matarazzo           |
| Rua Heráclito Patriarca dos Santos              | Ermelino Matarazzo           |
| Rua Sancho Junqueira                            | Ermelino Matarazzo           |
| Reverendo Izac Silvério                         | Ermelino Matarazzo           |
| Rua Paulo Martin Garro                          | Itaim Paulista               |
| Rua Afuá                                        | Itaim Paulista               |
| Rua Desembargador Fausto Whitaker Machado Alvim | Itaim Paulista               |
| Rua Galvão Bueno                                | Sé                           |
| Rua Anjo Custódio                               | Aricanduva/ Vila Formosa     |
| Rua Paulino Arena                               | Jacana / Tremembé            |

Total de obras concluídas: 28

# PRA 1 - Obras Concluídas Fotos



Rua João Delgado - Freguesia do Ó / Brasilândia – 15/08/14



Rua Raulino Galdino da Silva - Freguesia do Ó/Brasilândia – 02/06/14



Sarjetão na R. Augusto Montenegro – Jaçanã / Tremembé - 21/11/14



Vista da Travessa Leandro Ferreira – VI. Maria / VI. Guilherme – 12/02/14

# PRA 1 - Obras Concluída Fotos



Rua Jardimirim (Santana / Tucuruvi) - Antes 11/10/13



Rua Jardimirim (Santana / Tucuruvi) - Depois 16/05/14



Rua Jardinésia (Santana / Tucuruvi) – antes 10/10/13



Rua Jardinésia (Santana / Tucuruvi) – Depois 04/09/14

# PRA 1 - Obras Concluída Fotos



Recuperação do passeio na ilha da Rua São Teodoro - antes



Recuperação do passeio na ilha da Rua São Teodoro - depois



Travessa Neco - Santana/Tucuruvi - antes



Travessa Neco - Santana/Tucuruvi - depois



# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras em execução

| Endereço                                   | Subprefeitura               |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Rua Santa Cruz                             | Ipiranga                    |
| Av. Agua Funda                             | Jabaquara                   |
| Rua Ministro Alvaro de Souza Lima          | Santo Amaro                 |
| Rua Visconde de Cairu                      | Mooca                       |
| Rua Canuto Saraiva                         | Mooca                       |
| Rua Orville Derby                          | Mooca                       |
| Avenida Presidente Altino                  | Lapa                        |
| Acesso a Policia Federal                   | Lapa                        |
| Rua Marcelo de Menezes                     | Vila Maria / Vila Guilherme |
| Rua Marcondes Buarque                      | Jaçanã / Tremembé           |
| Rua Manoel Barbosa Reis                    | São Miguel Paulista         |
| Rua Armando Cardoso Alves/Clube Desportivo | Penha                       |
| Rua Coatimirim                             | Penha                       |
| Córrego Afluentes J                        | Vila Prudente               |

# Programa de Redução de Alagamentos PRA 1

## Obras em execução

| Endereço                      | Subprefeitura                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rua Estanislau Bonk Filho     | Aricanduva / Vila formosa         |
| Avenida Cipriano Rodrigues    | Aricanduva / Vila formosa         |
| Rua Almir Alves de Souza      | Aricanduva / Vila formosa         |
| Rua Pierrotinho               | Aricanduva / Vila formosa         |
| Rua Pataiba                   | Santana / Tucuruvi                |
| Córrego Nadir Dias Figueiredo | Santana / Tucuruvi                |
| Av. Santa Inês                | Santana / Tucuruvi                |
| Córrego Una                   | São Miguel Paulista               |
| Rua Formoselha                | Aricanduva / VI. Formosa / Carrão |
| Travessa Mario Mendes         | Aricanduva / VI. Formosa / Carrão |
| Rua São Quirino               | VI. Maria / VI. Guilherme         |
| Córrego Jaboticabal 1         | Ipiranga                          |
| Rua Cachoeira dos Antunes     | Casa Verde                        |

Total de obras em execução: 27

# PRA 1 - Obras em Execução - Fotos



Rua Marcondes Buarque (Jaçanã / Tremembé):  
Demolição e escavação do PV existente – 18/11/2014



Rua Paulino Arena (Jaçanã / Tremembé):  
Execução da rede de drenagem – 12/11/14



Av. Cipriano Rodrigues: Vista geral antes do início das obras  
05/11/2014



Av. Cipriano Rodrigues (depois): Execução de gabião  
margem direita – 21/11/2014

# PRA 1 - Obras em Execução - Fotos



Rua Coatimirim (Penha): Vista da área antes do início das obras – 25/11/2013



Assentamento de tubo do PV 23 ao PV 22 na Rua Brejo Novo – 21/11/2014



Travessia a ser executada entre a Rua Pierrotinho e a Rua Hamilton Prado – 30/10/2014




Rua Almir Alves de Souza: Laje de fundo do PV 18 na Rua Alfaro – 21/11/2014



# Curtume / Tiburtino

**Objeto:** Revisão de projeto executivo da canalização dos córregos Curtume e Tiburtino em atenção ao pedido da CPTM de mudança do projeto. Após, recursos para obra serão avaliados.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
  - Valor aprovado: R\$ 1.000.000,00
  - Valor pretendido atualizado: R\$ 0,00
  - Justificativa: adiado cronograma
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08

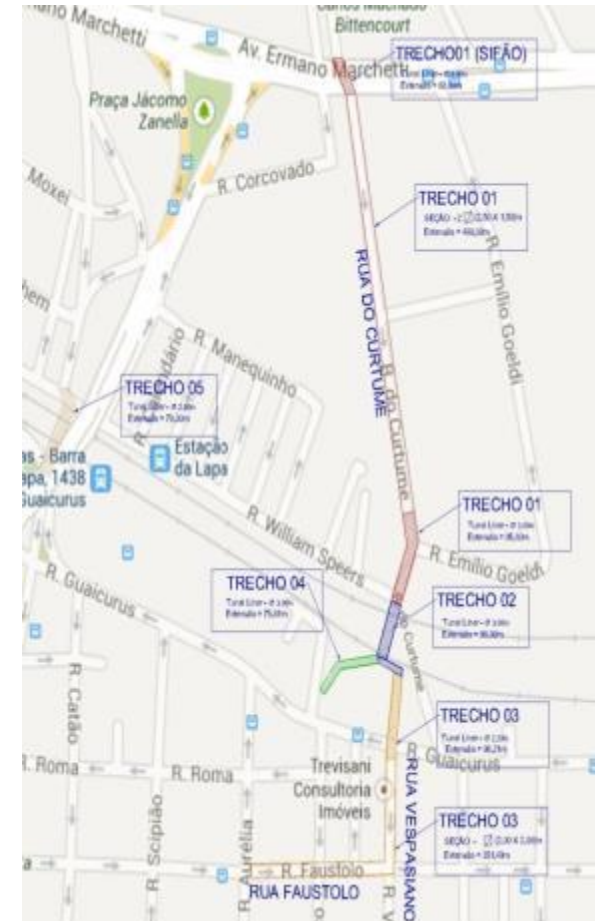

# Córrego Ponte Baixa - Desapropriação

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma. Total previsto 300 unidades

- Valor solicitado FUNDURB 2014: R\$ 18.700.000,00
- Situação: Ações ajuizadas em fase de complementação (trecho abaixo da padaria) / ações novas em fase de ajuizamento (acima da padaria)
- Valores empenhados: R\$ 11.309.997
- Valores liquidados: R\$ 11.309.997
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Aricanduva – Desapropriação (R8)

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor aprovado : R\$ 871.036,81
- Valor atualizado: R\$ 888.285,06
- Justificativa: atualizado valor da complementação, que é reajustado mensalmente, pois atrasou a liberação do recurso
- Situação: Recurso transferido para DESAP, aguarda depósito judicial
- Valores empenhados: R\$ 12.698,27
- Valores liquidados: R\$ 12.698,27
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Córrego do Cordeiro – Desapropriação (R5)

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor aprovado: R\$ 15.000.000,00
- Valor pretendido atualizado: R\$ 7.674.578,87
- Justificativa: valor original calculado pela avaliação. Definido ajuizamento pelo ITBI, que neste caso foi menor.
- Situação: Ações a ajuizar. Recurso transferido para DESAP, aguarda depósito judicial.
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08



# Córrego do Cordeiro – Desapropriação (R1)

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor aprovado: R\$ 7.990.183,00
- Valor atualizado: R\$ 5.853.722,10
- Justificativa das alterações: necessidade de ajuizamento do R5 (DUP a vencer em dezembro), além do R1, já previsto antes
- Situação: R1: Ações ajuizadas aguardando para complementar / R5: a ajuizar
- Valores empenhados: R\$ 5.853.722,10
- Valores liquidados: R\$ 5.853.722,10
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

# Balanço Geral 2014 - Drenagem

| Detalhamento                                           | Total Pretendido      | Empenhado             | Liquidado             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Córrego Ponte Baixa - Taxa CAIXA                       | 3.395,28              | 3.395,28              | 3.395,28              |
| Córrego Ponte Baixa - material expropriatório          | 1.291.237,92          | 1.291.237,92          | 1.144.760,30          |
| Córrego Ponte baixa - trabalho social REAJUSTE         | 125.862,85            | 125.862,85            | 102.935,70            |
| Bacia do Córrego do Cordeiro - material expropriatório | 24.045,84             | 24.045,84             | 24.045,84             |
| Gerenciadora Lote 1                                    | 14.800.000,00         | 14.800.000,00         | 12.191.330,64         |
| Gerenciadora Lote 2                                    | 11.800.000,06         | 11.800.000,06         | 9.522.395,88          |
| Licenciamento Ambiental (FUPAM)                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Projeto de Drenagem da Bacia do Córrego Paciência      | 729.762,60            | 729.762,60            | 729.657,01            |
| Projeto de Drenagem do Córrego Tremembe                | 27.007,56             | 27.007,56             | 0,00                  |
| Rapadura - Projeto Básico e Executivo do Córrego       | 36.782,27             | 36.782,27             | 0,00                  |
| Córrego do Ipiranga - Material Expropriatório          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Morro do S - Projeto Básico                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Córrego Ponte Baixa - obra                             | 42.191.605,46         | 42.191.605,46         | 38.083.967,33         |
| Córrego Ponte Baixa - enterramento de rede elétrica    | 1.034.596,88          | 1.034.596,88          | 0,00                  |
| Bacia do Córrego do Cordeiro - obra                    | 56.698.130,82         | 56.698.130,82         | 55.824.206,95         |
| PRA 1                                                  | 36.366.391,70         | 36.366.391,70         | 35.961.144,26         |
| Curtume / Tiburtino                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Córrego Ponte Baixa - desapropriação                   | 18.700.000,00         | 11.309.997,00         | 11.309.997,00         |
| Aricanduva - desapropriação (R8)                       | 888.285,06            | 12.698,27             | 12.698,27             |
| Bacia do Córrego do Cordeiro - desapropriação (R5)     | 7.674.578,87          | 0,00                  | 0,00                  |
| Bacia do Córrego do Cordeiro - desapropriação (R1)     | 5.853.722,10          | 5.853.722,10          | 5.853.722,10          |
| <b>TOTAL Drenagem</b>                                  | <b>198.245.405,27</b> | <b>182.305.236,61</b> | <b>170.764.256,56</b> |

Data base da ultima posição orçamentária: 31/12/14



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**MOBILIDADE**

# Material Expropriatório e Projetos - Corredores

**Objeto:** O recurso é necessário para elaboração do material expropriatório e projetos, que são utilizados para subsidiar a desapropriação dos imóveis necessários à implantação do melhoramento.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 2.421.006,24
- Justificativa das alterações: na segunda reunião estava aprovado somente material expropriatório parcial (limitado ao teto SIURB). Necessário cobrir toda necessidade e também revisão de projetos que está sendo feita para reduzir as desapropriações.
- Situação: Material expropriatório em elaboração / projeto em fase de sub-rogação (da SPTRANS para SP-OBRS)
- Valores empenhados: R\$ 2.421.006,24
- Valores liquidados: R\$ 473.193,84
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.39.00.08



# Obra - Corredor Berrini

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda com pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, nos dois sentidos.

- Valor do contrato: R\$ 45.288.227,09.
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor pretendido atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: contrato atendido em outra fonte
- Situação: Obra em andamento
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Obra - Corredor Binário Santo Amaro

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para as obras de ampliação e melhorias viárias para com tratamento prioritário na sequência de vias que estabelece a conexão com os corredores José Diniz/Ibirapuera/Santa Cruz e Santo Amaro/ Nove de Julho, de um lado, e, de outro, Parelheiros/Rio Bonito/ Santo Amaro, Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Itapeacerica/João Dias/Santo Amaro .

- Valor do contrato: R\$ 39.998.460,66
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 2.800.000,00
- Justificativa das alterações: revisão de cronograma
- Situação: Em andamento
- Valores empenhados: R\$ 2.800.000,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



17/11/14 - Av. Adolfo Pinheiro, 63



17/11/14 - R. Antônio Elias Zogbi, 42

# Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido em toda sua extensão.

- Valor do contrato: R\$ 213.598.686,17
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: início postergado pelo atraso no licenciamento ambiental
- Situação: Não iniciado
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Inajar de Souza - Obra

- **Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor.
  - **Valor do contrato:** R\$ 169.751.131,88
  - Valor atualizado: R\$ 0,00
  - Justificativa das alterações: contrato atendido em outra fonte (federal)
  - **Situação:** Obra em andamento
  - Valores empenhados: R\$ 0,00
  - Valores liquidados: R\$ 0,00
  - Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08





# Corredor Leste Radial 1 - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido nas paradas e faixas de ultrapassagem.

- Valor do contrato: R\$ 439.751.838,21
- Valor pretendido: R\$ 12.000.000,00
- Justificativa das alterações: revisão de cronograma e fontes
- Situação: Obra iniciada
- Valores empenhados: R\$ 11.466.107,46
- Valores liquidados: R\$ 10.665.268,62
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Leste Radial 2 - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda e pavimento rígido nas paradas e faixas de ultrapassagem.

- Valor do contrato: R\$ 148.757.190,16
- Valor pretendido: R\$ 1.500.000,00
- Justificativa das alterações: revisão de cronograma e fontes
- Situação: Obra não iniciada
- Valores empenhados: R\$ 44.563,15
- Valores liquidados: R\$ 44.563,15
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Leste Itaquera – trecho 1 - Obra

**Objeto:** Execução das obras do Programa de Mobilidade Urbana do empreendimento 4.

- Valor do contrato: R\$ 150.406.618,68
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor pretendido: R\$ 3.000.000,00
- Situação: *Obras não iniciadas*
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

# Corredor Leste Aricanduva - Obra

**Objeto:** Execução das obras do Programa de Mobilidade Urbana do empreendimento 3.

- Valor do contrato: R\$ 114.438,223,05
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 1.950.000,00
- Situação: aguarda recurso para assinatura do contrato
- Valores empenhados: R\$ 950.000,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor M'Boi Mirim - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor. Ampliação da extensão das plataformas. Substituição de abrigos. Readequação de plataformas.

- Valor do contrato: R\$ 98.494.741,69
- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: contrato atendido em outra fonte (federal)
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Inajar de Souza - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 5.118.999,00
- Justificativa das alterações: recálculo das complementações
- Situação: 11 ações ajuizadas.
- Valores empenhados: R\$ 4.873.375,24
- Valores liquidados: R\$ 4.873.375,24
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Binário Santo Amaro

## Desapropriação

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 5.018.617,77
- Justificativa das alterações: necessidade de ajuizamento pelo vencimento da DUP
  
- Situação: 41 ações ajuizadas
- Valores empenhados: R\$ 4.982.167,38
- Valores liquidados: R\$ 4.982.167,38
  
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: revisão do cronograma
- Situação: Aguarda publicação do DUP
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08



# Corredor Leste Radial 1 - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014:
- Valor atualizado: R\$ 0,00
- Situação: Material expropriatório em elaboração.
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Corredor Leste Radial 2 - Desapropriações

**Objeto:** O recurso é necessário para a complementação das indenizações referentes à desapropriação dos imóveis necessários à implantação do empreendimento, visando liberação da área para prosseguimento da obra de acordo com o cronograma físico da mesma.

Pagamentos das complementações serem efetuados para prosseguir com o pedido de imissão na posse das áreas.

- Valor solicitado FUNDURB 2014
- Valor pretendido atualizado: R\$ 0,00
- Justificativa das alterações: cobertura parcial na 2ª reunião pelo limite do teto SIURB
- Situação: material expropriatório em elaboração
- Valores empenhados: R\$ 0,00
- Valores liquidados: R\$ 0,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.61.00.08

# Balanço Geral 2014 - Mobilidade

| Detalhamento                                                     | Total Pretendido     | Empenhado            | Liquidado            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Material expropriatório e projetos - Corredores                  | 2.421.006,24         | 2.421.006,24         | 473.193,84           |
| Corredor Berrini – Obra                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Binário Santo Amaro – Obra                              | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         | 0,00                 |
| Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia – Obra         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Inajar de Souza – Obra                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Leste Radial 1 – Obra                                   | 12.000.000,00        | 11.466.107,46        | 10.665.268,62        |
| Corredor Leste Radial 2 – Obra                                   | 1.500.000,00         | 44.563,15            | 44.563,15            |
| Corredor Leste Itaquera - trecho 1 - Obra                        | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Leste Aricanduva - Obra                                 | 1.950.000,00         | 950.000,00           | 0,00                 |
| Corredor M'Boi Mirim – Obra                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Inajar de Souza - Desapropriações                       | 5.118.999,43         | 4.873.375,24         | 4.873.375,24         |
| Corredor Binário Santo Amaro – Desapropriações                   | 5.018.617,77         | 4.982.167,38         | 4.982.167,38         |
| Corredor Capão Redondo Campo Limpo / Vila Sônia - Desapropriação | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Leste Radial 1 – Desapropriações                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Corredor Leste Radial 2 – Desapropriações                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL Mobilidade</b>                                          | <b>33.808.623,44</b> | <b>27.537.219,47</b> | <b>21.038.568,23</b> |

Data base da ultima posição orçamentária: 31/12/14



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM + MOBILIDADE**

# Balanço Geral 2014 – Drenagem + Mobilidade

| DETALHAMENTO       | TOTAL PRETENDIDO | EMPENHADO      | LIQUIDADO      |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| DRENAGEM           | 198.245.405,27   | 182.305.236,61 | 170.764.256,56 |
| MOBILIDADE         | 33.808.623,44    | 27.537.219,47  | 21.038.568,23  |
| <b>TOTAL GERAL</b> | 232.054.028,71   | 209.842.456,08 | 191.802.824,79 |





# **PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDURB EXERCÍCIO 2014**

Março 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
PREFEITURA DE SÃO PAULO



**Projeto:** EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (Subprefeitura Sé)  
*Contrato de gerenciamento com SP Obras*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$ 688.013,51

**Recursos utilizados:** R\$ 381.634,66 (55,5%)

**Processo nº:** 2013-0.347.504-5

---

### **Escopo do projeto:**

Primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, será utilizado como nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, reduzindo sensivelmente o dispêndio com o aluguel da Galeria Olido, que totaliza **R\$ 3,5 milhões / ano**.

Serão realizadas intervenções de acessibilidade e mobilidade interna para torná-lo apropriado ao uso proposto.

Além disso, o projeto permitirá a reinserção de um exemplar arquitetônico de importante valor histórico ao ambiente urbano, integrado às ações de revitalização do Vale do Anhangabaú

**Projeto:** EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (Subprefeitura Sé)  
*Execução da obra*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$ 6.490.000,00

**Valor empenhado:** R\$ 6.490.000,00

**Recursos utilizados:** R\$ 6.201.125,21 (95,5%)

---

**Processo nº:** 2010-0.346.224-0

**Escopo do projeto:**

Primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, será utilizado como nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, reduzindo sensivelmente o dispêndio com aluguel da Galeria Olido, que totaliza **R\$ 3,5 milhões / ano**.

Serão realizadas intervenções de acessibilidade e mobilidade interna para torná-lo apropriado ao uso proposto.

Além disso, o projeto permitirá a reinserção de um exemplar arquitetônico de importante valor histórico ao ambiente urbano, integrado às ações de revitalização do Vale do Anhangabaú

# EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (EM ANDAMENTO)

## FACHADA E PERSPECTIVA PROJETADA PARA O ESPAÇO INTERNO






## COBERTURA DO AUDITÓRIO – PÁTIO INTERNO

*Antes*



*Atual*

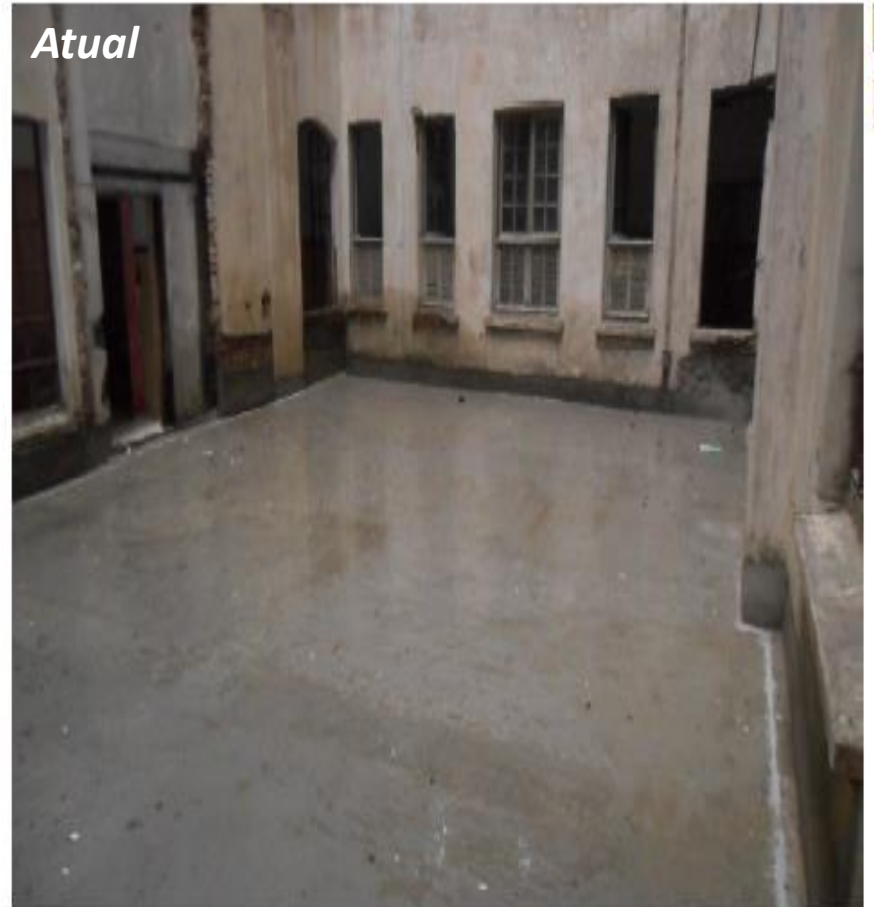

## COBERTURA DO AUDITÓRIO – PÁTIO INTERNO

*Antes*



*Atual*



## ÁREA PARA A ESCADA DE EMERGÊNCIA

*Antes*



*Antes*



## ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA

*Atual*





## FINALIZADO O RESTAURO DAS ALVENARIAS, DO PISO E ASSOALHO EM MADEIRA

*Antes*



*Atual*



## FINALIZADO O RESTAURO DAS ALVENARIAS, DO PISO E ASSOALHO EM MADEIRA





## FINALIZADO O RESTAURO DAS ALVENARIAS, DO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO



**INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E  
AR CONDICIONADO EM EXECUÇÃO  
70% FINALIZADA  
INFRAESTRUTURA DE HIDRÁULICA  
60% FINALIZADA**



**FINALIZADO O PROCESSO DE  
LAVAGEM DAS FACHADAS INTERNAS**



**Projeto:** TORRE DA MEMÓRIA PAULISTANA (Subprefeitura Sé)  
*Obras de requalificação e modernização*

**Estágio:** CONCLUÍDA

**Recursos previstos:** R\$ 592.071,45

**Valor empenhado:** R\$ 534.994,51

---

**Recursos utilizados:** R\$ 299.217,96 (56%)

**Processo nº:** 2011-0.148.619-4

**Obra concluída:**

Houve saldo de empenho de R\$ 235.776,55.

## FACHADA RUA AFONSO PENA



**Projeto:** TEATRO ARTUR AZEVEDO (Subprefeitura Mooca)  
*Obras de requalificação e modernização*

**Estágio:** OBRA CONCLUÍDA

**Recursos previstos:** R\$ 2.545.404,04

**Valor empenhado:** R\$ 2.927.501,89

**Recursos utilizados:** R\$ 2.891.413,77(98,8%)

---

**Processo nº:** 2006-0040.123-1

Reabertura do teatro prevista para junho de 2015.



## TEATRO ARTUR AZEVEDO - CONCLUÍDO


*Antes*



*Antes*



# TEATRO ARTUR AZEVEDO - CONCLUÍDO

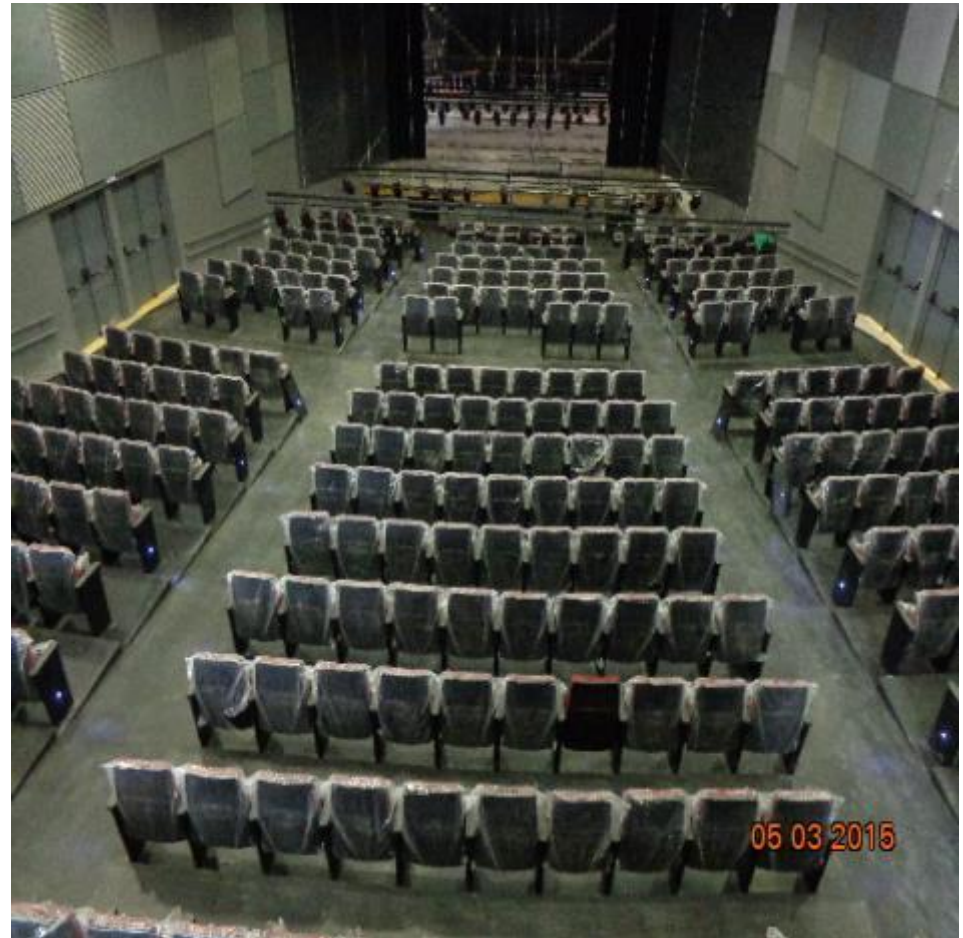



**Projeto:** TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO (Subprefeitura Penha)  
*Obras de requalificação e modernização*

**Estágio:** OBRA CONCLUÍDA

**Recursos inicialmente previstos:** R\$ 644.414,14

**Recursos empenhados (com aditamento):** R\$ 1.118.697,41

**Recursos utilizados:** R\$ 1.108.759,28 (99%)

**Processo nº:** 2006-0.040.182-7

---

**Etapas de finalização:**

Reabertura do teatro realizada em 31 de janeiro de 2015.

## TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO – antes e depois da reforma



## TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO – Finalizado





**Projeto:** TEATRO PAULO EIRÓ (Subprefeitura Santo Amaro)  
*Obras de requalificação e modernização*

**Estágio:** OBRA CONCLUÍDA

**Recursos previstos:** R\$ 5.419.415,26

**Valor empenhado:** R\$ 5.255.077,01

**Recursos utilizados:** R\$ 5.101.261,78 (97%)

**Processo nº:** 2007-0.110.718-5

---

**Em fase de ajustes:**

- Acústica, Cenotecnia e Elevador do Palco.
- Finalização do paisagismo da praça.

# TEATRO PAULO EIRÓ

Antes



**Projeto:** BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE (Subprefeitura Sé)  
*Ar condicionado – Setor Circulante*

**Estágio:** FINALIZADO

**Recursos previstos:** R\$ 56.600,00

**Recursos utilizados:** R\$ 56.600,00 (100%)

**Processo nº:** 2012-0.142.758-0

---

**Escopo do projeto:**

- Projeto para a instalação de ar condicionado no Setor Circulante da biblioteca

# BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

## Projeto de Ar Condicionado para o Setor Circulante



**Projeto:** CENTRO CULTURAL M'BOI MIRIM (Subprefeitura M'Boi Mirim)  
*Desapropriações*

**Estágio:** VALOR AJUIZADO – solicitado por Ofício o remanejamento de recursos no valor de R\$507.380,00 para a totalizar R\$1.057.000,00 da desapropriação, valor atualizado por DESAP-7 em agosto/2014

**Recursos previstos:** R\$ 550.000,00 + R\$ 507.380,00 = R\$ 1.057.380,00

**Processo nº:** 2014-0.281.301-1 - Desapropriação


**Processo nº:** 2014-0.308.146-4 – Pedido de remanejamento

---

**LIBERAÇÃO DE RECURSOS RECUSADA**



## Planta das desapropriações

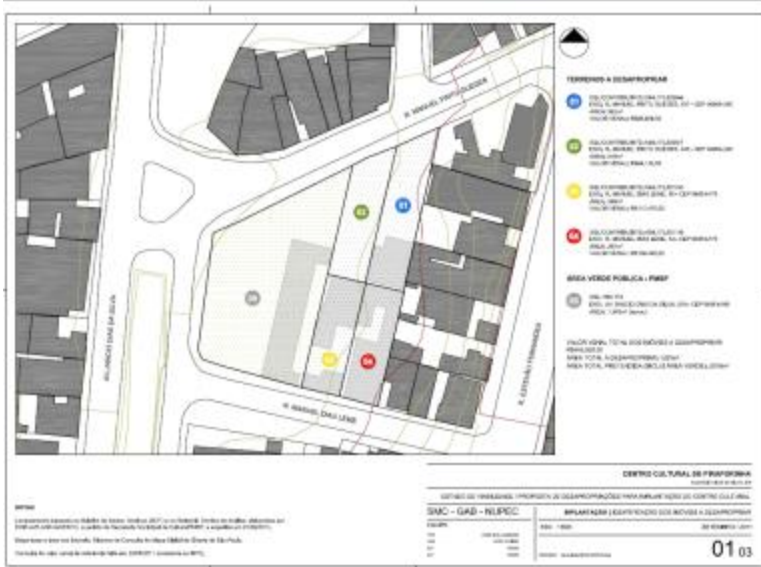

Casa de Cultura atual

- Sacolão existente



**Projeto:** CENTRO CULTURAL DA PENHA (Subprefeitura Penha)  
*Estúdios de gravação*

**Estágio:** CONCLUÍDO

**Recursos previstos:** R\$ 75.000,00

**Recursos utilizados:** R\$ 55.000,00

**Processo nº:** 2012-0.168.990-9

---

### **Escopo do projeto:**

- Instalação de ar condicionado nos estúdios de gravação
- Preparação dos estúdios para início das suas atividades

# CENTRO CULTURAL DA PENHA

## Sistema de ar condicionado



**Projeto:** BIBLIOTECA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (Subprefeitura Itaquera)  
*Construção da nova sede*

**Estágio:** Aguardando definição junto a EDIF, referente à demolição da estrutura.

**Recursos previstos:** R\$ 250.000,00

**Valor empenhado:** R\$ 68.860,32

**Recursos utilizados:** R\$ 68.860,32 (100%)

---

**Processo nº:** 2008-0.110.005-0

### **Escopo do projeto:**

- Construção em dois pavimentos
- Área construída: 700 m<sup>2</sup>
- Articulação do edifício com duas construções históricas existentes no terreno (já restauradas, requalificadas e em funcionamento)



## BIBLIOTECA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA





**Projeto:** CASARÃO DA CELSO GARCIA (Subprefeitura Mooca)  
*Obras de requalificação preliminar*

**Estágio:** CONCLUÍDO

**Recursos previstos:** R\$ 131.992,62

**Recursos utilizados:** R\$ 128.911,98 (97,7%)

**Processo nº:** 2013-0.339.266-2

---

### **Escopo do projeto:**

- Requalificação preliminar
- Propiciar as condições adequadas para as etapas de prospecção para o restauro
- Proteção do imóvel durante a fase de projeto

# CASARÃO AVENIDA CELSO GARCIA

## Situação anterior



NOVEMBRO 2014



**Projeto:** CASA MODERNISTA (Subprefeitura Vila Mariana)  
*Muro de arrimo*

**Estágio:** FASE DE CONTRATAÇÃO DA OBRA - Inalterado

**Recursos previstos:** R\$ 497.695,79

**Processo nº:** 2014-0.043.706-3

---

**Escopo do projeto:**

- Requalificação parcial do muro de arrimo da área do Parque Modernista

**Projeto:** CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (Subprefeitura Sé)  
*Adequação às normas de segurança*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$ 54.027,91

**Recursos utilizados:** R\$ 21.611,16 (40%)

**Processo nº:** 2013-0.220.568-0

---

### **Escopo do projeto:**

- Programa de adequação às normas de segurança contra incêndio e proteção da infraestrutura Implantação de novo paisagismo



**Projeto:** CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (Subprefeitura Sé)  
Recuperação das fachadas

**Estágio:** EM FASE DE PREPARAÇÃO PARA LICITAÇÃO POR SIURB - Inalterado

**Recursos previstos:** R\$ 1.670.143,21

---

**Escopo do projeto:**

- Recuperação estrutural de parte das fachadas da Avenida 23 de Maio e da Rua Vergueiro

**Projeto:** CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)  
*Adequação da estrutura da cobertura*

**Estágio:** INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

**Recursos previstos:** R\$ 75.000,00

**Valor Empenhado:** R\$ 679.65,53

**Recursos utilizados:** R\$ 67.965,53 (100%)

---

**Processo nº:** 2014-0.083.334-1

**Escopo do projeto:**

- Adequação da estrutura da cobertura do edifício
- Preparação da cobertura para sua requalificação completa

**Projeto:** CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)  
*Obras de requalificação*

**Estágio:** FASE DE CONTRATAÇÃO DA OBRA

**Recursos previstos:** R\$ 1.826.872,36

**Valor Empenhado:** R\$ 82.696,9

**Valor Executado:** R\$ 40.355,97

**Processo nº:** 2014-0.199.035-1

---

### **Escopo do projeto:**

- Requalificação geral das instalações elétricas
- Implantação de sistema contra incêndio
- Requalificação do acesso ao equipamento
- Requalificação completa da cobertura do edifício

**Projeto:** BIBLIOTECA CORA CORALINA (meta 27 do Programa de Metas)  
*Obras de requalificação*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$ 533.718,00

**Valor Empenhado:** R\$ 169.069,32

**Valor Executado:** R\$ 169.069,32

---

**Processo nº:** 2013-0.156.980-8

**Escopo do projeto:**

- Requalificação geral das instalações elétricas
- Implantação de sistema contra incêndio
- Requalificação do acesso ao equipamento
- Requalificação completa da cobertura do edifício

## BIBLIOTECA CORA CORALINA





**Projeto:** BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR  
*Obras de requalificação*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$ 780.000,00

**Valor Empenhado:** R\$ 191.640,98

**Valor Executado:** R\$ 126.433,75

**Processo nº:** 2013-0.037.767-0

---

**Escopo do projeto:**

- Requalificação arquitetônica
- Conservação geral da estrutura
- Projeto paisagístico

## BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR



**Projeto:** Biblioteca Milton Santos  
*Obras de requalificação*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$392.356,62

**Valor Empenhado:** R\$ 234.224,09

**Valor Executado:** R\$ 129.224,09 (56%)

**Processo nº:** 2014-0.129.695-1

---

**Escopo do projeto:**

- Recuperação da cobertura
- Recuperação do forro
- Recuperação do sistema de para-raios



## Biblioteca Milton Santos



**Projeto:** ATESTADOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO CULTURAL E DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.

**Estágio:** INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

**Recursos previstos:** R\$23.296,82

**Recursos utilizados:** R\$ 20.977,50 (90%)

**Processo nº:** 2013-0.347.986-5

---

### **Escopo do projeto:**

- Análise das condições de instalação e funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e aos materiais de acabamento e revestimento das edificações para atendimento dos requisitos necessários à aprovação de vistoria do Corpo de Bombeiros.



**Projeto :** BIBLIOTECA RUBENS BORBA  
*Obras de requalificação*

**Estágio:** LICITAÇÃO EM ANDAMENTO - Inalterado

**Recursos previstos:** R\$ 114.729,92

**Processo nº:** 2013-0.144.445-2

---

**Escopo do projeto:**

- Requalificação arquitetônica com conservação da estrutura predial e tratamento paisagístico. Valor correspondente a 2 meses de obra.
- Conclusão prevista para abril de 2015.

## BIBLIOTECA RUBENS BORBA



**Projeto :** BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES  
*Obras de requalificação*

**Estágio:** EM ANDAMENTO

**Recursos previstos:** R\$ 83.366,72

**Valor Empenhado:** R\$ 83.366,72

**Valor Executado:** R\$ 5.000,00 (6%)

**Processo nº:** 2014-0.228.523-6

---

**Escopo do projeto:**

- Adaptação da edificação para receber o acervo da Biblioteca Vicente de Carvalho

## BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES



**Projeto:** CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)

**Estágio:** Concluído

**Recursos previstos:** R\$ 7.000,00

**Recursos Executados:** R\$ 7.000,00

**Processo nº:** 2014-0.189.836-6

---

**Escopo do projeto:**

- LAUDO ESTRUTURAL PARA BALIZAR INTERVENÇÃO NO CCJ



**Projeto:** CASA DE CULTURA DE ERMELINO MATARAZZO (Meta 27 do Programa de Metas)

**Estágio:** EM FASE DE LICITAÇÃO POR SIURB - Inalterado

**Recursos previstos:** R\$ 23.043,89

**Processo nº:** 2014-0.218.475-8

---

**Escopo do projeto:**

- Serviços técnicos preliminares, projetos executivos e obra de construção da Casa de Cultura.

| DOTAÇÃO                             | VALOR DA PROPOSTA (R\$) | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR EXECUTADO (R\$) |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 98.25.13.392.3001.3.400.44903900.08 | 14.693.092,13           | 10.171.458,11         | 9.680.691,53          |
| 98.25.13.392.3001.3.400.44905100.08 | 1.395.627,91            | 241.488,23            | 209.071,48            |
| 98.25.13.391.3001.5.965.44903900.08 | 1.882.613,91            | 731.762,20            | 510.546,64            |
| 98.25.13.391.3001.5.965.44905100.08 | 592.071,45              | 7.024.994,51          | 6.500.343,17          |
| <i>TOTAL 98.25 – FUNDURB 2014</i>   | <i>18.563.405,40</i>    | <i>18.169.703,05</i>  | <i>16.900.652,82</i>  |

# SMSP - FUNDURB

## PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS - SMSP 2014

- Recurso Disponível - R\$ 58.540.977,96
- Intervenção em 29 Subprefeituras
- 186 Obras Aprovadas pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano
- 88 Obras executadas em 2014
- Recurso Utilizado – R\$ 31.986.061,71

# SMSP - FUNDURB

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL FUNDURB - SMSP

31/12/2014

| NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE                  | SECRETARIA | DISPONIVEL           | ORÇADO               | TRANSFERIDO          | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | SALDO DE LICITAÇÃO  |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3352-REQUALIFICAÇÃO DE BAIROS E CENTRALIDADES | SMSP       | 47.164.477,96        | 47.111.779,30        | 25.268.768,22        | 24.669.647,63        | 21.463.153,10        | 3.206.494,53        |
|                                               | SMT        | 11.376.500,00        | 11.376.500,00        | 11.376.500,00        | 11.109.376,31        | 10.522.908,61        | 586.467,70          |
| TOTAL                                         | -----      | R\$<br>58.540.977,96 | R\$<br>58.488.279,30 | R\$<br>36.645.268,22 | R\$<br>35.779.023,94 | R\$<br>31.986.061,71 | R\$<br>3.792.962,23 |
|                                               |            |                      | 100,00%              | 62,65%               | 61,17%               | 54,69%               | 6,48%               |

# SMSP - FUNDURB

| FUNDURB - RECURSOS - SUBPREFEITURAS 2014 |                               |                                               |                   |                                            |                   |                   |                   | ATUALIZADO 31/12/2014 |                                         |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| SUBPREFEITURA                            | VALOR DISPONÍVEL FUNDURB 2014 | INVESTIMENTO APROVADO APÓS ANÁLISE DO FUNDURB |                   | INVESTIMENTO UTILIZADOS NAS SUBPREFEITURAS |                   |                   |                   |                       | OBRA NÃO EXECUTADA POR FALTA DE RECURSO |                          |
|                                          |                               | PROCESSOS                                     | VALOR TOTAL       | PROCESSOS                                  | VALOR DISPONIVEL  | VALOR EMPENHADO   | VALOR LIQUIDADO   | SALDO DE LICITAÇÃO    | TOTAL DE PROC.                          | VALOR                    |
| Aricanduva                               | R\$ 1.060.357,73              | 8                                             | R\$ 1.065.524,25  | 8                                          | R\$ 1.065.524,25  | R\$ 944.812,45    | R\$ 943.903,50    | R\$ 908,95            |                                         |                          |
| Butantã                                  | R\$ 1.655.960,06              | 1                                             | R\$ 1.650.000,00  | 1                                          | R\$ 1.650.000,00  | R\$ 1.484.099,57  | R\$ 1.484.082,66  | R\$ 16,91             |                                         |                          |
| Campo Limpo                              | R\$ 2.777.844,04              | 15                                            | R\$ 1.987.440,98  |                                            |                   |                   |                   |                       | 15                                      | R\$ 1.987.440,98         |
| Capela do Socorro                        | R\$ 3.136.891,35              | 11                                            | R\$ 2.574.525,89  | 5                                          | R\$ 1.330.914,81  | R\$ 1.323.489,67  | R\$ 1.321.642,75  | R\$ 1.846,92          | 6                                       | R\$ 1.243.611,08         |
| Casa Verde                               | R\$ 1.343.714,64              | 3                                             | R\$ 411.466,73    |                                            |                   |                   |                   |                       | 3                                       | R\$ 411.466,73           |
| Cidade Ademar                            | R\$ 2.038.639,80              | 19                                            | R\$ 1.783.410,30  | 8                                          | R\$ 809.717,23    | R\$ 803.467,07    | R\$ 801.087,32    | R\$ 2.379,75          | 11                                      | R\$ 973.693,07           |
| Cidade Tiradentes                        | R\$ 1.117.086,43              | 7                                             | R\$ 1.123.435,71  | 6                                          | R\$ 973.586,01    | R\$ 964.044,90    | R\$ 961.718,45    | R\$ 2.326,45          | 1                                       | R\$ 149.849,70           |
| Ermelino Matarazzo                       | R\$ 1.035.007,32              | 1                                             | R\$ 806.242,73    |                                            |                   |                   |                   |                       | 1                                       | R\$ 806.242,73           |
| Freguesia do Ó                           | R\$ 1.940.604,56              | 2                                             | R\$ 1.788.532,32  | 1                                          | R\$ 528.892,01    | R\$ 504.193,11    | R\$ 504.183,49    | R\$ 9,62              | 1                                       | R\$ 1.259.640,31         |
| Guaianases                               | R\$ 1.409.605,62              | 9                                             | R\$ 1.128.999,07  | 8                                          | R\$ 1.092.479,86  | R\$ 1.083.360,15  | R\$ 889.419,43    | R\$ 193.940,72        | 1                                       | R\$ 36.519,21            |
| Ipiranga                                 | R\$ 1.798.047,30              | 9                                             | R\$ 524.406,14    |                                            |                   |                   |                   |                       | 9                                       | R\$ 524.406,14           |
| Itaim Paulista                           | R\$ 1.865.938,93              | 5                                             | R\$ 1.865.937,27  |                                            |                   |                   |                   |                       | 5                                       | R\$ 1.865.937,27         |
| Itaquera                                 | R\$ 2.367.128,46              | 1                                             | R\$ 2.227.746,47  |                                            |                   |                   |                   |                       | 1                                       | R\$ 2.227.746,47         |
| Jabaquara                                | R\$ 965.483,19                | 5                                             | R\$ 965.331,19    | 4                                          | R\$ 845.331,19    | R\$ 823.958,93    | R\$ 823.791,40    | R\$ 167,53            | 1                                       | R\$ 120.000,00           |
| Jaçanã                                   | R\$ 1.566.636,70              | 0                                             | PENDÊNCIA         |                                            |                   |                   |                   |                       | 0                                       | SEM ANUÊNCIA DO CONSELHO |
| Lapa                                     | R\$ 890.460,57                | 2                                             | R\$ 507.549,54    |                                            |                   |                   |                   |                       | 2                                       | R\$ 507.549,54           |
| M'Boi Mirim                              | R\$ 2.856.092,93              | 13                                            | R\$ 2.785.543,62  | 13                                         | R\$ 2.785.543,62  | R\$ 2.754.040,58  | R\$ 2.749.550,65  | R\$ 4.489,93          |                                         |                          |
| Mooca                                    | R\$ 1.170.095,80              | 0                                             | PENDÊNCIA         |                                            |                   |                   |                   |                       | 0                                       | SEM ANUÊNCIA DO CONSELHO |
| Parelheiros                              | R\$ 1.872.508,60              | 3                                             | R\$ 1.630.098,60  |                                            |                   |                   |                   |                       | 3                                       | R\$ 1.630.098,60         |
| Penha                                    | R\$ 1.915.861,80              | 20                                            | R\$ 1.915.833,40  | 19                                         | R\$ 1.584.205,21  | R\$ 1.416.752,79  | R\$ 1.415.164,20  | R\$ 1.588,59          | 1                                       | R\$ 331.628,19           |
| Perus                                    | R\$ 1.015.435,58              | 9                                             | R\$ 875.220,56    |                                            |                   |                   |                   |                       | 9                                       | R\$ 875.220,56           |
| Pinheiros                                | R\$ 504.763,34                | 0                                             | PENDÊNCIA         |                                            |                   |                   |                   |                       | 0                                       | SEM ANUÊNCIA DO CONSELHO |
| Pirituba                                 | R\$ 2.023.930,26              | 6                                             | R\$ 1.220.280,35  | 1                                          | R\$ 169.925,77    | R\$ 165.949,31    | R\$ 165.949,31    | R\$ 0,00              | 5                                       | R\$ 1.050.354,58         |
| Santana                                  | R\$ 1.158.200,51              | 2                                             | R\$ 332.210,66    |                                            |                   |                   |                   |                       | 2                                       | R\$ 332.210,66           |
| Santo Amaro                              | R\$ 861.635,53                | 1                                             | R\$ 861.634,32    | 1                                          | R\$ 861.634,32    | R\$ 853.385,13    | R\$ 853.383,77    | R\$ 1,36              |                                         |                          |
| São Mateus                               | R\$ 2.157.782,30              | 2                                             | R\$ 1.358.272,10  |                                            |                   |                   |                   |                       | 2                                       | R\$ 1.358.272,10         |
| São Miguel                               | R\$ 10.327.099,66             | 12                                            | R\$ 10.326.884,10 | 2                                          | R\$ 9.454.839,08  | R\$ 9.454.839,08  | R\$ 6.579.774,20  | R\$ 2.875.064,88      | 10                                      | R\$ 1.785.906,14         |
| Sapopemba                                | R\$ 1.424.948,28              | 3                                             | R\$ 1.420.199,28  | 2                                          | R\$ 247.276,59    | R\$ 243.527,81    | R\$ 120.184,80    | R\$ 123.343,01        | 1                                       | R\$ 1.172.922,69         |
| Sé                                       | R\$ 1.203.873,58              | 3                                             | R\$ 1.191.226,44  |                                            |                   |                   |                   |                       | 3                                       | R\$ 1.191.226,44         |
| Vila Maria                               | R\$ 1.306.687,35              | 3                                             | R\$ 1.305.736,05  | 3                                          | R\$ 1.305.736,05  | R\$ 1.292.408,14  | R\$ 1.292.266,24  | R\$ 141,90            |                                         |                          |
| Vila Mariana                             | R\$ 711.740,88                | 2                                             | R\$ 655.073,69    |                                            |                   |                   |                   |                       | 2                                       | R\$ 655.073,69           |
| Vila Prudente                            | R\$ 1.060.914,86              | 8                                             | R\$ 823.017,54    | 5                                          | R\$ 563.162,22    | R\$ 557.318,94    | R\$ 557.050,93    | R\$ 268,01            | 3                                       | R\$ 259.855,32           |
| SMT                                      |                               | 1                                             | R\$ 11.376.500,00 | 1                                          | R\$ 11.376.500,00 | R\$ 11.109.376,31 | R\$ 10.522.908,61 | R\$ 586.467,70        |                                         |                          |
| Total Geral                              | R\$ 58.540.977,96             | 186                                           | R\$ 58.488.279,30 | 88                                         | R\$ 36.645.268,22 | R\$ 35.779.023,94 | R\$ 31.986.061,71 | R\$ 3.792.962,23      | 98                                      | R\$ 22.756.872,20        |



# SMSP - FUNDURB

| ANDAMENTO DAS OBRAS 31/12/2014 |       |           |                                    |
|--------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
| SUBPREFEITURA                  | TOTAL | EXECUTADO | NÃO EXECUTADO POR FALTA DE RECURSO |
| Aricanduva                     | 8     | 8         |                                    |
| Butantã                        | 1     | 1         |                                    |
| Campo Limpo                    | 15    |           | 15                                 |
| Capela do Socorro              | 11    | 5         | 6                                  |
| Casa Verde                     | 3     |           | 3                                  |
| Cidade Ademar                  | 19    | 8         | 11                                 |
| Cidade Tiradentes              | 7     | 6         | 1                                  |
| Ermelino Matarazzo             | 1     |           | 1                                  |
| Freguesia do Ó                 | 2     | 1         | 1                                  |
| Guaianases                     | 9     | 8         | 1                                  |
| Ipiranga                       | 9     |           | 9                                  |
| Itaim Paulista                 | 5     |           | 5                                  |
| Itaquera                       | 1     |           | 1                                  |
| Jabaquara                      | 5     | 4         | 1                                  |
| Jaçanã                         |       |           |                                    |
| Lapa                           | 2     |           | 2                                  |
| M'Boi Mirim                    | 13    | 13        |                                    |
| Mooca                          |       |           |                                    |
| Parelheiros                    | 3     |           | 3                                  |
| Penha                          | 20    | 19        | 1                                  |
| Perus                          | 9     |           | 9                                  |
| Pinheiros                      |       |           |                                    |
| Pirituba                       | 6     | 1         | 5                                  |
| Santana                        | 2     |           | 2                                  |
| Santo Amaro                    | 1     | 1         |                                    |
| São Mateus                     | 2     |           | 2                                  |
| São Miguel                     | 12    | 2         | 10                                 |
| Sapopemba                      | 3     | 2         | 1                                  |
| Sé                             | 3     |           | 3                                  |
| Vila Maria                     | 3     | 3         |                                    |
| Vila Mariana                   | 2     |           | 2                                  |
| Vila Prudente                  | 8     | 5         | 3                                  |
| SMT                            | 1     | 1         |                                    |
| TOTAL:                         | 186   | 88        | 98                                 |

# SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

**Projeto/Obra:** Readequação de Área Pública

**Local:** Rua Nascer do Sol x Estr. do Iguatemi

**Valor:** R\$ 154.531,55

**Prazo para entrega:** 90 dias

**Executado:** 100%

Imagens do local



Antes



Depois

# SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE

**Projeto/Obra:** Readequação de Viela.

**Local:** Rua Nelson Baldinato - São Lucas

**Valor:** R\$ 69.306,56


**Prazo para entrega:** 60 dias

**Executado:** 100%

Imagens do local



Antes

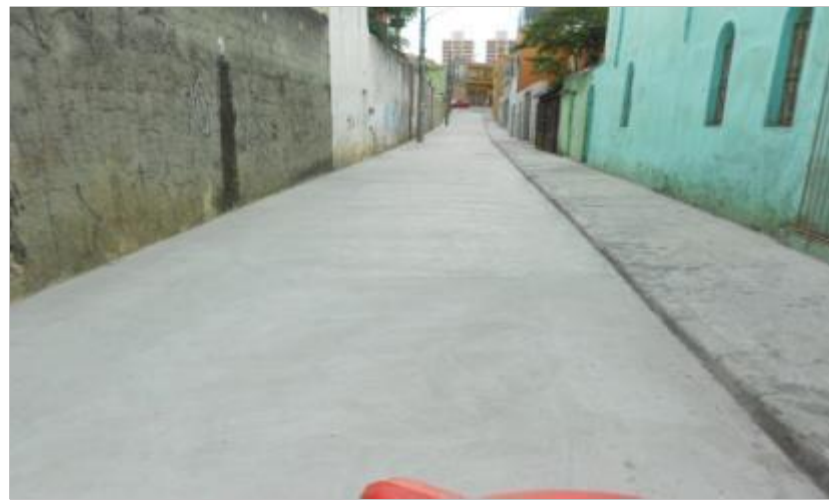

Depois

# SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

**Projeto/Obra:** Readequação de Escadaria.

**Local:** Rua Tulipa da África x Rua Rosa da China.

**Valor:** R\$ 44.610,92

**Prazo para entrega:** 30 dias

**Executado:** 100%

Imagens do local



Antes



Depois



# SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

**Projeto/Obra:** Revitalização e Paisagismo em área

**Local:** Rua Piatá - Praça Jaguarima

**Valor:** R\$ 276.530,00

**Prazo para entrega:** 90 dias

**Executado:** 100%



Imagens do local



# SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

**Projeto/Obra:** Revitalização e Paisagismo em área.

**Local:** Av. José Maria Fernandes – Praça Novo Mundo

**Valor:** R\$ 309.601,81

**Prazo para entrega:** 90 dias

**Executado:** 100%



Imagens do local

# SUBPREFEITURA PENHA

**Projeto/Obra:** Readequação de Área Municipal.

**Local:** Av.Dr.Orêncio Vidigal

**Valor:** R\$ 74.754,13

**Prazo para entrega:** 60 dias.

**Executado:** 100%



Imagens do local





# SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

**Projeto/Obra:** Readequação de Área Pública

**Local:** Praça Manoel Gonçalves Bragança – R. Inácio Pinto Lima x R. José Bernardes Oliveira – Conj. Habit. Prefeito Prestes Maia

**Valor:** R\$ 149.796,44

**Prazo para entrega:** 90 dias

**Executado:** 100%



Imagens do local

# DETALHAMENTO DAS OBRAS

| SUBPREFEITURA     | OBJETO                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                             | PROCESSO Nº      | CUSTO DAS OBRAS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ARICANDUVA        | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça Francisco Mendes de Carvalho - av. Barreira Grande                          | 2014-0.190.724-1 | 161.311,28      |
|                   | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça São Constâncio - rua Pretória                                               | 2014-0.190.727-6 | 159.856,47      |
|                   | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça Luis Garcia - rua Rêgo Barros e rua Frei Paulo Luig.                        | 2014-0.190.730-6 | 104.026,89      |
|                   | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 2014-0.190.738-1 | 160.514,97      |
|                   | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça na Rua Altena                                                               | 2014-0.190.977-5 | 103.896,60      |
|                   | Reforma e adequação de praça                                                                                                                                                                                      | Praça Nelson José Sigrist                                                         | 2014-0.181.275-5 | 134.650,97      |
|                   | Reforma e adequação de praça                                                                                                                                                                                      | Praça Severina Cabral Carneiro                                                    | 2014-0.181.264-0 | 76.076,26       |
|                   | Readequação e urbanização de praça com instalação de playground e ATl                                                                                                                                             | Praça Dr. Sampaio Vidal                                                           | 2014-0.197.160-8 | 43.570,06       |
| BUTANTÃ           | Requalificação de praça e canteiros, com reforma e adequação dos passeios, áreas de estar e lazer, microdrenagem, plantio de forrações, instalação de mobiliários e estrutura de contenção das margens do córrego | Parque Linear Flora Rica                                                          | 2014-0.003.880-0 | 1.484.082,66    |
| CAPELA DO SOCORRO | Execução parcial de guias e sarjetas                                                                                                                                                                              | Parque Shangrila - r. Rodrigues Alves, r. Pavao Celeste, tv. Boa Esperança. Tv. 1 | 2014-0.187.362-2 | 349.414,79      |
|                   | Execução de escadaria acessível                                                                                                                                                                                   | Rua Rubens Montanaro de Borba x Rua José André Patini                             | 2014-0.187.351-7 | 198.254,14      |
|                   | Execução parcial de passeio acessível                                                                                                                                                                             | Av. Frederico Rene de Jaegher (próximo a Rua Relva Velha)                         | 2014-0.187.366-5 | 498.332,04      |
|                   | Adequação de praça                                                                                                                                                                                                | Praça Nicaragua - Rua Rio Paraiba                                                 | 2014-0.191.053-6 | 79.405,51       |
|                   | Recuperação de viela                                                                                                                                                                                              | Entre as Ruas José Quaresma Junior e Rua Pelágio Starbulov                        | 2014-0.187.342-8 | 196.236,27      |

# DETALHAMENTO DAS OBRAS

|                   |                                                                                                                          |                                                                               |                  |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| CIDADE ADEMAR     | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51                    | Praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51                       | 2014-0.178.944-3 | 147.207,48 |
|                   | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340                       | Praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340                          | 2014-0.178.948-6 | 149.578,11 |
|                   | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Robélia Alt 635                                    | Praça localizada na rua Robélia Alt 635                                       | 2014-0.178.955-9 | 68.913,29  |
|                   | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na Av. Marari, 248                                        | Praça localizada na Av. Marari, 248                                           | 2014-0.178.965-6 | 49.602,72  |
|                   | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119                   | Praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119                      | 2014-0.179.019-0 | 49.218,96  |
|                   | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas                           | Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas                           | 2014-0.198.879-9 | 97.948,24  |
|                   | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto               | Viela\escadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto               | 2014-0.198.890-0 | 119.438,96 |
|                   | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 -Antonio Dias Adorno | Viela\escadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 -Antonio Dias Adorno | 2014-0.198.932-9 | 119.179,56 |
| CIDADE TIRADENTES | Readequação de área pública                                                                                              | Rua Profeta Jeremias, altura do Nº 50                                         | 2014-0.201.139-0 | 173.383,40 |
|                   | Readequação de área pública                                                                                              | Rua Guilherme Todaro x Rua Rafael Della Mônica                                | 2014-0.201.114-4 | 168.354,30 |
|                   | Readequação de área pública                                                                                              | Rua Nascer do Sol x Estrada de Iguatemi                                       | 2014-0.201.134-9 | 153.263,64 |
|                   | Readequação de área pública                                                                                              | Praça Manoel Gonçalves Bragança - Conjunto Habitacional Prefeito Prestes Maia | 2014-0.201.165-9 | 147.948,67 |
|                   | Readequação de praça                                                                                                     | Praça José Ribeiro Carvalhais (Conjunto Prestes Maia)                         | 2014-0.201.101-2 | 160.927,05 |
|                   | Readequação de área pública                                                                                              | Rua Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Pérola                                 | 2014-0.201.121-7 | 157.841,39 |



# DETALHAMENTO DAS OBRAS

|                         |                                       |                                                                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| FREGUESIA / BRASILANDIA | Reforma de passeios e acessibilidade  | Vários trechs da Av. Deputado Cantidio Sampaio                      | 2014-0.043.197-9 | 504.183,49 |
| GUAIANASES              | Readequação de Área Pública           | Espaço Publico - Rua Honório Alves x Rua Soberania Divina - Lajeado | 2014-0.192.428-6 | 192.861,54 |
|                         | Readequação de Praça                  | Rua Marmelo - Jd. São Carlos                                        | 2014-0.192.339-5 | 108.654,99 |
|                         | Readequação de Praça                  | Rua Antonio Petrica - Vila Chabilandia                              | 2014-0.192.436-7 | 43.430,07  |
|                         | Readequação de Praça                  | Rua Treze , s/nº - Vila São Geraldo                                 | 2014-0.192.409-0 | 128.951,19 |
|                         | Readequação de Praça                  | Rua Gaspar Aranha x rua Maestro Antonio Caparroz                    | 2014-0.192.443-0 | 160.178,41 |
|                         | Readequação de Área Pública           | Rua Passagem Funda x Rua Luis de Souza - jd. São Carlos             | 2014-0.192.414-6 | 39.035,02  |
|                         | Readequação de Área Pública           | Rua Ipê Cacuanha - Vila Nanci                                       | 2014-0.192.325-5 | 44.554,63  |
|                         | Readequação da Praça Barbalho Bezerra | Rua Barbalho Bezerra x rua Pedro da Silveira                        | 2014-0.192.317-4 | 171.753,58 |
| JABAQUARA               | Implantação de área de lazer          | Rua Marco Palmezzano                                                | 2013-0.278.638-1 | 158.827,74 |
|                         | Implantação de área de lazer          | Cobertura da quadra Filinto Eliseu                                  | 2014-0.181.254-2 | 148.698,06 |
|                         | Adequação de passeio                  | Rua Joege Duprat Figueiredo                                         | 2010-0.289.468-5 | 424.966,03 |
|                         | Adequação de praça                    | Praça do encontro                                                   | 2014-0.216.124-3 | 91.299,57  |

# DETALHAMENTO DAS OBRAS

|             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| M'BOI MIRIM | Readequação de viela                                                                                            | Rua João Damasceno x Rua Andre Brenha Ribeiro                                                                                                                     | 2014-0.196.953-0 | 143.988,66 |
|             | Readequação de viela                                                                                            | Vuela Rua Apolonio de Tiana x Rua Oratório de Natal                                                                                                               | 2014-0.196.971-9 | 69.645,50  |
|             | Requalificação de praça e area municipal                                                                        | Av. Fim de Semana x rua Arq. Roberto Patrao de Assis, rua Agostinho fabre x Rua João Gomes, rua Baltazar Carvalhau e rua frei Luis Beltrão, Jd.Promorar São Luis. | 2014-0.197.367-8 | 441.012,31 |
|             | Readequação de Área Municipal                                                                                   | Rua Benjamim Cosin- Jd. Vera Cruz                                                                                                                                 | 2014-0.196.956-5 | 442.769,72 |
|             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  | 279.506,97 |
|             | Readequação de escadaria                                                                                        | Rua Ribeira dos Frades, 126 B                                                                                                                                     | 2014-0.197.053-9 | 66.965,24  |
|             | Revitalização do espaço público, com a implantação de Quadra Poliesportiva, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica | Rua Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho - Vila Santo Amaro                                                                                                          | 2014-0.141.246-3 | 294.103,20 |
|             | Revitalização do espaço público, com a implantação de Campo de Futebol, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica     | Rua Pedro Agulha de Figueiró - Pq. Figueira Grande                                                                                                                | 2014-0.112.404-2 | 356.796,38 |
|             | Serviços Readequação de viela                                                                                   | Travessa Amon x Rua Salgueiro do Campo                                                                                                                            | 2014-0.196.958-1 | 45.368,39  |
|             | Readequação de escadaria                                                                                        | Rua Antonio da Cruz Messias x Rua Salgueiro do Campo                                                                                                              | 2014-0.197.405-4 | 49.893,33  |
|             | Readequação de calçada - UBS Jardim Souza                                                                       | Rua Maria José de Souza, 190                                                                                                                                      | 2014-0.196.975-1 | 78.185,10  |
|             | Readequação de Área Municipal                                                                                   | Rua das Tres Marias, 801 - chacara Santa Maria                                                                                                                    | 2014-0.196.982-4 | 200.421,78 |
|             | Readequação de escadaria                                                                                        | Rua Bocaina de Minas x Rua Santa Rita de Sapucaí                                                                                                                  | 2014-0.197.099-7 | 119.237,14 |
|             | Readequação de escadaria                                                                                        | Vuela na Estrada do M'Boi Mirim, altura do nº 4005, próximo da Rua Luis Balduino                                                                                  | 2014-0.196.932-8 | 161.656,93 |

# DETALHAMENTO DAS OBRAS

|       |                                      |                                              |                  |            |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
| PENHA | Adequação de Passeios                | UBS Antonio Estevão de Carvalho - Rua Japoni | 2014-0.194.890-8 | 53.480,21  |
|       | Adequação de Passeios                | UBS Jd. São Francisco - rua Juritipiranga    | 2014-0.193.082-0 | 99.677,25  |
|       | Adequação de Passeios                | Rua Pe. Manuel da Nobrega, alt. 545          | 2014-0.193.103-7 | 74.010,10  |
|       | Adequação de área municipal - Ata RP | Av. Maraial x Rua Catende                    | 2014-0.193.109-6 | 119.839,06 |
|       | Adequação de área municipal          | Rua João Batista Aranha                      | 2014-0.192.600-9 | 66.192,41  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Bauxita                                | 2014-0.192.765-0 | 69.821,49  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Nossa Senhora da Guia                  | 2014-0.193.015-4 | 66.948,70  |
|       | Adequação de área municipal          | Rua Padre Francisco Ribeiro                  | 2014-0.193.067-7 | 68.911,63  |
|       | Adequação de Passeios                | Av. Antonio Estevão de Carvalho, Patriarca   | 2014-0.193.072-3 | 124.657,30 |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Rua Olga Artacho x Rua Juriti Piranga  | 2014-0.193.026-0 | 70.669,82  |
|       | Adequação de área municipal          | Rua Durandê x Av. Águia de Haia              | 2014-0.192.675-0 | 66.957,16  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Pedro Conde                            | 2014-0.193.019-7 | 66.187,57  |
|       | Adequação de área municipal          | Rua S. José do Belmonte                      | 2014-0.192.681-5 | 67.889,84  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Alastair Quintas Gonçalves             | 2014-0.192.687-4 | 68.236,29  |
|       | Adequação de área municipal          | Rua Dr. Orêncio Vidigal                      | 2014-0.192.610-6 | 65.909,84  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Miguelópolis                           | 2014-0.192.818-4 | 66.161,69  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Erva de Passarinho                     | 2014-0.192.783-8 | 64.967,65  |
|       | Adequação de Praça                   | Praça Alto Domingos                          | 2014-0.192.699-8 | 66.368,01  |
|       | Adequação de Praça                   | Rua Brook Taylor                             | 2014-0.192.606-8 | 68.278,18  |

# DETALHAMENTO DAS OBRAS

|                  |                                                                                                                        |                                                                                   |                  |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| PIRITUBA/JARAGUA | Requalificação de Praça                                                                                                | Praça Luiz Gonzaga - entre a rua Galdino Catunda Gondim a e rua Francisco Beltrão | 2014-0.159.294-1 | 165.949,31   |
| SANTO AMARO      | Readequação das vias públicas, trecho que circunda a Praça Floriano Peixoto, Rua Mario Lopes Leão até a Rua Paulo Eiro | Praça Floriano Peioto, Rua Mario Lopes Leão até Rua Paulo Eiro                    | 2014-0207.009-4  | 853.383,77   |
| SÃO MIGUEL       | Plano ciclovitário - Trecho II - Pires do Rio                                                                          | TRECHO ENTR E R PIRES DO RIO X R CARDON X AV NORDESTINA X R CEMBIRA X AV MAL TITO | 2013-0.267.810-4 | 2.748.888,40 |
|                  | Plano ciclovitário - Trecho III - Jd. Helena                                                                           | RUAS DO DIST DO JD HELENA, REGIAO DA SUBPREF DE SAO MIGUEL PAULISTA               | 2013-0.267.809-0 | 105.681,48   |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 3.725.204,32 |
| SAPOPEMBA        | Reforma de escadaria                                                                                                   | Rua Rosa da China x rua Tulipa da Africa                                          | 2014-0.169.009-9 | 44.158,51    |
|                  | Revitalização de area pública                                                                                          | Rua Giovani Nasco                                                                 | 2014-0.195.313-8 | 76.026,29    |

# DETALHAMENTO DAS OBRAS

|                             |                                                                     |                                                                 |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| VILA MARIA / VILA GUILHERME | Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG | Praça Novo Mundo Av. José Maria Fernandes                       | 2014-0.074.734-8 | 308.970,49    |
|                             | Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG | Praça Jaguarima - Rua Piatá                                     | 2014-0.074.738-0 | 276.461,95    |
|                             | Urbanização e melhorias                                             | Travessa Frei Antonio de Sanctis                                | 2014.0.229.549-5 | 205.349,47    |
|                             | Urbanização e melhorias                                             | Vielas - Via de Pedestres Magnolia Amarela e outras             | 2014.0.229.508-8 | 248.134,56    |
|                             | Contratação de Obras para Intervenção, Urbanização e melhorias      | Travessa Edgar Adrian e Outras                                  | 2014.0.229.531-2 | 253.349,77    |
| VILA PRUDENTE               | Reforma de escadaria de pedestres                                   | R André de Frias e R Aureliano Mourão - São Lucas               | 2014-0.144.688-0 | 148.696,97    |
|                             | Adequação de Drenagem                                               | Obra na Rua Roberio Dias - próx. Av. Vila Ema - São Lucas       | 2014-0.144.699-6 | 109.865,15    |
|                             | Praça                                                               | Praça República Lituana - Vila Prudente                         | 2014-0.159.897-4 | 126.161,90    |
|                             | Revitalização de praça                                              | Praça Mendel Hirschfeld - Rua Luis Pereira da Silva - São Lucas | 2014-0.160.660-8 | 104.056,44    |
|                             | Reforma de viela                                                    | Rua Nelson Baldinato - São Lucas                                | 2013-0.097.734-1 | 68.270,47     |
| SMT                         |                                                                     |                                                                 |                  | 7.508.508,75  |
|                             |                                                                     |                                                                 |                  | 3.014.399,86  |
|                             |                                                                     |                                                                 |                  | 31.986.061,71 |



| SUBPREFEITURA           | OBJETO                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                            | PROCESSO           | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| ARICANDUVA              | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça Francisco Mendes de Carvalho - av. Barreira Grande                                                                                                         | 2014-0.190.724-1** | 161.424,49      | 161.311,28        |
|                         | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça São Constandcio - rua Pretória                                                                                                                             | 2014-0.190.727-6** | 159.969,07      | 159.856,47        |
|                         | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça Luis Garcia - rua Rêgo Barros e rua Frei Paulo Luig.                                                                                                       | 2014-0.190.730-6   | 104.151,06      | 104.026,89        |
|                         | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça João Giunti - rua Astarté                                                                                                                                  | 2014-0.190.738-1** | 160.632,87      | 160.514,97        |
|                         | Revitalização de Praça                                                                                                                                                                                            | Praça na Rua Altena                                                                                                                                              | 2014-0.190.977-5** | 103.989,37      | 103.896,60        |
|                         | Reforma e adequação de praça                                                                                                                                                                                      | Praça Nelson José Sigrist                                                                                                                                        | 2014-0.181.275-5   | 134.771,16      | 134.650,97        |
|                         | Reforma e adequação de praça                                                                                                                                                                                      | Praça Severina Cabral Carneiro                                                                                                                                   | 2014-0.181.264-0   | 76.194,96       | 76.076,26         |
|                         | Readequação e urbanização de praça com instalação de playground e ATI                                                                                                                                             | Praça Dr. Sampaio Vidal                                                                                                                                          | 2014-0.197.160-8   | 43.679,47       | 43.570,06         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 944.812,45      | 943.903,50        |
| BUTANTÃ                 | Requalificação de praça e canteiros, com reforma e adequação dos passeios, áreas de estar e lazer, microdrenagem, plantio de forrações, instalação de mobiliários e estrutura de contenção das margens do córrego | Parque Linear Flora Rica                                                                                                                                         | 2014-0.003.880-0   | 1.484.099,57    | 1.484.082,66      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 1.484.099,57    | 1.484.082,66      |
| CAPELA DO SOCORRO       | Execução parcial de guias e sarjetas                                                                                                                                                                              | Parque Shangrila - r. Rodrigues Alves, r. Pavao Celeste, tv. Boa Esperança. Tv. 1                                                                                | 2014-0.187.362-2   | 349.415,38      | 349.414,79        |
|                         | Execução de escadaria acessível                                                                                                                                                                                   | Rua Rubens Montanaro de Borba x Rua José André Patini                                                                                                            | 2014-0.187.351-7   | 199.441,25      | 198.254,14        |
|                         | Execução parcial de passeio acessível                                                                                                                                                                             | Av. Frederico Rene de Jaegher (próximo a Rua Relva Velha)                                                                                                        | 2014-0.187.366-5   | 498.403,70      | 498.332,04        |
|                         | Adequação de praça                                                                                                                                                                                                | Praça Nicaragua - Rua Rio Paraíba                                                                                                                                | 2014-0.191.053-6   | 79.422,35       | 79.405,51         |
|                         | Recuperação de viela                                                                                                                                                                                              | Entre as Ruas José Quaresma Junior e Rua Pelágio Starbulov                                                                                                       | 2014-0.187.342-8   | 196.806,99      | 196.236,27        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 1.323.489,67    | 1.321.642,75      |
| CIDADE ADEMAR           | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51                                                                                                             | Praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51                                                                                                          | 2014-0.178.944-3   | 148.701,25      | 147.207,48        |
|                         | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340                                                                                                                | Praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340                                                                                                             | 2014-0.178.948-6   | 149.578,11      | 149.578,11        |
|                         | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Robélia Alt 635                                                                                                                             | Praça localizada na rua Robélia Alt 635                                                                                                                          | 2014-0.178.955-9   | 68.913,29       | 68.913,29         |
|                         | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na Av. Marari, 248                                                                                                                                 | Praça localizada na Av. Marari, 248                                                                                                                              | 2014-0.178.965-6   | 49.602,72       | 49.602,72         |
|                         | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119                                                                                                            | Praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119                                                                                                         | 20140.179.019-0    | 49.224,36       | 49.218,96         |
|                         | Contratação de empresa para readequação de Vialaescadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas                                                                                                                     | Vialaescadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas                                                                                                               | 2014-0.198.879-9   | 98.828,82       | 97.948,24         |
|                         | Contratação de empresa para readequação de Vialaescadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto                                                                                                         | Vialaescadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto                                                                                                   | 2014-0.198.890-0   | 119.438,96      | 119.438,96        |
|                         | Contratação de empresa para readequação de Vialaescadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 –Antonio Dias Adorno                                                                                           | Vialaescadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 –Antonio Dias Adorno                                                                                     | 2014-0.198.932-9   | 119.179,56      | 119.179,56        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 803.467,07      | 801.087,32        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |                 |                   |
| CIDADE TIRADENTES       | Readequação de área pública                                                                                                                                                                                       | Rua Profeta Jeremias, altura do Nº 50                                                                                                                            | 2014-0.201.139-0   | 173.383,48      | 173.383,40        |
|                         | Readequação de área pública                                                                                                                                                                                       | Rua Guilherme Todaro x Rua Rafael Della Mônica                                                                                                                   | 2014-0.201.114-4   | 168.507,06      | 168.354,30        |
|                         | Readequação de área pública                                                                                                                                                                                       | Rua Nascer do Sol x Estrada de Iguatemi                                                                                                                          | 2014-0.201.134-9   | 154.531,55      | 153.263,64        |
|                         | Readequação de área pública                                                                                                                                                                                       | Praça Manoel Gonçalves Bragança - Conjunto Habitacional Prefeito Prestes Maia                                                                                    | 2014-0.201.165-9   | 148.150,20      | 147.948,67        |
|                         | Readequação de praça                                                                                                                                                                                              | Praça José Ribeiro Carvalhais (Conjunto Prestes Maia)                                                                                                            | 2014-0.201.101-2   | 161.556,25      | 160.927,05        |
|                         | Readequação de área pública                                                                                                                                                                                       | Rua Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Pérola                                                                                                                    | 2014-0.201.121-7   | 157.916,36      | 157.841,39        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 964.044,90      | 961.718,45        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |                 |                   |
| FREGUESIA / BRASILANDIA | Reforma de passeios e acessibilidade                                                                                                                                                                              | Vários trechs da Av. Deputado Cantídio Sampaio                                                                                                                   | 2014-0.043.197-9   | 504.193,11      | 504.183,49        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 504.193,11      | 504.183,49        |
| GUAIANASES              | Readequação de Área Pública                                                                                                                                                                                       | Espaço Publico - Rua Honório Alves x Rua Soberania Divina - Lajeado                                                                                              | 2014-0.192.428-6   | 193.171,58      | 192.861,54        |
|                         | Readequação de Praça                                                                                                                                                                                              | Rua Marmelo - Jd. São Carlos                                                                                                                                     | 2014-0.192.339-5   | 108.769,08      | 108.654,99        |
|                         | Readequação de Praça                                                                                                                                                                                              | Rua Antonio Petrica - Vila Chabilandia                                                                                                                           | 2014-0.192.436-7   | 43.586,91       | 43.430,07         |
|                         | Readequação de Praça                                                                                                                                                                                              | Rua Treze , s/nº - Vila São Geraldo                                                                                                                              | 2014-0.192.409-0   | 191.941,75      | 128.951,19        |
|                         | Readequação de Praça                                                                                                                                                                                              | Rua Gaspar Aranha x rua Maestro Antonio Caparroz                                                                                                                 | 2014-0.192.443-0   | 203.395,61      | 160.178,41        |
|                         | Readequação de Área Pública                                                                                                                                                                                       | Rua Passagem Funda x Rua Luis de Souza - jd. São Carlos                                                                                                          | 2014-0.192.414-6   | 39.127,86       | 39.035,02         |
|                         | Readequação de Área Pública                                                                                                                                                                                       | Rua Ipê Cacuanha - Vila Nanci                                                                                                                                    | 2014-0.192.325-5   | 131.220,37      | 44.554,63         |
|                         | Readequação da Praça Barbalho Bezerra                                                                                                                                                                             | Rua Barbalho Bezerra x rua Pedro da Silveira                                                                                                                     | 2014-0.192.317-4   | 172.146,99      | 171.753,58        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 1.083.360,15    | 889.419,43        |
| JABAQUARA               | Implantação de área de lazer                                                                                                                                                                                      | Rua Marco Palmezzano                                                                                                                                             | 2013-0.278.638-1   | 158.860,51      | 158.827,74        |
|                         | Implantação de área de lazer                                                                                                                                                                                      | Coertura da quadra Filinto Eliseu                                                                                                                                | 2014-0.181.254-2   | 148.736,66      | 148.698,06        |
|                         | Adequação de passeio                                                                                                                                                                                              | Rua Joege Duprat Figueiredo                                                                                                                                      | 2010-0.289.468-5   | 425.016,51      | 424.966,03        |
|                         | Adequação de praça                                                                                                                                                                                                | Praça do encontro                                                                                                                                                | 2014-0.216.124-3   | 91.345,25       | 91.299,57         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 823.958,93      | 823.791,40        |
| M´BOI MIRIM             | Readequação de viela                                                                                                                                                                                              | Rua João Damasceno x Rua Andre Brenha Ribeiro                                                                                                                    | 2014-0.196.953-0   | 144.403,08      | 143.988,66        |
|                         | Readequação de viela                                                                                                                                                                                              | Vielas Rua Apolonio de Tiana x Rua Oratório de Natal                                                                                                             | 2014-0.196.971-9   | 69.825,64       | 69.645,50         |
|                         | Requalificação de praça e area municipal                                                                                                                                                                          | Av. Fim de Semana x rua Arq. Roberto Patrao de Assis, rua Agostinho fabre x Rua João Gomes, rua Baltazar Carvahau e rua frei Luis Beltrão, Jd.Promorar São Luis. | 2014-0.197.367-8   | 441.747,29      | 441.012,31        |
|                         | Readequação de Área Municipal                                                                                                                                                                                     | Rua Benjamim Cosin- Jd. Vera Cruz                                                                                                                                | 2014-0.196.956-5   | 442.769,72      | 442.769,72        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 279.506,97      | 279.506,97        |
|                         | Readequação de escadaria                                                                                                                                                                                          | Rua Ribeira dos Frades, 126 B                                                                                                                                    | 2014-0.197.053-9   | 67.217,90       | 66.965,24         |
|                         | Revitalização do espaço público, com a implantação de Quadra Poliesportiva, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica                                                                                                   | Rua Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho - Vila Santo Amaro                                                                                                         | 2014-0.141.246-3   | 294.202,05      | 294.103,20        |
|                         | Revitalização do espaço público, com a implantação de Campo de Futebol, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica                                                                                                       | Rua Pedro Agulha de Figueiró - Pq. Figueira Grande                                                                                                               | 2014-0.112.404-2   | 356.796,38      | 356.796,38        |
|                         | Serviços Readequação de viela                                                                                                                                                                                     | Travessa Amon x Rua Salgueiro do Campo                                                                                                                           | 2014-0.196.958-1   | 45.711,03       | 45.368,39         |
|                         | Readequação de escadaria                                                                                                                                                                                          | Rua Antonio da Cruz Messias x Rua Salgueiro do Campo                                                                                                             | 2014-0.197.405-4   | 50.094,07       | 49.893,33         |
|                         | Readequação de calçada - UBS Jardim Souza                                                                                                                                                                         | Rua Maria José de Souza, 190                                                                                                                                     | 2014-0.196.975-1   | 78.332,44       | 78.185,10         |
|                         | Readequação de Área Municipal                                                                                                                                                                                     | Rua das Tres Marias, 801 - chacara Santa Maria                                                                                                                   | 2014-0196.982-4    | 200.460,60      | 200.421,78        |
|                         | Readequação de escadaria                                                                                                                                                                                          | Rua Bocaína de Minas x Rua Santa Rita de Sapucaí                                                                                                                 | 2014-0.197.099-7   | 119.252,92      | 119.237,14        |
|                         | Readequação de escadaria                                                                                                                                                                                          | Vielas na Estrada do M'Boi Mirim, altura do nº 4005, próximo da Rua Luis Baldinato                                                                               | 2014-0.196.932-8   | 163.720,49      | 161.656,93        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    | 2.754.040,58    | 2.749.550,65      |

|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  |              |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| PENHA                  | Adequação de Passeios                                                                                                  | UBS Antonio Estevão de Carvalho - Rua Japani                                      | 2014-0.194.890-8 | 53.480,64    | 53.480,21    |
|                        | Adequação de Passeios                                                                                                  | UBS Jd. São Francisco - rua Juritipiranga                                         | 2014-0.193.082-0 | 99.677,93    | 99.677,25    |
|                        | Adequação de Passeios                                                                                                  | Rua Pe. Manuel da Nobrega, alt. 545                                               | 2014-0.193.103-7 | 74.112,51    | 74.010,10    |
|                        | Adequação de área municipal - Ata RP                                                                                   | Av. Maraial x Rua Catende                                                         | 2014-0.193.109-6 | 119.839,56   | 119.839,06   |
|                        | Adequação de Passeios                                                                                                  | Rua Itinguçú                                                                      | 2014-0.192.592-4 |              |              |
|                        | Adequação de área municipal                                                                                            | Rua João Batista Aranha                                                           | 2014-0.192.600-9 | 66.850,95    | 66.192,41    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Bauxita                                                                     | 2014-0.192.765-0 | 69.821,53    | 69.821,49    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Nossa Senhora da Guia                                                       | 2014-0.193.015-4 | 66.964,56    | 66.948,70    |
|                        | Adequação de área municipal                                                                                            | Rua Padre Francisco Ribeiro                                                       | 2014-0.193.067-7 | 68.924,82    | 68.911,63    |
|                        | Adequação de Passeios                                                                                                  | Av. Antonio Estevão de Carvalho, Patriarca                                        | 2014-0.193.072-3 | 124.658,49   | 124.657,30   |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Rua Olga Artacho x Rua Juriti Piranga                                       | 2014-0.193.026-0 | 70.669,82    | 70.669,82    |
|                        | Adequação de área municipal                                                                                            | Rua Durandê x Av. Águia de Haia                                                   | 2014-0.192.675-0 | 66.978,39    | 66.957,16    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Pedro Conde                                                                 | 2014-0.193.019-7 | 66.259,25    | 66.187,57    |
|                        | Adequação de área municipal                                                                                            | Rua S. José do Belmonte                                                           | 2014-0.192.681-5 | 67.889,95    | 67.889,84    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Alastair Quintas Gonçalves                                                  | 2014-0.192.687-4 | 68.237,58    | 68.236,29    |
|                        | Adequação de área municipal                                                                                            | Rua Dr. Orêncio Vidigal                                                           | 2014-0.192.610-6 | 65.993,02    | 65.909,84    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Miguelópolis                                                                | 2014-0.192.818-4 | 66.161,83    | 66.161,69    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Erva de Passarinho                                                          | 2014-0.192.783-8 | 64.989,22    | 64.967,65    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Praça Alto Domingos                                                               | 2014-0.192.699-8 | 66.964,56    | 66.368,01    |
|                        | Adequação de Praça                                                                                                     | Rua Brook Taylor                                                                  | 2014-0.192.606-8 | 68.278,18    | 68.278,18    |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 1.416.752,79 | 1.415.164,20 |
| PIRITUBA               | Requalificação de Praça                                                                                                | Praça Luiz Gonzaga - entre a rua Galdino Catunda Gondim a e rua Francisco Beltrão | 2014-0.159.294-1 | 165.949,31   | 165.949,31   |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 165.949,31   | 165.949,31   |
| SANTO AMARO            | Readequação das vias públicas, trecho que circunda a Praça Floriano Peixoto, Rua Mario Lopes Leão até a Rua Paulo Eiro | Praça Floriano Peioto, Rua Mario Lopes Leão até Rua Paulo Eiro                    | 2014-0207.009-4  | 853.385,13   | 853.383,77   |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 853.385,13   | 853.383,77   |
| SÃO MIGUEL             | Plano cicloviário - Trecho II - Pires do Rio                                                                           | TRECHO ENTR E R PIRES DO RIO X R CARDON X AV NORDESTINA X R CEMBIRA X AV MAL TITO | 2013-0.267.810-4 | 2.748.888,40 | 2.748.888,40 |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 913.861,12   | 105.681,48   |
|                        | Plano cicloviário - Trecho III - Jd. Helena                                                                            | RUAS DO DIST DO JD HELENA, REGIAO DA SUBPREF DE SAO MIGUEL PAULISTA               | 2013–0.267.809–0 | 5.792.089,56 | 3.725.204,32 |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 9.454.839,08 | 6.579.774,20 |
| SAPOPEMBA              | Reforma de escadaria                                                                                                   | Rua Rosa da China x rua Tulipa da Africa                                          | 2014-0.169.009-9 | 44.161,35    | 44.158,51    |
|                        | Revitalização de area pública                                                                                          | Rua Giovani Nasco                                                                 | 2014-0.195.313-8 | 199.366,46   | 76.026,29    |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 243.527,81   | 120.184,80   |
| VILA MARIA / GUILHERME | Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG                                                    | Praça Novo Mundo Av. José Maria Fernandes                                         | 2014-0.074.734-8 | 308.974,03   | 308.970,49   |
|                        | Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG                                                    | Praça Jaguarima - Rua Piatá                                                       | 2014-0.074.738-0 | 276.530,00   | 276.461,95   |
|                        | A- Urbanização e melhorias                                                                                             | Travessa Frei Antonio de Sanctis                                                  | 2014-0.229.549-5 | 205.397,67   | 205.349,47   |
|                        | A1 -Urbanização e melhorias                                                                                            | Vielas - Via de Pedestres Magnolia Amarela e outras                               | 2014-0.229.508-8 | 248.156,67   | 248.134,56   |
|                        | A2-Contratação de Obras paraIntervenção, Urbanização e melhorias                                                       | Travessa Edgar Adrian e Outras                                                    | 2014-0.229.531-2 | 253.349,77   | 253.349,77   |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 1.292.408,14 | 1.292.266,24 |
| VILA PRUDENTE          | Reforma de escadaria de pedestres                                                                                      | R André de Frias e R Aureliano Mourão - São Lucas                                 | 2014-0.144.688-0 | 148.716,86   | 148.696,97   |
|                        | Adequação de Drenagem                                                                                                  | Obra na Rua Roberio Dias - próx. Av. Vila Ema - São Lucas                         | 2014-0.144.699-6 | 109.871,93   | 109.865,15   |
|                        | Praça                                                                                                                  | Praça República Lituana - Vila Prudente                                           | 2014-0.159.897-4 | 126.179,22   | 126.161,90   |
|                        | Revitalização de praça                                                                                                 | Praça Mendel Hirschfeld - Rua Luis Pereira da Silva - São Lucas                   | 2014-0.160.660-8 | 104.069,00   | 104.056,44   |
|                        | Reforma de viela                                                                                                       | Rua Nelson Baldinato - São Lucas                                                  | 2013-0.097.734-1 | 68.481,93    | 68.270,47    |
|                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                  | 557.318,94   | 557.050,93   |



## FUNDURB - PROJETOS SMT PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014

## ORÇAMENTO - GASTOS

|             | Orçamento     | Empenhado     | Liquidado     | % Utilizada |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| SMT - Total | 11.376.500,00 | 11.109.376,31 | 10.522.908,61 | 92,50%      |
| SPTrans     | 3.355.000,00  | 3.087.876,31  | 3.014.399,86  | 89,85%      |
| CET         | 8.021.500,00  | 8.021.500,00  | 7.508.508,75  | 93,60%      |



## FUNDURB – PROJETOS SPTRANS



## PLANILHA DE OBRAS - SPTrans

| Nº | SUBPREFEITURA | LOCAL                                                                          | DESCRIÇÃO OBRA                                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | BUTANTÃ       | Av. Padre Lebrete x Av. Morumbi                                                | Adequações geométricas apresentadas pela CET               |
| 2  | CAMPO LIMPO   | Estrada de Itapeirica x R. João Felício dos Santos x Rua Feitico da Villa      | Execução de baia de ônibus                                 |
| 3  |               | Estrada do Campo Limpo , próximo a Rua Gaspar Coqueiro                         | Alargamento parcial da via para melhorias no tráfego local |
| 4  |               | Estrada do Campo Limpo entre Rua Gaspar Coqueiro e Av. Carlos Caldeira Filho   | Alargamento parcial da via para melhorias no tráfego local |
| 5  |               | Estrada do Campo Limpo, próximo a Estrada dos Mirandas                         | Alargamento parcial da via para melhorias no tráfego local |
| 6  |               | Estrada do Campo Limpo entre Rua Dr. Marinho de Andrade e Rua Alves dos Santos | Alargamento parcial da via para melhorias no tráfego local |



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SPTRANS

# Estrada de Itapecerica x Rua João Felício dos Santos x Rua Feitiço da Vila

ANTES



DURANTE



DEPOIS



## Estrada do campo Limpo – Próximo a Rua Gaspar Coqueiro

DURANTE

ANTES



DEPOIS





# Estrada do Campo Limpo, Entre Rua Raspar coqueiro e Avenida Carlos Caldeira Filho

ANTES



DURANTE



DEPOIS





## Estrada do Campo Limpo, próximo a Estrada dos Mirandas

ANTES



DURANTE



DEPOIS



ANTES



DURANTE



DEPOIS



# Estrada de Itapecerica x Rua João Felício dos Santos x Feitiço da Vila

ANTES



DURANTE



DEPOIS





ANTES



DEPOIS





## FUNDURB – PROJETOS CET



# PLANILHA DE OBRAS - CET

| Nº | SUBPREFEITURA              | LOCAL                                                              | DESCRIÇÃO OBRA                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BUTANTÃ                    | Rod. Raposo Tavares x R. Sapetuba x R. Alvarenga                   | Alargamento da Rod. Raposo Tavares (Sentido S.Paulo) e adequação geométrica p/ aumento de capacidade do cruzamento                                                                                                                      |
| 2  | ITAQUERA                   | Av. Jacu - Pêssego / Nova Trabalhadores                            | Corte de canteiro central e construção de baia para acomodação de veículos quebrados                                                                                                                                                    |
| 3  |                            | Av. Jacu - Pêssego com Rua Tamoichi Shimizu                        | Troca de prisma por construção de ilha física                                                                                                                                                                                           |
| 4  | LAPA                       | Rua Monte Pascal x Praça do Maçon<br>Baia sentido Anhanguera/ Lapa | Construção de baia para ônibus.                                                                                                                                                                                                         |
| 5  |                            | Praça Anibal Marcondes do Amaral                                   | Adequação geométrica.<br>Obra executada parcialmente pela SP LA.                                                                                                                                                                        |
| 6  | MOOCA                      | Av. Salim Farah Maluf proximo Ponte Tatuapé                        | Rebaixamento de canteiro e guias para transposição operacinal de carga superdimensio-nada                                                                                                                                               |
| 7  | PENHA                      | Av. Amador Bueno da Veiga entre R.Major Rudge e R. José Maria      | Melhoria geométrica com acerto da superelevação ao contrário do pavimento (Curva Perigosa) para aumento da segurança viária.                                                                                                            |
| 8  |                            | Vd. Gal.Domingos Franciulli Neto x Marginal Tietê                  | Construção de alça de acesso e via de interligação para implantação de mão dupla no Vd. Gal. Domingos Franciulli Neto, viabilizando o acesso direto da Av. Governador Carvalho Pinto à Marginal Tietê (sentido da Rodovia Ayrton Senna) |
| 9  | SÉ                         | Av. Pref. Passos x R. São Paulo                                    | Construção de avanço de passeio                                                                                                                                                                                                         |
| 10 |                            | Av. do Estado x Av. Cruzeiro do Sul                                | Alargamento da Av. Cruzeiro do Sul (Sentido Centro) p/ aumento de capacidade do cruzamento.                                                                                                                                             |
| 11 | TREMembé/<br>JAÇANÃ        | Jardim HEBRON                                                      | Construção de Ponte e Alargamento no trecho da Rua Mário Lago e adequações geométricas.                                                                                                                                                 |
| 12 | VILA MARIA/<br>V.GUILHERME | Ponte Vila Guilherme x R. da Coroa x R. Leonor F. C. Zacarias      | Rebaixamento de canteiro e guias para transposição operacinal                                                                                                                                                                           |
| 13 | VILA MARIANA               | Av. Lins de Vasconcelos x Praça Santa Margarida Maria              | Ampliação de ilha e corte de praça. Mudança de circulação.                                                                                                                                                                              |
| 14 |                            | Av. 23 de Maio x Rua Oscar Porto - sentido C/B                     | Alargamento da Av. 23 de Maio no lado direito, próximo à agulha de acesso. SPTTrans conduzindo Processo Ambiental                                                                                                                       |



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CET

# Rod. Raposo Tavares x R. Sapetuba x R. Alvarenga - SP Butantã

ANTES



DEPOIS




## Av. Jacu-Pêssego x Rua Tomoichi Shimizu - SP Itaquera

ANTES



DEPOIS

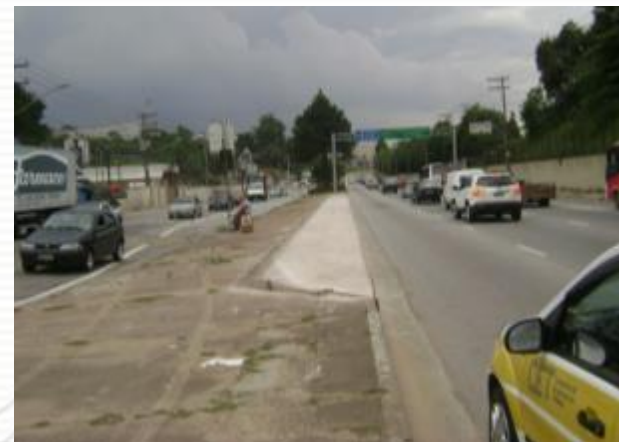




## Av. Jacu - Pêssego / Nova Trabalhadores

ANTES



DEPOIS





## Rua Monte Pascal x Praça do Maçon - SP Lapa

ANTES



DURANTE



## Praça Aníbal Marcondes do Amaral - SP Lapa

ANTES



DURANTE



DEPOIS



## Av. Salim Farah Maluf próximo a Ponte Tatuapé - SP Mooca

ANTES



DEPOIS





## Av. Amador Bueno da Veiga - SP Penha

ANTES



DURANTE



DEPOIS



# Mão Dupla no Vd. General Domingos Franciulli Neto - SP Penha

ANTES



DURANTE





## Jardim Hebron, Rua Mario Lago - SP Tremembé/ Jaçanã

DURANTE



## Av. 23 de Maio x Rua Oscar Porto sentido C/B - SP Vila Mariana

ANTES



DEPOIS



## Av. Lins de Vasconcelos x Praça Santa Margarida Maria

ANTES



DEPOIS





## Av. Prefeito Passos x Rua São Paulo

ANTES



DEPOIS



## Av. do Estado x Av. Cruzeiro do Sul

ANTES



DURANTE



DEPOIS





## Ponte Vila Guilherme x R. da Coroa x R. Leonor F. C. Zacarias

ANTES




DURANTE



DEPOIS





# FUNDURB

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Plano de Aplicação de 2015

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÕES 2015 - FUNDURB

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| RECURSOS APROVADOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREAS EM 2015        | 152.700.000,00 |
| RECURSOS CONGELADOS                                       | 61.700.000,00  |
| RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREAS EM 2015 | 91.000.000,00  |

PDE "Art. 340. Os recursos arrecadados pelo FUNDURB deverão respeitar anualmente o limite de:  
I - ao menos 30% (trinta por cento) destinados para a aquisição de terrenos destinados à produção de Habitação de Interesse Social localizados na **Macroárea de Estruturação Metropolitana, e na Macroárea de Urbanização Consolidada e na Macroárea de Qualificação da Urbanização**, preferencialmente classificados como ZEIS 3, conforme Mapa 4A anexo"

| ÁREA | UH | SUBPREFEITURA | RECURSOS NECESSÁRIOS |       |      | TOTAL | PROGRAMA | OBSERVAÇÃO | FONTE DE RECURSO | MACROÁREAS |
|------|----|---------------|----------------------|-------|------|-------|----------|------------|------------------|------------|
|      |    |               | MARÇO                | ABRIL | MAIO |       |          |            |                  |            |

|             |       |  |               |           |               |               |  |  |  |  |
|-------------|-------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| TOTAL GERAL | 4.275 |  | 69.147.303,55 | 31.862,32 | 21.820.834,13 | 91.000.000,00 |  |  |  |  |
|-------------|-------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|

|                                    |       |                  |               |           |               |               |                                |                    |         |                                          |
|------------------------------------|-------|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------|
| A - COHAB TERRENOS PMCMV FAR       |       |                  |               |           |               |               |                                |                    |         |                                          |
| JOAO GOMES                         | 296   | PIRITUBA/JARAGUA | 3.421.497,90  |           |               | 3.421.497,90  | FAR EDITAL 003/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE ESTUTURACAO METROPOLITANA   |
| ANTONIO SAMPAIO                    | 296   | SANTANA/TUCURUVI | 3.150.000,00  |           |               | 3.150.000,00  | FAR EDITAL 001/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROÁREA DE QUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO |
| PHOBUS                             | 600   | SAO MATEUS       | 13.503.150,00 |           |               | 13.503.150,00 | FAR EDITAL 002/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE ESTUTURACAO METROPOLITANA   |
| FORTE DA RIBEIRA                   | 600   | SAO MATEUS       | 12.543.693,74 |           |               | 12.543.693,74 | FAR EDITAL 002/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE ESTUTURACAO METROPOLITANA   |
| ABRAHAO CALUX                      | 456   | IPIRANGA         | 16.891.341,40 |           |               | 16.891.341,40 | FAR EDITAL 002/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE QUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO |
| MANUEL BUENO                       | 600   | ITAIM PAULISTA   | 11.114.105,61 |           |               | 11.114.105,61 | FAR EDITAL 003/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE ESTUTURACAO METROPOLITANA   |
| FORTE DO RIO NEGRO                 | 600   | SAO MATEUS       |               | 15.733,10 | 11.476.963,35 | 11.492.696,45 | FAR EDITAL 008/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE ESTUTURACAO METROPOLITANA   |
| FORTE DO RIO BRANCO II             | 154   | SAO MATEUS       |               | 6.545,61  | 3.793.454,39  | 3.800.000,00  | FAR EDITAL 008/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE ESTUTURACAO METROPOLITANA   |
| CICERO CANUTO                      | 300   | ARICANDUVA       |               | 9.583,61  | 6.550.416,39  | 6.560.000,00  | FAR EDITAL 008/2014 CHAMAMENTO | EMPRESA CONTRATADA | FUNDURB | MACROAREA DE QUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO |
| TOTAL A - COHAB TERRENOS PMCMV FAR | 3.902 |                  | 60.623.788,65 | 31.862,32 | 21.820.834,13 | 82.476.485,10 |                                |                    |         |                                          |

|                                        |     |                    |              |      |      |              |                                |                         |         |                                          |
|----------------------------------------|-----|--------------------|--------------|------|------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------|
| B - RENOVA SP TERRENOS PMCMV FAR       |     |                    |              |      |      |              |                                |                         |         |                                          |
| CAMPO DAS PITANGUEIRAS                 | 89  | ERMELINO MATARAZZO | 1.429.700,00 |      |      | 1.429.700,00 | FAR EDITAL 007/2014 CHAMAMENTO | DIS VENCE MAIO 2015     | FUNDURB | MACROÁREA DE QUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO |
| ANCHIETA                               | 284 | IPIRANGA           | 7.093.814,90 |      |      | 7.093.814,90 | FAR EDITAL 006/2014 CHAMAMENTO | DIS VENCE NOVEMBRO 2015 | FUNDURB | MACROAREA DE QUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO |
| TOTAL B - RENOVA SP TERRENOS PMCMV FAR | 373 |                    | 8.523.514,90 | 0,00 | 0,00 | 8.523.514,90 |                                |                         |         |                                          |

|             |       |  |               |           |               |               |  |  |  |  |
|-------------|-------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| TOTAL A + B | 4.275 |  | 69.147.303,55 | 31.862,32 | 21.820.834,13 | 91.000.000,00 |  |  |  |  |
|-------------|-------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|

SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE  
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL / CADASTRAMENTO ARBÓREO

(REF: 24/03/2015)

| PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDURB - CASA PAULISTANA 2015 |          |               |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NOME EMPREENDIMENTO                                              | TOTAL UH | SUBPREFEITURA | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             |
| Cury - Cantídio Sampaio                                          | 900      | Pirituba      | R\$ 3.600.000,00  |                   |                   |                   |
| El Global - Badra DERSA                                          | 1.488    | Perus         |                   | R\$ 10.416.000,00 |                   |                   |
| Sugoi - Bento Guelfi                                             | 2.400    | São Mateus    |                   |                   | R\$ 16.800.000,00 |                   |
| Cury - Parque São Rafael I                                       | 2.100    | São Mateus    |                   |                   |                   | R\$ 18.900.000,00 |
|                                                                  | 6.888    |               | R\$ 3.600.000,00  | R\$ 10.416.000,00 | R\$ 16.800.000,00 | R\$ 18.900.000,00 |
|                                                                  |          |               | R\$ 49.716.000,00 |                   |                   |                   |

25.03.2015





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**SIURB / FUNDURB  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS  
RECURSOS FUNDURB 2015**



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM**

# Obra do Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Execução de Obras de Canalização dos Córregos Ponte Baixa e do Jardim Letícia com Implantação de Reservatório de Regularização de Vazão e Viário entre a Av. Guido Caloi e a Rua Daniel Klein, obras de arte de interligação, Parque Linear e Urbanização, remoção de famílias e elaboração de projetos executivos parciais.

- Valor do contrato:
  - R\$ 399.375.476,80 (P0)
  - R\$ 515.653.794,22 (valor atualizado)
- Percentual da Obra já Executado: 65 %
- Valores solicitados FUNDURB 2015: R\$ 15.408.701,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**MOBILIDADE**



# Corredor Binário Santo Amaro - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para as obras de ampliação e melhorias viárias para com tratamento prioritário na sequência de vias que estabelece a conexão com os corredores José Diniz/Ibirapuera/Santa Cruz e Santo Amaro/ Nove de Julho, de um lado, e, de outro, Parelheiros/Rio Bonito/ Santo Amaro, Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Itapeverica/João Dias/Santo Amaro .

- Valor do Contrato: R\$ 39.975.819,93
- Percentual da Obra já Executado: 52 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 9.500.000,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Berrini- Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda com pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, nos dois sentidos.

- Valor do Contrato: R\$ 46.028.062,41
- Percentual da Obra já Executado: 49 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 16.500.000,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor M`Boi Mirim - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor. Ampliação da extensão das plataformas. Substituição de abrigos. Readequação de plataformas.

- Valor do Contrato: R\$ 98.329.748,36
- Percentual da Obra já Executado: 52 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 14.000.000,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08



# Terminal Itaquera - Obra

**Objeto:** Os recursos solicitados são necessários para a continuidade das obras do novo Terminal Itaquera

- Valor do Contrato: R\$ 424.897.145,82
- Percentual da Obra já Executado: 25%
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 10.000.000,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.750.4.4.90.51.00.08



# Cooperação Técnica - SPOBRAS

**Objeto:** Assessoria e gerenciamento ao plano de investimento SIURB / FUNDURB.

- Valor do Contrato: R\$ 25.559.412,49
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 5.000.000,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4900.39.00.08





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM + MOBILIDADE**

# Balanço Geral 2015 – Drenagem + Mobilidade

| <b>Intervenções</b>                | <b>Valor FUNDURB 2015</b> |
|------------------------------------|---------------------------|
| Drenagem                           | 15.408.701,00             |
| Mobilidade                         | 55.000.000,00             |
| <b>TOTAL Drenagem + Mobilidade</b> | <b>70.408.701,00</b>      |



# **PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**Secretaria Municipal de Cultura**  
**Plano de Aplicação - FUNDURB 2015**

| ITEM                      | META | EMERGÊNCI | FONTE/<br>Dotação                                    | EVENTO               |                  | FASE                                                                                                                                  |                  |    |    |     |                    |              | CONCLUSÃO<br>PREVISTA | Recursos 2014<br>R\$     | Recursos 2015<br>( com previsão de aditamento<br>e reajuste)<br>R\$ |                       |
|---------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                           |      |           |                                                      | GERENCIAM            | Nº PROCESSO      | OBJETO                                                                                                                                | EM ANDAMENTO (%) |    |    |     | A<br>CONTRATA<br>R | A<br>LICITAR |                       |                          |                                                                     | PROJETO/<br>ORÇAMENTO |
| EM ANDAMENTO              |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       |                          |                                                                     |                       |
| 1                         |      |           | FUNDURB/<br>Proj.<br>Preserv.-<br>Outros<br>Serviços | SMC/<br>SPOBRAS      | 2010-0.346.224-0 | EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA: OBRA DE RESTAURO E<br>REQUALIFICAÇÃO                                                                        | 25               | 50 | 75 | 100 |                    |              |                       | abr/16                   | 6.201.125,21                                                        | 4.512.000,00          |
| 2                         |      |           | FUNDURB/<br>Proj.<br>Preserv.-<br>Outros<br>Serviços | SMC/DPH              | 2013-0.347.504-5 | EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA: GERENCIAMENTO E<br>FISCALIZAÇÃO PELA SP OBRAS DA OBRA DO EDIFÍCIO<br>SAMPAIO MOREIRA                        |                  |    |    |     |                    |              |                       | mai/16                   | 381.634,66                                                          | 362.000,00            |
| 3                         |      | 27        | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Outros<br>Serviços          | SMC/GTO              | 2014-0.202.136-1 | BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR: OBRA DE<br>REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL                                                    |                  |    |    |     |                    |              |                       | mai/15                   | 126.433,75                                                          | 505.000,00            |
| 4                         |      | 27        | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Outros<br>Serviços          | SMC/GTO              | 2013-0.156.980-8 | BIBLIOTECA CORA CORALINA: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO<br>E CONSERVAÇÃO PREDIAL - agregar temática feminista                                |                  |    |    |     |                    |              |                       | mai/15                   | 169.069,32                                                          | 450.000,00            |
| 5                         |      |           | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Outros<br>Serviços          | SMC/GTO              | 2014-0.129.695-1 | BIBLIOTECA MILTON SANTOS: OBRA DE RECUPERAÇÃO<br>DA COBERTURA, FORRO E MANUTENÇÃO PISO                                                |                  |    |    |     |                    |              |                       | abr/15                   | 129.224,09                                                          | 141.000,00            |
| 6                         |      |           | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Outros<br>Serviços          | SMC/GTO              | 2014-0.228.523-6 | BIBLIOTECA VINICIUS DE MORAES: OBRA DE<br>REFORMULAÇÃO DO LAY OUT ARQUITETÔNICO PARA<br>RECEBER O ACERVO DA Bibl. Vicente de Carvalho |                  |    |    |     |                    |              |                       | mai/15                   | 5.000,00                                                            | 131.000,00            |
| 7                         |      |           | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Outros<br>Serviços          | SMC/GTO              | 2014-0.199.035-1 | CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE: OBRA DE<br>REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE<br>SEGURANÇA E DO ACESSO PRINCIPAL             |                  |    |    |     |                    |              |                       | set/15                   | 40.355,97                                                           | 1.900.000,00          |
| 8                         |      |           | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Obras e<br>Instalações      | SMC/GTO              | 2013-0.220.568-0 | CENTRO CULTURAL SÃO PAULO: PROJETO TÉCNICO<br>CONTRA INCÊNDIO E REVISÃO PROJETO EXECUTIVO DE<br>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA             |                  |    |    |     |                    |              |                       | jun/15                   | 21.611,16                                                           | 33.000,00             |
| TOTAL R\$ " EM ANDAMENTO" |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       | 7.074.454,16             | 8.034.000,00                                                        |                       |
| EMERGÊNCIA                |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       |                          |                                                                     |                       |
| 10                        |      | SIM       | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Outros<br>Serviços          | SMC/<br>SIURB        | 2014-0.202.136-0 | CENTRO CULTURAL SÃO PAULO: RECUPERAÇÃO<br>ESTRUTURAL DE PARTE DAS FACHADAS DA AV. 23 DE<br>MAIO E DA RUA VERGUEIRO                    |                  |    |    |     |                    |              |                       | 9 meses após o<br>início | 0,00                                                                | 400.000,00            |
| 11                        |      | SIM       | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Obras e<br>Instalações      | SMC/<br>CCSP/<br>GTO | 2015-0.013.831-9 | CENTRO CULTURAL SÃO PAULO: PROJETO DE<br>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                        |                  |    |    |     |                    |              |                       | 4 meses após o<br>início | 0,00                                                                | 254.000,00            |
| 13                        |      | SIM       | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Obras e<br>Instalações      | SMC/MC<br>GTO        | 2015-0.009.254-8 | PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS: PROJETO DE<br>NOVA CABINE PRIMÁRIA E DAS INTERLIGAÇÕES                                             |                  |    |    |     |                    |              |                       | 2 meses após o<br>início | 0,00                                                                | 27.000,00             |
| 14                        |      | SIM       | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Obras e<br>Instalações      | SMC/MC<br>GTO        | 2015-0....       | PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS: IMPLANTAÇÃO<br>DA NOVA CABINE PRIMÁRIA E INTERLIGAÇÕES                                             |                  |    |    |     |                    |              |                       |                          | 0,00                                                                | 100.000,00            |
| TOTAL R\$ " EMERGÊNCIA"   |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       | 0,00                     | 781.000,00                                                          |                       |
| COMPROMISSOS              |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       |                          |                                                                     |                       |
| 18                        |      |           | FUNDURB/<br>Proj.<br>Preserv.-<br>Outros<br>Serviços | SMC/ BMA<br>GTO      | 2015-0...        | BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE: ADEQUAÇÕES NO LAY<br>OUT ARQUITETÔNICO E NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS                                        |                  |    |    |     |                    |              |                       | 6 meses após o<br>início | 0,00                                                                | 1.000.000,00          |
| TOTAL R\$ " COMPROMISSO"  |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       | 0,00                     | 1.000.000,00                                                        |                       |
| METAS                     |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       |                          |                                                                     |                       |
| 23                        |      | 27        | FUNDURB/<br>Constr. -<br>Obras e<br>Instalações      | SMC/<br>SIURB        | 2014-0.281.302-0 | CASA DE CULTURA DE ERMELINO MATARAZZO:<br>PROJETOS EXECUTIVOS                                                                         |                  |    |    |     |                    |              |                       | 6 meses após o<br>início | 0,00                                                                | 185.000,00            |
| TOTAL R\$ " METAS"        |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       | 0,00                     | 185.000,00                                                          |                       |
| TOTAL                     |      |           |                                                      |                      |                  |                                                                                                                                       |                  |    |    |     |                    |              |                       | 7.074.454,16             | 10.000.000,00                                                       |                       |

# **SMSP – FUNDURB**

## **PROPOSTA DE INVESTIMENTOS FUNDURB / SMSP - 2015**

### **RECURSO DISPONÍVEL**

- R\$ 40.000.000,00

### **INTERVENÇÕES PREVISTAS**

- Requalificação de Espaços Públicos
- Readequação de Praças
- Acessibilidade em Passeios Públicos
- Melhorias de Bairros
- Revitalização de Áreas Públicas

### **SUBPREFEITURAS ENVOLVIDAS**

- 32 Subprefeituras



# **SMSP – FUNDURB**

---

## **PROPOSTA DE INVESTIMENTOS FUNDURB / SMSP - 2015**

### **Obras Transferidas Para o FMSAI**

- 7 Obras FUNDURB
- 20 Obras IMPACTO

### **Obras Transferidas Para o FUNDURB**

- 15 Obras SMSP/SUB
-

# RESUMO DAS OBRAS

| TOTAL DE RECURSOS SUBPREFEITURAS |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| SUBPREFEITURA                    | TOTAL DE PROC. | VALOR             |
| Aricanduva                       | 2              | R\$ 847.006,98    |
| Butantã                          | 1              | R\$ 500.000,00    |
| Campo Limpo                      | 16             | R\$ 2.657.225,20  |
| Capela do Socorro                | 5              | R\$ 795.260,06    |
| Casa Verde                       | 4              | R\$ 767.367,49    |
| Cidade Ademar                    | 11             | R\$ 943.753,55    |
| Cidade Tiradentes                | 1              | R\$ 149.849,70    |
| Ermelino Matarazzo               |                |                   |
| Freguesia do Ó                   | 2              | R\$ 1.689.316,67  |
| Guaianases                       | 1              | R\$ 36.519,21     |
| Ipiranga                         | 10             | R\$ 1.412.776,87  |
| Itaim Paulista                   | 6              | R\$ 2.104.712,52  |
| Itaquera                         | 2              | R\$ 3.626.937,75  |
| Jabaquara                        | 3              | R\$ 776.162,52    |
| Jaçanã                           |                |                   |
| Lapa                             | 3              | R\$ 1.939.991,24  |
| M'Boi Mirim                      |                |                   |
| Mooca                            | 2              | R\$ 930.000,00    |
| Parelheiros                      | 3              | R\$ 1.599.288,45  |
| Penha                            | 7              | R\$ 1.191.623,23  |
| Perus                            | 13             | R\$ 1.733.372,11  |
| Pinheiros                        | 2              | R\$ 1.324.511,28  |
| Pirituba                         | 4              | R\$ 1.637.351,89  |
| Santana                          | 3              | R\$ 1.096.296,17  |
| Santo Amaro                      | 1              | R\$ 700.000,00    |
| São Mateus                       | 6              | R\$ 2.516.516,17  |
| São Miguel                       | 9              | R\$ 1.476.161,36  |
| Sapopemba                        | 1              | R\$ 157.568,94    |
| Sé                               | 7              | R\$ 4.981.819,28  |
| Vila Maria                       |                |                   |
| Vila Mariana                     | 4              | R\$ 1.431.156,70  |
| Vila Prudente                    | 4              | R\$ 969.855,32    |
| Total Geral                      | 133            | R\$ 39.992.400,66 |

# RELAÇÃO DAS OBRAS

| Subprefeitura     | Objeto                                                                                                                              | Local                                                                                    | Processo                             | Valor      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Aricanduva        | Readequação de passeios                                                                                                             | R. Taubate até a Av. Itaquera - Term. Carrão                                             | 2014-0.327.177-8<br>2014-0.005.923-9 | 447.127,10 |
| Aricanduva        | Revitalização e adaptação em diversas vielas e escadarias                                                                           | Dentro da área sob jurisdição da Subprefeitura Aricanduva/Formosa Carrão                 | 2014-0.173.284-0                     | 399.879,88 |
| Butantã / SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                                         | Ponte Estaiada - Ponte Octavio Frias De Oliveira                                         | 2015-0.023.835-6                     | 500.000,00 |
| Capela do Socorro | Adequação de passeio de próprios municipais                                                                                         | CEI Mitiko M. Nevoeiro                                                                   | 2014-0.191.042-0                     | 132.671,62 |
| Capela do Socorro | Adequação de acessibilidade em passeio                                                                                              | Parque Jacques Cousteau - Rua Catanumi                                                   | 2014-0.187.361-4                     | 249.318,37 |
| Capela do Socorro | Adequação de praça                                                                                                                  | Praça Jorge Veiga                                                                        | 2014-0.191.046-3                     | 89.971,69  |
| Capela do Socorro | Implantação - Praia da Capela                                                                                                       | Av. Atlântica, próximo Nº 2400                                                           | 2014-0.005.671-0                     | 149.859,14 |
| Capela do Socorro | Adequação e revitalização de viela.                                                                                                 | Rua Alba Valdez                                                                          | 2014-0.202.758-0                     | 173.439,24 |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para requalificação de viela de servidão entre as ruas Dr Lauro Parente e Emb Dora de Vasconcelos            | Viela de servidão entre as ruas Dr Lauro Parente e Emb Dora de Vasconcelos               | 2014-0.179.028-0                     | 270.000,00 |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Dr Lauro Parente e Norberto Martins Ribeiro alt 86         | Viela\escadaria entre as ruas Dr Lauro Parente e Norberto Martins Ribeiro alt 86         | 2014-0.203.008-4                     | 59.823,95  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Entre as Ruas Manuel Najera 128 e Giuliana                 | Viela\escadaria entre as ruas Entre as Ruas Manuel Najera 128 e Giuliana                 | 2014-0.198.949-3                     | 79.940,44  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Madalena Allegranti 295 - Vicente Berttoni                 | Viela\escadaria entre as ruas Madalena Allegranti 295 - Vicente Berttoni                 | 2014-0.198.902-7                     | 79.774,55  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Erminia, 29 e Canto da Noite                               | Viela\escadaria entre as ruas Erminia, 29 e Canto da Noite                               | 2014-0.198.953-1                     | 79.703,75  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Dr Lauro Parente e Embaixadora Dora de Vasconcelos alt 453 | Viela\escadaria entre as ruas Dr Lauro Parente e Embaixadora Dora de Vasconcelos alt 453 | 2014-0.203.011-4                     | 59.867,89  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 131 - Camevas                                    | Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 131 - Camevas                                    | 2014-0.198.961-2                     | 59.902,82  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 233 - Camevas                                    | Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 233 - Camevas                                    | 2014-0.198.872-1                     | 59.933,51  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Alexandre Kipnis                                              | Praça localizada na rua Alexandre Kipnis                                                 | 2014-0.198.926-4                     | 34.912,46  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Vicente Berttoni 129 - Emmy Destin                         | Viela\escadaria entre as ruas Vicente Berttoni 129 - Emmy Destin                         | 2014-0.198.909-4                     | 79.928,76  |
| Cidade Ademar     | Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Antonio dias Adorno, 147 – Dias de Almeida                 | Viela\escadaria entre as ruas Antonio dias Adorno, 147 – Dias de Almeida                 | 2014-0.198.938-8                     | 79.965,42  |

# RELAÇÃO DAS OBRAS

|                         |                                                             |                                                                                                            |                  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cidade Tiradentes       | Readequação de área pública                                 | Rua Amílcar Castelan                                                                                       | 2014-0.201.149-7 | 149.849,70   |
| Freguesia / Brasilândia | Readequação e revitalização de praça                        | Praça Vitória Finzetto - Brasilândia - localizada na confluência da Av. Inajar de Souza e Av. Penha Brasil | 2014-0.188.898-0 | 483.060,86   |
| Freguesia / Brasilândia | Reforma e urbanização de área pública                       | Av. Cantídio Sampaio e a Rua Pedro Pomar                                                                   | 2014-0.102.570-2 | 1.206.255,81 |
| Guaianases              | Requalificação de Passarela                                 | Sobre a linha da CPTM - Parte Coberta                                                                      | 2014-0.181.240-2 | 36.519,21    |
| Ipiranga                | Reurbanização / Requalificação de Praça                     | Praça Padre Pedro Ballint - Ipiranga                                                                       | 2014-0.199.657-0 | 200.000,00   |
| Ipiranga                | Reurbanização / Requalificação de Praça                     | Praça Braz Gonçalves - Cursino                                                                             | 2014-0.199.648-1 | 350.000,00   |
| Ipiranga                | Manutenção de passarela de pedestres                        | Complexo Viário Maria Maluf                                                                                | 2014-0.199.662-7 | 147.996,86   |
| Ipiranga                | Reurbanização / Requalificação de Praça                     | Rua Francisco Torres                                                                                       | 2014-0.199.630-9 | 49.999,95    |
| Ipiranga                | Reforma do Canteiro Central                                 | Rua Jaime Poggi - Sacomã                                                                                   | 2014-0.199.622-8 | 49.964,17    |
| Ipiranga                | Reurbanização / Requalificação de Praça                     | Av. Ourives x Rua Mario Quintana                                                                           | 2014-0.199.611-2 | 49.999,95    |
| Ipiranga                | Revitalização da Praça Santa Edwiges (Heliópolis)           | Rua Embu de Heliópolis - Sacomã                                                                            | 2014-0.199.599-0 | 49.999,95    |
| Ipiranga                | Implantação de Equipamento Esportivo                        | Praça Suleiman Kalil Safady - Jardim Climax                                                                | 2014-0.199.640-6 | 129.997,42   |
| Ipiranga                | Readequação de Passeios                                     | Rua Mario Quintana, 15                                                                                     |                  | 84.818,57    |
| Ipiranga/SMSP           | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade | Viaduto Gazeta do Ipiranga                                                                                 | 2015-0.020.744-2 | 300.000,00   |
| Itaim Paulista          | Reforma e construção de passarelas                          | Corrego Água Vermelha / Itaquera - 107,50m - 08 passarelas                                                 | 2014-0.203.059-9 | 393.394,67   |
| Itaim Paulista          | Reforma e construção de passarelas                          | Lajeado - 124,00m - 11 passarelas                                                                          | 2014-0.203.060-2 | 443.700,00   |
| Itaim Paulista          | Reforma e construção de passarelas                          | Itaim / Rola Moça - 156,00m - 13 passarelas                                                                | 2014-0.203.063-7 | 565.153,63   |
| Itaim Paulista          | Reforma e construção de passarelas                          | Tijuco Preto 45,00m - 05 passarelas                                                                        | 2014-0.203.066-1 | 169.846,00   |
| Itaim Paulista          | Reforma e construção de passarelas                          | Três Pontes - 56,00m - 04 passarelas                                                                       | 2014-0.203.067-0 | 211.363,95   |
| Itaim Paulista          | Readequação de Praça                                        | Praça Maria Rosa Dias - av. João Batista santiago x r. Anísio da Silveira Machado                          | 2014-0.119.477-6 | 321.254,27   |

# RELAÇÃO DAS OBRAS

|               |                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                      |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Itaquera      | Requalificação de Praça                                                                           | Praça Mãe Menininha do Gantois (Praça Brasil) com a integração do Centro Comercial Jose Bonifácio (Vila Goró) e a Praça Jequitiba | 2014-0.187.625-7                     | 2.227.746,37 |
| Itaquera/SMSP | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                       | Av. Jacu Pessego 2630 - Unifesp Campo Zona Leste                                                                                  | 2014-0.317.336-9                     | 1.399.191,38 |
| Jabaquara     | Equipamento de Ginastica                                                                          | Implantação em 11 praças                                                                                                          | 2014-0.164.284-1<br>2014-0.320.920-2 | 47.069,50    |
| Jabaquara     | Boulevard 2 - Readequação de passeios e acessibilidade no entorno do Metrô e Rodoviária Jabaquara | Entorno do Metrô e Rodoviária Jabaquara                                                                                           | 2014-0.307.173-6<br>2014-0.307.329-1 | 729.093,02   |
| Lapa          | Projeto de Reforma e Adequação de Praça                                                           | Praça Homero Silva no Distrito de Perdizes                                                                                        | 2014 - 0.185.212 - 9                 | 989.991,24   |
| Lapa/SMSP     | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                       | Av. Domingos de Souza Marques á Av. Alexandre Colares                                                                             | 2015-0.020.752-3                     | 250.000,00   |
| Lapa/SMSP     | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                       | Viaduto Miguel Mofarrej                                                                                                           | 2015-0.020.753-1                     | 700.000,00   |
| Mooca         | Readequação de Passeios                                                                           | Rua da Figueira - R\$ 402.629,35                                                                                                  | 2013-0.176.122-9                     | 80.000,00    |
| Mooca/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                       | Passarela Wanderlei Serpa Desgualdo (Praça Presidente Kenedy)                                                                     | 2015-0.002.749-3                     | 250.000,00   |
| Mooca/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                       | Viaduto Alcanntaro Machado                                                                                                        | 2015-0.022.500-9                     | 600.000,00   |
| Parelheiros   | Readequação de guias e sarjetas                                                                   | Rua Francisco Barbieri - Parelheiros                                                                                              | 2014-0.170.979-2                     | 1.174.171,64 |
| Parelheiros   | Readequação de guias e sarjetas                                                                   | Rua Tomas Antonio S. M.Neto - Parelheiros                                                                                         | 2014-0.170.982-2                     | 317.368,48   |
| Parelheiros   | Readequação de guias e sarjetas                                                                   | Rua Sergio Inácio Ferreira - Parelheiros                                                                                          | 2014-0.170.983-0                     | 107.748,33   |
| Penha         | Adequação de Passeio                                                                              | Rua Itinguçu                                                                                                                      | 2014-0.192.592-4                     | 331.628,19   |
| Penha         | Readequação de Passeios                                                                           | Rua Dr. Campos Moura                                                                                                              | 2014-0.276.542-4                     | 149.998,83   |
| Penha         | Readequação de Passeios                                                                           | Av. Cangaíba                                                                                                                      | 2014-0.276.594-7                     | 149.999,27   |
| Penha         | Readequação de Passeios                                                                           | Rua Joaquim Marra                                                                                                                 | 2014-0.276.563-7                     | 109.998,33   |
| Penha         | Readequação de Passeios                                                                           | Avenida Silvio Torres                                                                                                             | 2014-0.276.577-7                     | 149.999,72   |
| Penha         | Readequação de Passeios                                                                           | Avenida Antonio Estevao de Carvalho c/ a Praça Divinolandia                                                                       | 2014-0.258.773-9                     | 149.999,04   |
| Penha         | Readequação de Passeios                                                                           | Av. Aguia de Haia - rua Boipeva até rua Taperaçu - pista centro/bairro                                                            | 2014-0.276.237-9                     | 149.999,85   |



# RELAÇÃO DAS OBRAS

|                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                  |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Perus              | Serviços e Adequação de Praça                                                                                                                                                                 | Praça Oswaldo de Oliveira - Distrito de Anhanguera                                              | 2014-0.201.786-0 | 57.670,61    |
| Perus              | Recuperação de calçadas                                                                                                                                                                       | Rua Mogeiro - Distrito de Perus                                                                 | 2009-0.178.085-1 | 198.954,94   |
| Perus              | Adequação de Passeios com melhoria para acessibilidade a próprios municipais - AMA Especialidades Perus                                                                                       | Rua Mogeiro, 207 - Distrito de Perus                                                            | 2014-0.220.958-0 | 136.326,46   |
| Perus              | Serviços de conservação e adequação de passeios - UBS Recanto dos Humildes                                                                                                                    | Rua Pavão, 36-A - Distrito de Perus                                                             | 2014-0.220.927-0 | 113.226,45   |
| Perus              | Serviços de adequações de passeios com melhoria para acessibilidade a próprios municipais - AMA UBS Perus                                                                                     | AMA UBS Perus                                                                                   | 2014-0.220.968-8 | 88.020,04    |
| Perus              | Serviços de adequações de passeios com melhoria para acessibilidade a próprios municipais - UBS Rosinha                                                                                       | Rua Dalva de Oliveira, 82 - Distrito de Anhanguera                                              | 2014-0.220.952-1 | 77.227,30    |
| Perus              | Serviços de conservação e adequação de passeios - UBS Morada do Sol                                                                                                                           | Rua Assis Brasil x Rua Luis Vaz de Camões - Distrito de Anhanguera                              | 2014-0.220.936-0 | 46.404,76    |
| Perus              | Serviços de conservação e adequação de passeios - UBS Vila Caiuba                                                                                                                             | Rua Presidente Vargas, 1 - Distrito de Perus                                                    | 2014-0.220.912-2 | 72.557,86    |
| Perus              | Serviços de conservação e adequação de passeios - CEI Soledad Barret Viedma - Distrito de Perus                                                                                               | Rua Tarcom, 315 - Distrito de Perus                                                             | 2014-0.220.920-3 | 83.401,91    |
| Perus              | Reforma e revitalização de escadaria                                                                                                                                                          | Rua Estevan Ribeiro Resende e a Rua José Correa Picaço - Perus                                  | 2010-0.325.355-1 | 433.920,19   |
| Perus              | Revitalização de praça                                                                                                                                                                        | Praça Luis Neri - Situada na Confluência da rua Antonio maia e av. Dr. Silvio de Campos - Perus | 2013-0.214.416-9 | 425.661,59   |
| Pinheiros/SMSP     | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                                                                                                   | Túnel Noite Ilustrada                                                                           | 2015-0.020.747-7 | 350.000,00   |
| Pinheiros          | Readequação de passeios                                                                                                                                                                       | Rua Tabapuã, trecho entre a rua manuel Guedes e rua Bandeira Paulista                           | 2014-0.189.222-8 | 974.511,28   |
| Pirituba / Jaragua | Mobilidade/Acessibilidade - obra de implantação de passeio com requalificação de espaço público local, área municipal localizada entre as Ruas Vasco Balboa e Rua Estevão Gascon              | Distrito do Jaraguá - 200.000,00                                                                | 2014-0.008.907-3 | 200.000,00   |
| Pirituba / Jaragua | Mobilidade/Acessibilidade - obra de implantação de passeio com requalificação de espaço público local, Praça Irmã Stafuzza                                                                    | Distrito de São Domingos -180.000,00                                                            | 2014-0.008.880-8 | 125.725,67   |
| Pirituba / Jaragua | Ciclovía                                                                                                                                                                                      | Implantação de Ciclovía na Av. Edgar Facó - R\$ 1.147.942,46                                    | 2014-0.003.800-2 | 1.191.040,75 |
| Pirituba / Jaragua | Mobilidade/Acessibilidade - obra de implantação de passeio com requalificação de espaço público local, área municipal entre as Ruas Luis Fernandes Calheiros e Rua Antonio Fernandes Pinheiro | Distrito de Pirituba - 200.000,00                                                               | 2014-0.008.924-3 | 120.585,47   |
| Santo Amaro/SMSP   | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                                                                                                   | Ponte Morumbi                                                                                   | 2015-0.020.739-6 | 700.000,00   |

# RELAÇÃO DAS OBRAS

|            |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                  |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| São Mateus | Adeq. Passeios criando área comercial ambulantes                                                                  | Trecho 3 - Av. Mateo Bei, da Rua Aureliano S. Arruda e Cel. Ernesto Duprat -1228663,86                                                       | 2013-0.306.317-0 | 429.138,60   |
| São Mateus | Serviço de readequação de praça e area municipal                                                                  | Rua João Carlos Ferreira, s/nº                                                                                                               | 2014-0.009.280-5 | 929.133,50   |
| São Mateus | Readequação de Area Municipal para Espaço Cultural                                                                | Rua Quaresma Delgado - Pq. São Rafael                                                                                                        | 2014-0.009.281-3 | 1.099.998,62 |
| São Mateus | Urbanização de área pública                                                                                       | Rua Rua Miguel Ferreira de Melo esquina com a rua Miguel Lobo - total R\$ 5.842.541,93                                                       | 2014.0.267.667-7 | 58.245,45    |
| São Miguel | Serviços gerais de readequações, reparações, adaptações e modificações em praça                                   | Praça da Noivas - Distrito São Miguel Paulista                                                                                               | 2014-0.201.004-0 | 377.523,51   |
| São Miguel | Serviços de readequação, reparações, adaptações e modificações em área municipal                                  | Rua Dríades x Rua Maria Santana - Distrito Jacuí                                                                                             | 2014-0.200.996-4 | 328.523,51   |
| São Miguel | Serviços gerais de readequação, reparações, adaptações e modificações e serviços complementares em área municipal | Praça Rainha Avenças - Av. Imperador - Jardim São Carlos - Distrito Vila Jacuí                                                               | 2014-0.200.972-7 | 135.190,02   |
| São Miguel | Serviços gerais de adequação, reparações, adaptações e modificações                                               | Praça sito Ruas Simão Rodrigues Moreira x Professor Flaminio Favero - Jardim Helena                                                          | 2014-0.200.991-3 | 178.630,02   |
| São Miguel | Serviços gerais de readequações, reparações, adaptações e modificações em praça                                   | Praça Antonio Assis Pereira, entre as Ruas Mohamed Ibrahim Saled e Rua Moacir Dantas Itapicuru - Vila Rosária - Distrito São Miguel Paulista | 2014-0.200.998-0 | 223.171,51   |
| São Miguel | Serviços gerais de adequação, reparações, adaptações e modificações em praça                                      | Praça Carmo da Cachoeira- Av. Kumaki Aoki - Jd. Helena .                                                                                     | 2014-0.200.985-9 | 64.038,18    |
| São Miguel | Serviços gerais de adequação, corretiva, reparações, adaptações e modificações                                    | Praça Cigana sito Ruas José Martins Lisboa x Rua Salsa Brava - Jardim Helena                                                                 | 2014-0.200.957-3 | 61.891,67    |
| São Miguel | Serviços gerais de readequação, reparações, adaptações e modificações                                             | Praça Comendador Josué Barbosa Lira, sito Ruas João Felisberto Moreira x Rua Tristão José Ferreira - Distrito Vila Jacuí                     | 2014-0.200.980-8 | 47.941,87    |
| São Miguel | Serviços gerais de readequações, reparações, adaptações e modificações em praça                                   | Praça Alberto Moreira - Vila Nitro Operária - Distrito São Miguel Paulista                                                                   | 2014-0.200.952-2 | 59.251,07    |
| Sapopemba  | Pavimentação em concreto armado                                                                                   | Rua João Pires Monteiro, Trecho Lindeiro ao Hospital de Sapopemba                                                                            | 2014-0.144.776-3 | 157.568,94   |
| Sé         | Reforma e readequação dos passeios públicos da Rua José Paulino - 2ª fase                                         | Rua José Paulino                                                                                                                             | 2009-0.044.001-1 | 574.522,86   |
| Sé         | Reforma e readequação dos passeios da Rua Treze de Maio - Trecho 2                                                | Rua Treze de Maio                                                                                                                            | 2011-0.221.280-2 | 580.557,90   |
| Sé         | Reforma de coreto                                                                                                 | Praça da Republica                                                                                                                           | 2013-0.205.481-0 | 76.474,06    |
| Sé         | Revitalização de praça                                                                                            | Praça Ulysses Guimaraes - Av. do Estado                                                                                                      | 2014-0.205.686-5 | 1.768.882,80 |
| Sé         | Revitalização de praça                                                                                            | Praça Rotary - Rua Dr. Vila Nova x Rua Dr. Cesario Mota                                                                                      | 2014-0.041.094-7 | 981.381,66   |
| Sé/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                       | Passagem Subterrânea Tom Jobin                                                                                                               | 2015-0.020.751-5 | 200.000,00   |
| Sé/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                       | Viaduto Olímpio da Silveira                                                                                                                  | 2015-0.020.746-9 | 200.000,00   |
| Sé/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                       | Viaduto 9 de Julho                                                                                                                           | 2015-0.020.745-0 | 200.000,00   |
| Sé/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                       | Viaduto Major Quedinho                                                                                                                       | 2015-0.020.743-4 | 200.000,00   |
| Sé/SMSP    | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                                       | Vaiduto Pacaembu                                                                                                                             | 2015-0.020.742-6 | 200.000,00   |

# RELAÇÃO DAS OBRAS

|                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Vila Mariana       | Readequação e revitalização de praça                                                        | Praça Werther Maynardi Krause - Av. Santo Amaro x Rua Cotovia                                                                                                                                                                                                                                 | 2014-0.200.463-6 | 412.446,65    |
| Vila Mariana       | Readequação e revitalização de praça                                                        | Praça Rosa Alves da Silva - Rua Machado de Assis x Rua Guimarães Passos                                                                                                                                                                                                                       | 2014-0.200.472-5 | 242.627,04    |
| Vila Mariana       | Revitalização de praça                                                                      | Praça Prof. Rossini Tavares de Lima ( av. IV Centenario x av. Sagres)                                                                                                                                                                                                                         | 2014-0.209.056-7 | 424.303,75    |
| Vila Mariana       | Readequação de passeios                                                                     | Largo Mestre de Aviz ) av. Ibirapuera x rua Sagres)                                                                                                                                                                                                                                           | 2014-0209.061-3  | 351.779,26    |
| Vila Prudente      | Projeto                                                                                     | Bairros da Vila Ema - Vila Mercedes, Vila Graciosa                                                                                                                                                                                                                                            | 2014-0.156.956-7 | 30.449,80     |
| Vila Prudente      | Revitalização de praça                                                                      | Praça Dominginhos de Moraes - Rua São Cirilo - Vila Prudente                                                                                                                                                                                                                                  | 2014-0.159.893-1 | 194.419,97    |
| Vila Prudente      | Projeto                                                                                     | Bairros da Vila Alpina - Sítio Pinheirinho, Vila Alpina                                                                                                                                                                                                                                       | 2014-0.156.961-3 | 34.985,55     |
| Vila Prudente/SMSP | Readequação e requalificação com melhoria de acessibilidade                                 | Viaduto Grande São Paulo                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015-0.020.741-8 | 710.000,00    |
| Santana / Tucuruvi | Reconstrução de escadaria com reforço de galeria de águas pluviais e de iluminação pública. | Tr. Thomaz Gouveia Netto                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014-0.189.815-3 | 199.946,15    |
| Santana / Tucuruvi | Requalificação de escadaria com reforço de iluminação                                       | Rua Tarquinio de Souza até a Avenida Eng. Caetano Alvares                                                                                                                                                                                                                                     | 2014-0.244.259-5 | 164.746,65    |
| Santana / Tucuruvi | Readequação de passeios                                                                     | Av. Cruzeiro do Sul, entre proximidade da rua Cons.Saraiva e av. Gal. Ataliba leonel eas prox. Darua Cerqueira leite e estação do Metrô.                                                                                                                                                      | 2014-0.104.903-2 | 731.603,37    |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Praça - rua Clemente Argolo - Pq.Fernanda                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013-0.082.596-7 | 166.244,27    |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Praça - rua Guilherme Vokurka x rua Eusebio da Costa Dourado                                                                                                                                                                                                                                  | 2013-0.082.443-0 | 167.677,83    |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Praça - rua Flandres, 150 x rua Bora Bora                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013-0.082.687-4 | 169.030,18    |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Praça Dr. Raul Borges da Rocha, Rua Said Kalaf X Sebastião Meira de Barros - Parque Fernanda                                                                                                                                                                                                  | 2013-0.082.622-0 | 168.418,36    |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Praça - rua João Pais Malio s/nº - Pq. Regina                                                                                                                                                                                                                                                 | 2013.0.082.432-4 | 150.455,20    |
| Campo Limpo        | Conservação em vielas                                                                       | Rua Luis Gonzaga Freire - Jd. Helga                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014-0.242.096-6 | 153.184,39    |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Praça - rua Batista Crespo x Estrada do Campo Limpo                                                                                                                                                                                                                                           | 2013-0.082.678-5 | 50.673,10     |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Via - rua Antonio Fortaleza - Pq. Fernanda                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012-0.199.171-0 | 129.717,10    |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Rua Thomaz De Araújo - Via 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014.0.242.104-0 | 109.014,48    |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Rua Manoel Homem de Andrade                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014.0.242.091-5 | 119.992,10    |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Rua Louis Caravaque - Jardim Aurelio                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014.0.242.070-2 | 147.591,40    |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Rua Luisa Todi - Jardim Irapiranga                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014.0.242.087-7 | 140.711,80    |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Tr Marmeleiro do Campo e Tr Casca Preciosa                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014.0.242.080-0 | 61.786,15     |
| Campo Limpo        | Readequação de via                                                                          | Rua Ugo Carnicelli e Rosário Scamardi, Ruas Manuel Alves dos Santos e João de Gois, Rua da Terra Portucalense e Av. Antonio José Bentes, Rua Dos Estoris do Norte e Rua Flores Silvestres , Rua Bras Albanese e Av. Doutors Salvador Rocco, Ruas Professor Gastão Ramos e Masatake Matsumoto. | 2014.0.214.168-4 | 94.297,48     |
| Campo Limpo        | Readequação de praça                                                                        | Rua Manuel José Pereira,300                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011-0.242.147-9 | 171.880,41    |
| Campo Limpo        | Readequação de Praça                                                                        | Rua Antonio José Patricio - Jd. São Bento                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014-0.104.022-1 | 656.550,95    |
| Casa Verde         | Revitalização de praça                                                                      | Praça Geraldo Peixoto de Souza - rua Bruna Galleia                                                                                                                                                                                                                                            | 2014-0.204.702-5 | 30.662,46     |
| Casa Verde         | Revitalização de praça                                                                      | Rua Alfarrobeiras x rua Dario Vilares Barbosa                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014-0.204.691-6 | 79.210,74     |
| Casa Verde         | LARGO DO LIMÃO                                                                              | PRAÇA LARGO DO LIMA COM AV CELESTINO BOURROL                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014-0.231.195-4 | 301.593,53    |
| Casa Verde         | Requalificação de passeio                                                                   | Av. Casa Verde até Av. Marginal do Tietê - Total R\$ 1.067.938,22                                                                                                                                                                                                                             | 2014-0.268.356-8 | 355.900,76    |
|                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 39.992.400,66 |

# SUBPREFEITURA ARICANDUVA

**Projeto/Obra:** Readequação de passeios

**Local:** Rua Taubaté até Avenida Itaquera – Term. Carrão

**Valor:** R\$ 57.012,10



Imagens do local



# SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

**Projeto/Obra:** Melhoria de Bairro

**Local:** Rua Jaime Balmer

**Valor:** R\$ 574.842,94



Imagens do local



# SUBPREFEITURA PERUS

**Projeto/Obra:** Readequação e Revitalização de Escadaria

**Local:** Rua Estevan Ribeiro Resende x Rua José Correa Picanço

**Valor:** R\$ 433.920,36



Imagens do local

# SUBPREFEITURA SÉ

**Projeto/Obra:** Revitalização de Praça

**Local:** Praça Cívica Ulysses Guimarães – Avenida do Estado

**Valor:** R\$ 678.377,83



Imagens do local



# **SMSP – FUNDURB**

## **PROPOSTA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NOVAS - SMSP - 2015**

### **RECURSO DISPONÍVEL**

- R\$ 40.000.000,00

### **SUBPREFEITURAS ENVOLVIDAS**

- 32 Subprefeituras

### **TOTAL DE METROS QUADRADOS A SEREM EXECUTADOS**

- 1.000.000
